


Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Vzhledem k vysokému procentu vyskytující se a vztlínající vlhkosti je nutné prostory sanovat. S navrženými pracemi souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V průběhu stavebně-technického průzkumu před zahájením projektových prací (před 3 lety) se vlhkost v tak zvýšené míře nevyskytovala, proto bylo navrženo řešení infuzní clonou a sanační omítka. V současné době je vysoký výskyt vlhkosti z komunikace za objektem, srážkových vod a z nefunkčních okapů zdrojem trvale mokrého zdiva a vzniku sanitru.

Navržené řešení odstranění vlhkosti mechanickou zábranou doporučuji.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s navrženou změnou. Důvodem je skutečnost, že by nerealizací navržených prací docházelo k znehodnocení provedených prací, hlavně zabudované technologie a vznikly by vyšší náklady (jak na servis technologie, tak na stavební opravy).


Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o změnu řešení.

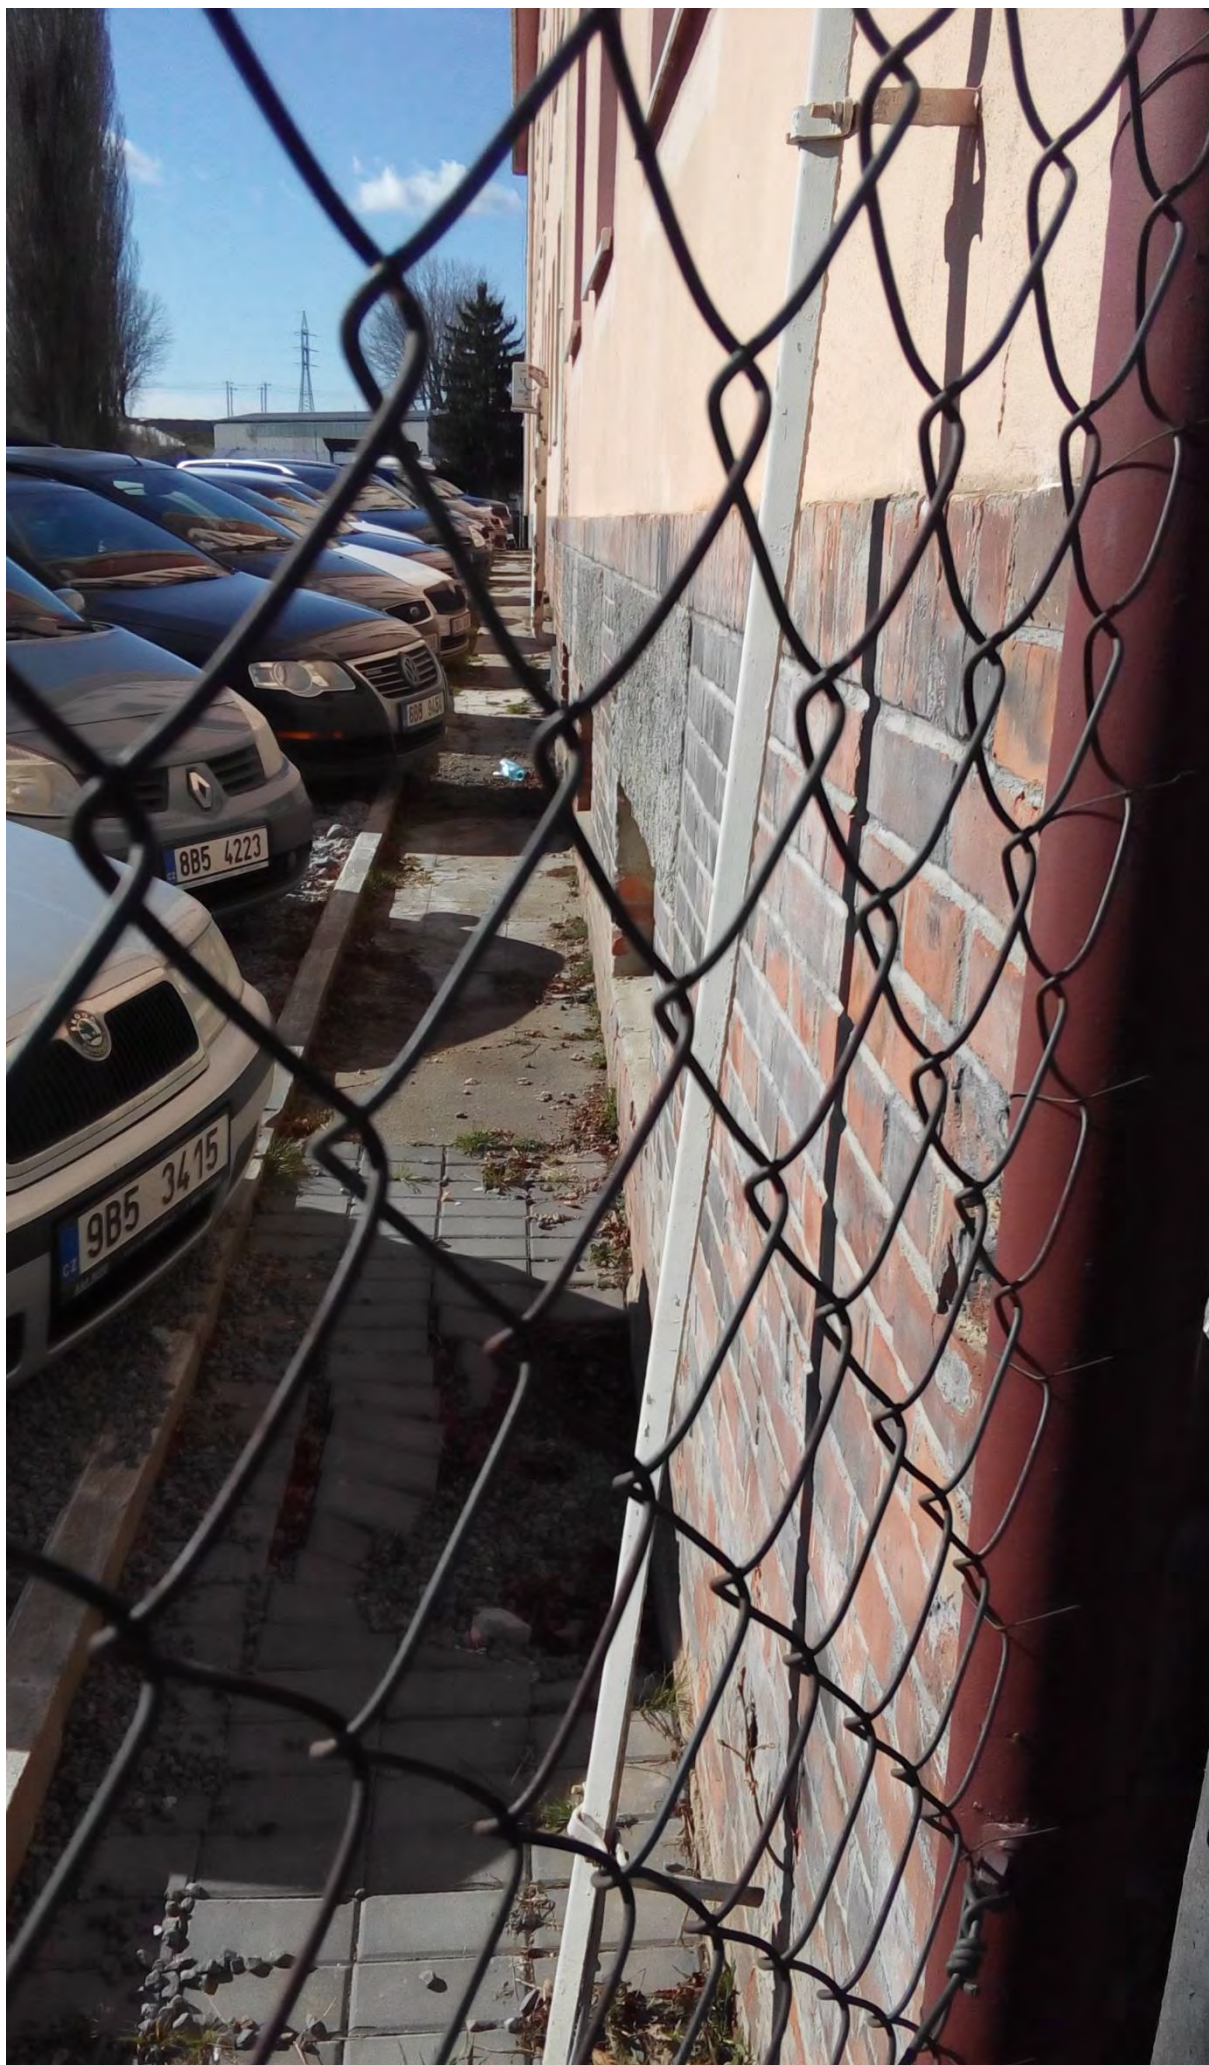




02 č. 1

5001 - izolace - stěr. stěr




ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – stavební část – vodorovné izolace a svislé izolace, drenáž			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 1	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Půdorysy	
		Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Prostory nové kotelny jsou pod úrovní terénu. V těchto prostorách jsou prostupy potrubí, které nejsou zaizolované a v případě dešťových srážek dochází k natékání srážkových vod do prostor suterénu.			
<u>Projektové řešení</u>			
Projektová dokumentace řeší pouze sanaci vnitřních prostor, navrhuje odstranění vlhkosti nové kotelny pomocí vodorovné infuzní clony a sanačních omítek s vodorovnou izolací podlah.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Infuzní clona bude nahrazena mechanickou izolací. Sanační omítky budou provedeny dle PD. Zhotovitel navrhuje odizolování použitím nerez vtláčených plechů po obvodu kotelny, provedení svislé izolace asfaltovými pásy, doplnění nopovou folií a drenážních trubek do šterkového lože. Budou osazeny 3 revizní šachty (na koncích a ve zlomovém bodu). Bude přerušeno nefunkční potrubí vedené v topném kanálu mezi objekty SO 01 a SO 02, topný kanál bude zaslepen.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Pavel Omelka		 BOSS montáže, s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Karel Hróz		 SAFETY PRO, s.r.o.	

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Půdorys PP objektu SO 01
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 66.796,58 Kč


Cena změny 197. 872,45 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 131.075,87 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:




Datum:

3 0. 09. 2015

ZL č. 1

SO 01 - izolace - skutečné provedení



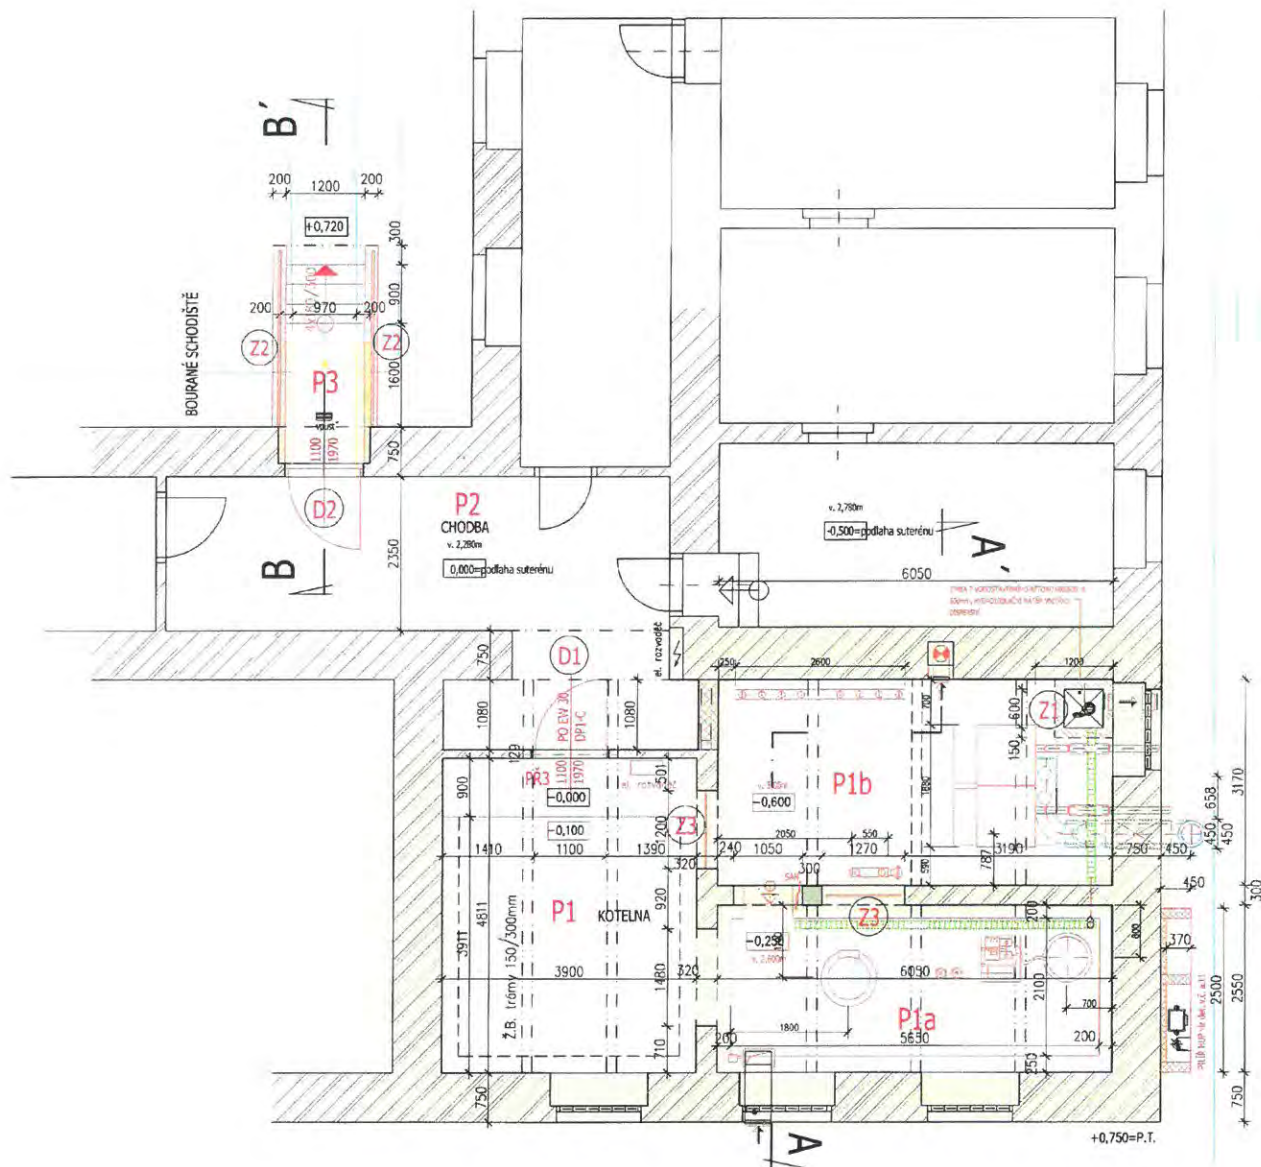

legenda místností-SC 033 -SUTERÉN

Lp.	uväzitosť	podstata	počet strán	počet strán	platnosť
P1	KOTELNA-vstupný priestor	výstavba rúry, podlahy po jej odložení a 300mm, nová izolácia senzorická keramická, nová, vpravená, stĺpová, doska pre sušenie obrube a zágleň bezpískovcov	stĺpová rúra, omietka-vlákna nová izolácia senzorická keramická, nová, vpravená, stĺpová, doska pre sušenie obrube a zágleň bezpískovcov	podlahu omietky-oprava	18,76m2
P1a	KOTELNA- strojovňa	DT10 - stĺpcové podlahy z 250mm	stĺpová rúra, omietka-vlákna nová izolácia senzorická keramická, nová, vpravená, stĺpová, doska pre sušenie obrube a zágleň bezpískovcov	podlahu omietky-oprava	15,43m2
P1b	KOTELNA- umiestnenie vod	zastavený projekt - nová bet.podlaha na kote -0,600	stĺpová rúra, omietka-vlákna nová izolácia senzorická keramická, nová, vpravená, stĺpová, doska pre sušenie obrube a zágleň bezpískovcov	podlahu omietky-oprava	19,13m2
P2	CHODBA	stĺpová bet. maz.	omietka nového zdiva, oprava stĺpových výstupných omietok		
P3	VSTUPNÝ PRIESTOR-SCHODISÔ	bet. stĺpková chodba 5,00mm do výšky 40 cm vpravená	omietka nového zdiva, oprava stĺpových výstupných omietok		2,04m2

legenda materiálu- SO 001 - SUTERÉN


- | | |
|---|---|
|  | NAVŘZENÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ŽIVO |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ I NENOSNÉ ŽIVO |
|  | NAVŘZENÉ KONSTRUKCE, ŽIVO Z CÍHEL, PLYNCH NA MVC |
|  | KONSTRUKCE Z BETONU PROSTĚHO COK/25 |
|  | OBRYS - NOVÝ STAV - ROZSAH UPRÁVŮ/ANÝCH PROSTOR |
|  | NAVŘZENÝ POOLAHNÝ ŽLAB, SPECIFIKACE VIZ PROJEKT ŽIT, OSAZENÍ VIZ DETAIL v.2. 12 |
|  | OSAZENÍ VĚTRÁČKOVÝCH ELEMENTŮ - DODÁVKA VZT-DO STÁVAJÍCÍCH OKEN ZE SKLOBETONU - VYBOURÁNÍ, ZAČISTNĚNÍ |
|  | PROSTUP cca 450x450mm PRO KOMÍN- VÝŠKOVĚ POD Ž.B.VĚNČENÍM NADPRAŽÍM OKEN, POLOHA BUDE UPRÁVNĚNÁ DLE PROJEKTU Ú.T., TECHNOLOGIE KOMBINA TŘÍSOLOVÝCH/O, KOVŮVÝCH JE DODÁVKOU Ú.T. |
|  | NAVŘENÁ SANACE TRIMLNY V ŽEL. BET. PŘEVLAČKY STŘOPU, VYPLNĚNÍ SANACNÍ VYSPRÁVKOU CEM. MALTOU DOPORUČUJEME POSOUZENÍ STAVUTERH A SLEDOVÁNÍ STAVU POURLYH: |
|  | VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMBINA- PO VYTŘPÁNÍ UHLÍK. BUDE POUŽIT PRO DOVĚTRÁNÍ KOTELNÝ VÝŠKA DO 20 m. |

SO 001 Budova mužstva č.1

a.4 - Půdorys 1.PP - nový stav

1 : 50

ZL č. 1

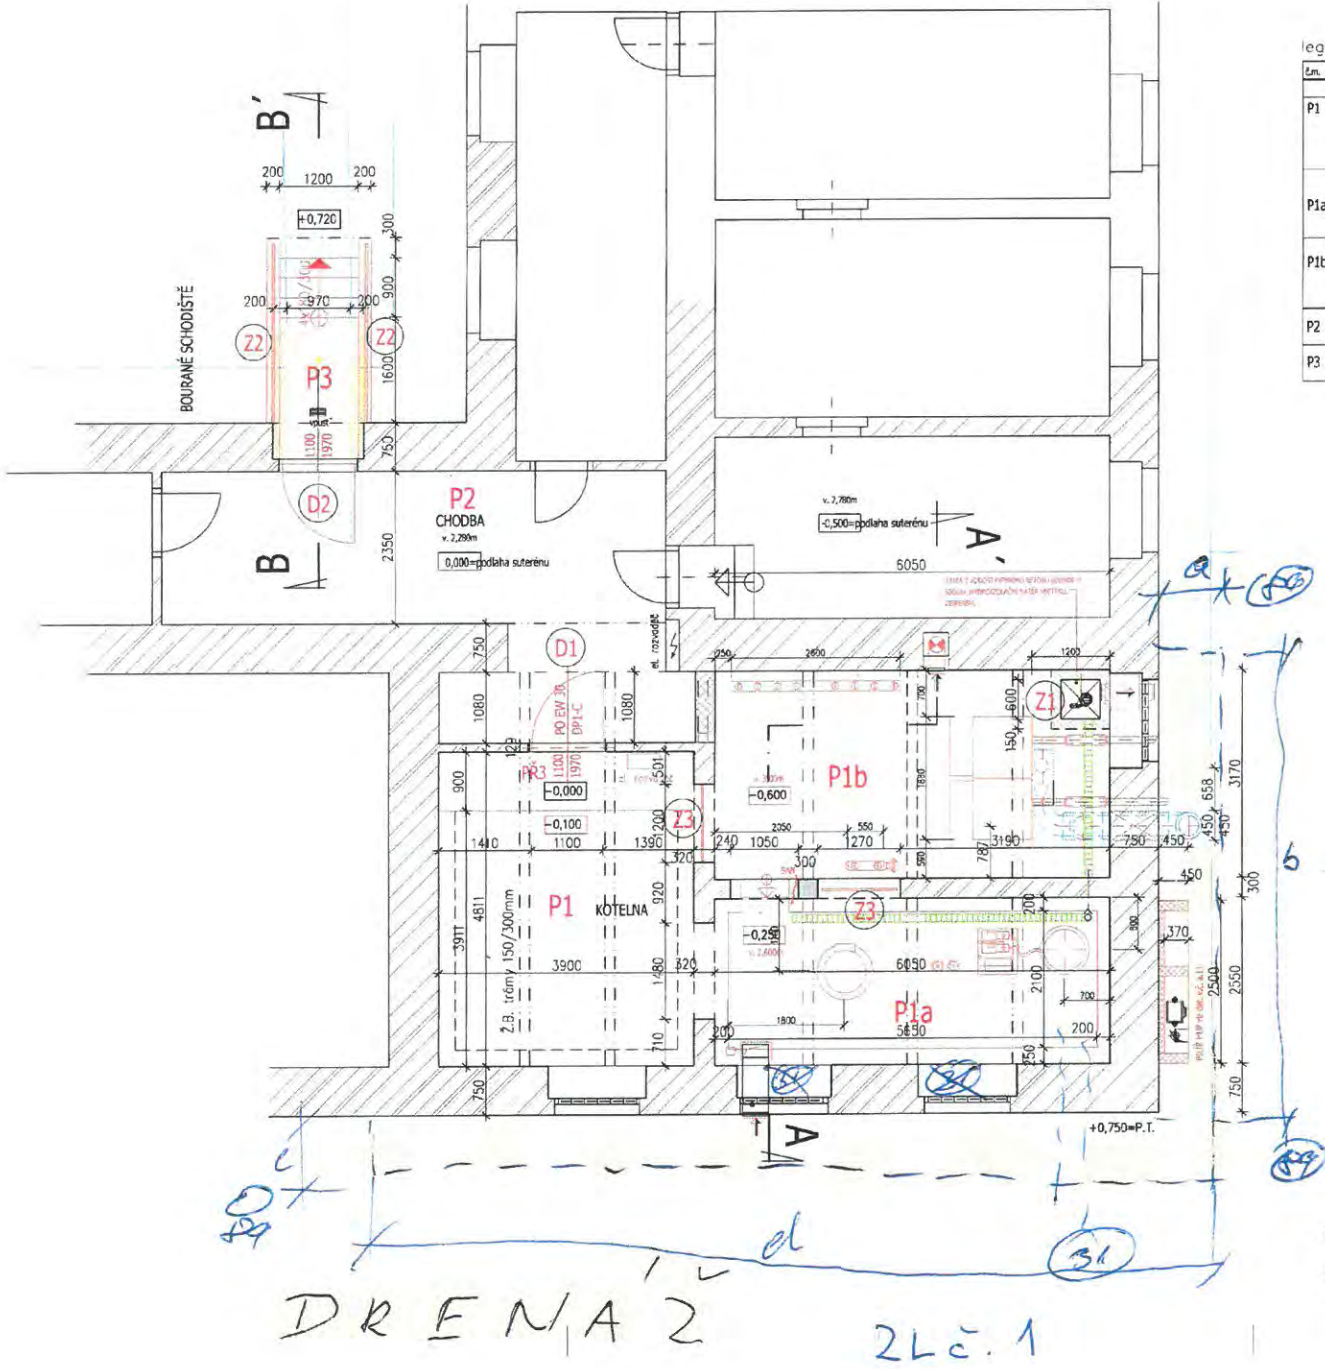

legenda místností-SO 033 -SUTERÉN

číslo	místnost	podlaží	počet stěn	počet stropů	plocha
P1	KOTELNA-vstupní prostor	vstupní stěna, podlahy pro let. odvětrání 100mm, nové bet.podst. s sanací betonu+sanovk. cern. vpravená, odvětr. dle návrhu pro nižší etážu a záplav. bezpečnost	stávající vlt. omítky-vlček - nov. komínový srovnací systém-odstranění vlhkosti, včetně san. omítek	počet stěn omítky-oprava	18,76m ²
P1a	KOTELNA-strojovna	DTTO - střední podlaží o 250mm	stávající vlt. omítky-vlček - nov. komínový srovnací systém-odstranění vlhkosti, včetně san. omítek	počet stěn omítky-oprava	13,43m ²
P1b	KOTELNA-umístění kotlí	zamykací prosklené + nové bet.podst. na kote -0,600	stávající vlt. omítky-vlček - nov. komínový srovnací systém-odstranění vlhkosti, včetně san. omítek	počet stěn omítky-oprava	19,19m ²
P2	CHODBA	stávající bet. mas.	omítky nového stěny, oprava stávajících výpenných omítek		
P3	VSTUPNÍ PROSTOR-SCHODIŠTĚ	bet. zarmkova dlažba 8.80mm do klesání dle před vstupem	omítky nového stěny, oprava stávajících výpenných omítek		2,60m ²

legenda materiálů- SO 001 - SUTERÉN

	NAVŘENÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	NAVŘENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z CIEHL PUNÝCH NA MVC
	KONSTRUKCE Z BETONU PROSTĚHO CIZOŘE
	OBRYS - NOVÝ STAV - ROZSAH UPRÁVĚNÝCH PROSTOR
	NAVŘENÝ PODLAHOVÝ ŽLAB. SPECIFIKACE VIZ PROJEKT ZTL, OSAZENÍ VIZ DETAL. v.č. 12
	OSAZENÍ VĚTRACÍCH ELEMENTŮ - DODÁVKA VZT-OD STÁVAJÍCÍCH OKEN ZE SKLOBETONU - VYSOURÁNÍ, ZATĚSNĚNÍ
	PROSTUP 1000/450mm PRO KUCH. VÝHLEDY POD 2.LVČNÍM-NAKRAJÍCH OKEN. PLOCHA BUDE UPŘESŇOVÁNA DLE PROJEKTU Ú.T., TECHNOLOGIE KUCHYNĚ TŘÍSOLOVNÝHO, KOKOVÝHO JE DODÁVKOU Ú.T.
	NAVŘENÁ SANACE TŘÍVNÝ V ŽEL.BET. PRŮVLAKU STROPU, VYPLNĚNÍ SANACÍ VÝSKRANKOVOU CEM. MALTOU. DOPORUČUJEME POSOUZENÍ STATIKEM A SLEDOVÁNÍ STAVU PORUCHY
	VÝHLEDNÍ STÁVAJÍCÍ-KUCHYNĚ PO VYTŘENÍ UKLÍK. BUDE POLÍŽIT PRO DOVĚTRÁNÍ KOTELNAY VÝŠKA DO 20 m.

SO 001 Budova mužstva č.1
a.4 - Půdorys 1.PP - nový stav 1 : 50

VÝKAZ VÝMĚR

zak297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)								
stavPlynofikace kasáren VÚ Bučovice								
obje001 (méněpráce izolace)								
typPSV								
poř adí	čísl o	popis	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
711 (Izolace proti vodě)								
132	K 319202123	Dodatečná izolace zdiva tl 450 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem		m	10,441	-	825,00 Kč -	8 613,83 Kč
		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm						
		3,2*0,71*2+0,92*0,501*0,3*4+3,2			10,441			
133	K 319202125	Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem		m	23,295	-	2 100,00 Kč -	48 919,50 Kč
		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm						
		3,17*1,195*1,619+2,55*6,05*3,9*4,811			23,295			
		Součet			33,735			
003 (Svislé konstrukce)								
23	K 315321511	Půdní zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže		m3	1,426	-	2 625,00 Kč -	3 743,250 Kč
		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štitové, nadstřešní, popravní bez zvláštních nároků na vliv prostředí (XB, XC) tř. C 20/25						
		(1,6*0,9*0,3)*0,2*1,15*2			1,288			
		0,6*0,1*1,15*2			0,138			
		Součet			1,426			
24	K 315351105	Zřízení oboustranného bednění zdi půdních		m2	14,720	-	262,50 Kč -	3 864,000 Kč
		Bednění nadzákladových zdí půdních, štitových svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení						
		" zidky parapetní, schodiště"						
		1,15*0,6*2*1,15*(2,8*2*0,2)*2			14,720			
		Součet			14,720			
25	K 315351106	Odstranění oboustranného bednění zdi půdních		m2	14,720	-	112,50 Kč -	1 656,000 Kč
		Bednění nadzákladových zdí půdních, štitových svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění						
Celkem méněpráce bez DPH								- 66 796,58 Kč

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 1 - SO 01 Budova mužstva - stavební část, vodorovné izolace a svislé izolace, drenáž
<i>Objekt</i>	SO 01 - Budova mužstva

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	63 132,16 Kč	126 498,35 Kč	- Kč	189 630,51 Kč
<i>specifikace</i>	4 953,14 Kč	3 288,80 Kč	- Kč	8 241,94 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	68 085,30 Kč	129 787,15 Kč	- Kč	197 872,45 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**CENA OBJEKTU**

<i>cena bez DPH</i>		197 872,45 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	41 553,22 Kč
Σ		239 425,67 Kč

zakázka	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)
stavba	ZL č. 1 - SO 01 Budova mužstva - stavební část, vodorovné izolace a svislé izolace, drenáž
objekt	SO 01 - Budova mužstva
typ činností	HSV

rekapitulace

11	Přípravné a přidružené práce	801,50 Kč
12	Odkopávky a prokopávky	232,16 Kč
13	Hloubené vykopávky	7 955,07 Kč
16	Přemístění výkopku	1 902,66 Kč
17	Konstrukce ze zemin	1 948,10 Kč
21	Úprava podloží a základové spáry	710,82 Kč
31	Zdi podpěrné a volné	888,00 Kč
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	5 008,05 Kč
56	Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch	1 392,30 Kč
62	Úprava povrchů vnější	4 631,81 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 534,14 Kč
87	Potrubí z trub z plastických hmot	262,20 Kč
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	17 179,02 Kč
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	5 862,09 Kč
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 305,15 Kč
96	Bourání a demontáž konstrukcí	2 400,75 Kč
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot	831,60 Kč
99	Přesun hmot	3 239,89 Kč
Σ		68 085,30 Kč

Změnový list č.1 - rozpočet /str.4/

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		ZL č. 1 - SO 01 Budova mužstva - stavební část, vodorovné izolace a svislé izolace, drenáž					
objekt		SO 01 - Budova mužstva					
typ činnosti		HSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
11 (Přípravné a přidružené práce)							
1	113 20 2111 /00	Vytrhání obrub z krajiníků/obrubníků stojatých (včetně lože)	m	19,790	40,50 Kč	801,50 Kč	
		1 1,0+3,9+0,32+6,05+0,75+2,55+0,3+3,17+1,0		19,790			
Σ díl 11 (Přípravné a přidružené práce)						801,50 Kč	
12 (Odkopávky a prokopávky)							
2	122 20 1101 /00	Odkopávky nezapažené v hornině 3 objemu do 100 m3	m3	2,310	100,50 Kč	232,16 Kč	
		1 2,31		2,310			
Σ díl 12 (Odkopávky a prokopávky)						232,16 Kč	
13 (Hloubené vykopávky)							
3	132 20 1201 /00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v horninách 3 do 100 m3	m3	31,074	256,00 Kč	7 955,07 Kč	
		1 (0,5+3,17+0,3+0,5)*1,55*1,0+(2,55+0,75+1,0)*1,54*1,0+(1,0+6,05+0,32+0,5)*1,55*1,0+(3,9+1,0)*1,55*1,0-2,301		31,074			
Σ díl 13 (Hloubené vykopávky)						7 955,07 Kč	
16 (Přemístění výkopku)							
4	161 10 1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m	m3	33,380	57,00 Kč	1 902,66 Kč	
Σ díl 16 (Přemístění výkopku)						1 902,66 Kč	
17 (Konstrukce ze zemin)							
5	174 10 1101 /00	Zásyp ztuhlenný -jam, rýh, šachet	m3	27,830	70,00 Kč	1 948,10 Kč	
		1 33,35-5,52		27,830			
Σ díl 17 (Konstrukce ze zemin)						1 948,10 Kč	
21 (Úprava podloží a základové spáry)							
6	214 50 0111 /00	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím DN100 šterkem výšky do 300mm	m	21,540	33,00 Kč	710,82 Kč	
		1 (0,5+3,17+0,3+0,5)+(2,55+0,75+1,0)+(1,0+6,05+0,32+0,5)+(3,9+1,0)		21,540			
Σ díl 21 (Úprava podloží a základové spáry)						710,82 Kč	
31 (Zdi podpěrné a volné)							
7	310 23 6261 /00	Zazdivka otvorů cihlami plocha do 0,09 m2 zdvo tl. do 60cm	ks	3,000	296,00 Kč	888,00 Kč	
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné)						888,00 Kč	
45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)							
8	451 97 1112 /00	Položení vrstvy z geotextilie sponami	m2	53,850	93,00 Kč	5 008,05 Kč	
		1 21,54*2,5		53,850			
Σ díl 45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)						5 008,05 Kč	
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch)							
9	564 23 1111 /00	Podklad ze šterkopisku ŠP zhut. tl. 10cm	m2	27,300	51,00 Kč	1 392,30 Kč	
		1 21*1,3		27,300			
Σ díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch)						1 392,30 Kč	
62 (Úprava povrchů vnější)							
10	622 45 4511 /00	Oprava omítky cementové venkovní hladké do 50% opr. plochy	m2	23,101	154,50 Kč	3 569,15 Kč	
11	622 45 9141 /00	Postřík fasády maltou cementovou -lžící	m2	23,101	46,00 Kč	1 062,66 Kč	
		1 (0,5+3,17+0,3+0,5)*1,35+(2,55+0,75+1,0)*1,04+(1,0+6,05+0,32+0,5)*1,04+(3,9+1,0)*0,9		23,101			
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)						4 631,81 Kč	
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							
12	631 31 2141 /00	Doplnění mazaniny betonem prostým do rýhy	m3	0,454	2 643,00 Kč	1 199,92 Kč	
		1 (4+4+3,35)*0,4*0,1		0,454			
13	631 31 1125 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20/25 tl. do 12cm	m3	3,549	2 625,00 Kč	9 316,13 Kč	
		1 27,3*0,13		3,549			
14	631 57 2111 /00	Doplnění násypů šterkopiskem plocha přes 2m2	m3	1,362	747,50 Kč	1 018,10 Kč	
		1 (4+4+3,35)*0,4*0,3		1,362			
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						11 534,14 Kč	
87 (Potrubí z trub z plastických hmot)							
15	871 31 8111 /00	Kladení drenážního potrubí z pl.hm. do 100mm	m	23,000	11,40 Kč	262,20 Kč	
		1 23		23,000			
Σ díl 87 (Potrubí z trub z plastických hmot)						262,20 Kč	
89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)							
16	895 29 1111 /00	Drenážní šachtice kontrolní, nadzemní kombinované z PE	ks	3,000	4 559,50 Kč	13 678,50 Kč	
17	899 66 1311 /00	Zřízení filtračního obalu drenážního z trubek do DN 130mm	m	23,000	7,80 Kč	179,40 Kč	
18	spec	drenážní potrubí Js 100mm	m	24,000	56,50 Kč	1 356,00 Kč	
19	spec	šterk 16-32	m3	5,520	356,00 Kč	1 965,12 Kč	
		1 23*0,8*0,3		5,520			
Σ díl 89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)						17 179,02 Kč	
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)							
20	917 86 2111_/00	Osazení chodníkového obrubníku z betonu stojatý s opěrou do lože z betonu prostého	m	19,800	148,00 Kč	2 930,40 Kč	
21	918 10 1111 /00	Lože pod obrubník/krajiník/obrubu z dlažebních kostek betonových	m3	0,594	2 188,00 Kč	1 299,67 Kč	
		1 19,8*0,15*0,2		0,594			
22	592 17 0089	Obrubník chodníkový ABO 15-10 100x8x20	ks	20,790	78,50 Kč	1 632,02 Kč	
		1 19,8*1,05		20,790			

Σ díl 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)					5 862,09 Kč
93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb)					
23 938 53 3111 /00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	23,100	56,50 Kč	1 305,15 Kč
Σ díl 93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb)					1 305,15 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)					
24 965 04 2131 /00	Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10cm plochy do 4m2	m3	2,134	1 125,00 Kč	2 400,75 Kč
	1 (0,5+3,17+0,3+0,5)*1,0*0,1+(2,55+0,75+1,0)*1,0*0,1+(0,8+6,05+0,32+0,5)*1,0*0,1+(3,9+1,0)*1,0*0,1		2,134		
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)					2 400,75 Kč
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)					
25 978 02 3411 /00	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínové	m2	23,100	36,00 Kč	831,60 Kč
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)					831,60 Kč
99 (Přesun hmot)					
26 998 22 3011 /Z0	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt dlažděný	t	10,156	127,50 Kč	1 294,84 Kč
27 999 28 1211 /00	Přesun hmot pro opravy a údržbu fasád objektů výšky do 25m vnější plášť	t	5,630	345,50 Kč	1 945,06 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)					3 239,89 Kč
Σ					68 085,30 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 1 - SO 01 Budova mužstva - stavební část, vodorovné izolace a svislé izolace, drenáž				
objekt		SO 01 - Budova mužstva				
typ činnosti		PSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)						
1		D+ M geotextilie 300g/m2	m2	32,650	65,00 Kč	2 122,25 Kč
2		Izolace proti vlhkosti vodorovná vtlačení nerezových plechů tl .stěny do 450 mm	m	6,020	1 050,00 Kč	6 321,00 Kč
	1	0,71+0,92+0,51+0,15+0,24+0,3+3,19		6,020		
3		Izolace proti vlhkosti vodorovná vtlačení nerezových plechů tl .stěny do 900 mm	m	28,051	3 421,00 Kč	95 962,47 Kč
	1	4,811+3,9+0,9+0,32+6,05+0,75+2,55+0,3+3,17+2,8+2,5		28,051		
4	711 11 2001 /00	Izolace proti zemní vlhkosti za studena svislá -nátěr penetrační	m2	29,685	12,30 Kč	365,13 Kč
	1	(0,5+3,17+0,3+0,5)*1,65+(2,55+0,75+1,0)*1,35+(1,0+6,05+0,32+0,5)*1,35+(3,9+1,0)*1,2		29,685		
5	711 14 2559 /00	Izolace proti zemní vlhkosti přitavená svislá -pásy NAIP	m2	29,685	60,00 Kč	1 781,10 Kč
6	711 19 3131 /00	Izolace proti vlhkosti zdíva svislá -těsnící kaši Aquafin 2K	m2	26,000	354,00 Kč	9 204,00 Kč
7	711 74 7588 /00	Izolace detailu trubního prostupu na plášťovou troubu -NAIP průměru do 200mm	ks	2,000	564,50 Kč	1 129,00 Kč
8	711 74 7688 /00	Izolace detailu trubního prostupu na plášťovou troubu -NAIP průměru do 500mm	ks	3,000	959,00 Kč	2 877,00 Kč
9	711 83 2513 /00	Izolace svislá Fondaline Plus 2 m	m2	32,654	115,50 Kč	3 771,48 Kč
	1	29,685*1,1		32,654		
10	111 63 0001	Asfaltový lak penetrační ALP-Penetrat	t	0,059	14 970,00 Kč	888,77 Kč
	1	29,685*0,002		0,059		
11	628 32 0005	Pás asfaltovaný těžký BITAGIT V 60 S 40	m2	32,654	73,50 Kč	2 400,03 Kč
	1	29,685*1,1		32,654		
12	998 71 1102 /00	Přesun hmot izolací proti vodě objektu výšky do 12m	t	0,134	569,50 Kč	76,46 Kč
13	998 71 1102 /00	Přesun hmot izolací proti vodě objektu výšky do 12m	t	0,186	569,50 Kč	105,96 Kč
Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)						127 004,66 Kč
767 (Kovové doplňkové konstrukce)						
14	338 17 1122 /00	Osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,6m se zabetonováním	ks	2,000	169,50 Kč	339,00 Kč
15	767 91 1130 /00	Montáž oplocení ze strojového pletiva výšky do 200cm	m	4,500	64,50 Kč	290,25 Kč
16	767 91 4830 /00	Demontáž oplocení na ocelových sloupcích výšky do 200cm	m	4,500	62,50 Kč	281,25 Kč
17	767 99 6801 /00	Demontáž atypické kce celkové hmotnosti do 50kg	kg	78,000	24,00 Kč	1 872,00 Kč
Σ díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)						2 782,50 Kč
Σ						129 787,16 Kč

rekapitulace

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 1 - SO 01 Budova mužstva - stavební část, vodorovné izolace a svislé izolace, drenáž				
objekt		SO 01 - Budova mužstva				
typ činnosti		PSV				
711		Izolace proti vodě a vlhkosti		127 004,66 Kč		
767		Kovové doplňkové konstrukce		2 782,50 Kč		
Σ				129 787,16 Kč		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 2	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – vstupní schodiště			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu 	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Ve výkresu je zakreslena odtoková vpust' na odvod srážkových vod, ve skutečnosti se žádná vpust' ani jiné odvodnění nevyskytuje. Venkovní plochu schodiště před vstupem do suterénu budovy nelze odvodnit, hrozí zatékání srážkových vod do objektu. <u>Projektové řešení</u> V PD je ve výkresu a.2.1 obj. SO 01 (půdorys stávající stav) vpust' zakreslena. Dále je v technické zprávě projektu uvedeno: provede se vybourání stávajících konstrukcí vyrovnávacího schodiště (stupně, opěrné zídky, betonová plocha) <u>vpust' se zachová a vyčistí</u>. Provede se nové schodiště s napojením na stávající chodník. Stupně s protiskluzovou úpravou, dlažba před vstupem ze zámkové dlažby, betonové zídky, které budou opatřeny zábradlím. PD neřeší zajištění venkovního schodiště (posuny vlivem tlaku okolní zeminy v kombinaci s vyskytující se vlhkostí) <u>Navrhované řešení</u> Protože neexistuje odtoková vpust' zajišťující odvádění srážkových vod ze schodišťového prostoru před vstupem do objektu, navrhuje zhotovitel osadit ocelový přístřešek 1000 x 1200 mm, kotvený do obvodového zdiva nad vstupem. Dále je venkovní schodiště je nutno zabezpečit proti poškození vlivem mrazu betonáží základů do nezámrzné hloubky (neřešila PD). U betonových zídek by vlivem vlhnutí docházelo ke krystalizaci solí a degradaci stěn zídek, proto budou opatřeny z vnější strany nopovou folií.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Navržené řešení by bylo funkční pouze krátkodobě a s přibývajícím časem by docházelo k degradaci schodiště (což potvrzuje jeho současný stav – popraskané, vydrolené,			

postupně se rozpadající stupně). Díky výše popsanému problému zhotovitel považuje navržené technické řešení za optimální a dostatečné pro zajištění funkčnosti stavebního díla.



BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Z důvodu bezpečného vstupu a zamezení hnaného deště a tím další vlhkosti je nutné tyto práce provést. S daným rozsahem souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

PD vycházela z předané dokumentace stávajících sítí, kde kanalizace zakreslena byla. Úprava schodiště byla navržena ve shodné konstrukci se stávajícím schodištěm. Vzhledem k absenci odtokové vpusti je nutné schodiště zabezpečit proti srážkové vodě. Realizace schodiště navržena zhotovitelem je řešením zaručujícím stabilitu schodiště proti možnému posunu vlivem zeminy. S danými úpravami souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí a doporučuje navržené řešení.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Stávající stav SO 001 – venkovní schodiště





Oznámení změny č. 2 - fotodokumentace


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 2	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – vstupní schodiště			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 2	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Výkresy	
		Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Ve výkresu je zakreslena odtoková vpust' na odvod srážkových vod, ve skutečnosti se žádná vpust' ani jiné odvodnění nevyskytuje. Venkovní plochu schodiště před vstupem do suterénu budovy nelze odvodnit, hrozí zatékání srážkových vod do objektu.			
<u>Projektové řešení</u>			
V PD je ve výkresu a.2.1 obj. SO 01 (půdorys stávající stav) vpust' zakreslena. Dále je v technické zprávě projektu uvedeno: provede se vybourání stávajících konstrukcí vyrovnávacího schodiště (stupně, opěrné zídky, betonová plocha) <u>Vpust' se zachová a vyčistí.</u> Provede se nové schodiště s napojením na stávající chodník. Stupně s protiskluzovou úpravou, dlažba před vstupem ze zámkové dlažby, betonové zídky, které budou opatřeny zábradlím. PD neřeší zajištění venkovního schodiště (posuny vlivem tlaku okolní zeminy v kombinaci s vyskytující se vlhkostí)			
<u>Navrhované řešení</u>			
Protože neexistuje odtoková vpust' zajišťující odvádění srážkových vod ze schodišťového prostoru před vstupem do objektu, navrhuje zhotovitel osadit ocelový přístřešek 1000 x 1200 mm, kotvený do obvodového zdiva nad vstupem. U betonových zídek by vlivem vlhnutí docházelo ke krystalizaci solí a degradaci stěn zídek, proto budou opatřeny z vnější strany nopovou folií.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.**Autorský dozor projektanta stavby**

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**

- Řez venkovním schodištěm
- Půdorys s vyznačením umístění nopové folie
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená).....

Cena změny

13.806,82 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	13.806,82 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  24. 11. 2015
Datum:	Datum:

Foto realizace SO 001 - venkovní schodiště





Skutečný stav SO 001 - venkovní schodiště



Změnový list č.2 - fotodokumentace

ZLČ 2 - venkovní schodiště

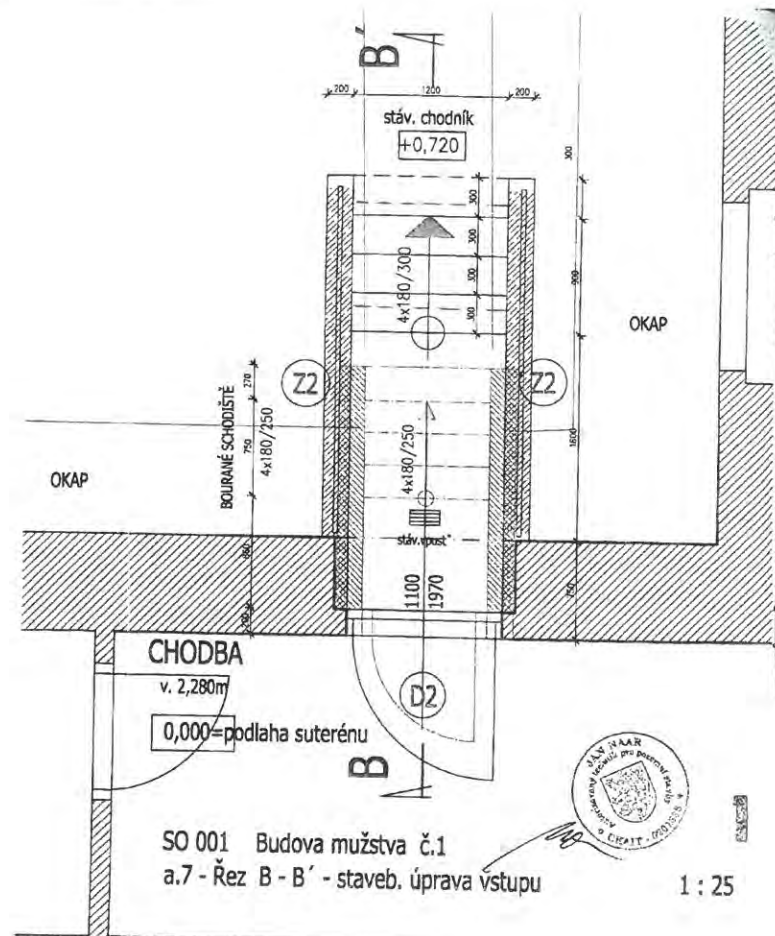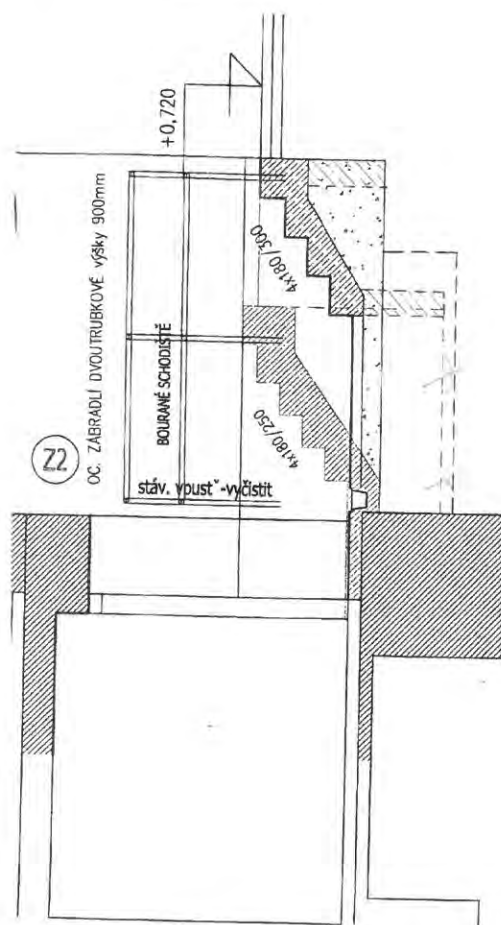

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 2 - SO 01 Budova mužstva 1 - vstupní schodiště
<i>Objekt</i>	SO 01 Budova mužstva 1

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	2 381,79 Kč	10 963,00 Kč	- Kč	13 344,80 Kč
<i>specifikace</i>	299,98 Kč	- Kč	- Kč	299,98 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	2 681,77 Kč	10 963,00 Kč	- Kč	13 644,78 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		13 644,78 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	2 865,40 Kč
Σ		16 510,18 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)			
stavba		ZL č. 2 - SO 01 Budova mužstva 1 - vstupní schodiště			
objekt		SO 01 Budova mužstva 1			
typ činnosti		HSV			
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka celkem
1 (Zemní práce)					
1	979 09 7115 /00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	t	1,766	112,50 Kč 198,68 Kč
		1 1,104*1,6		1,766	
Σ díl 1 (Zemní práce)					198,68 Kč
13 (Hloubené vykopávky)					
2	131 20 3101 /00	Hloubení jam v soudržných horninách 3 ručně	m3	0,960	487,50 Kč 468,00 Kč
		1 1,2*1,6*0,5		0,960	
3	132 20 1101 /00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v horninách 3 do 100 m3	m3	0,144	375,00 Kč 54,00 Kč
		1 1,2*0,3*0,2*2		0,144	
Σ díl 13 (Hloubené vykopávky)					522,00 Kč
16 (Přemístění výkopku)					
4	161 10 1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m	m3	1,104	52,50 Kč 57,96 Kč
		1 0,144+0,96		1,104	
5	162 70 1105 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m	m3	1,104	195,00 Kč 215,28 Kč
6	162 70 1109 /00	Příplatek za každých dalších 1000 m z horniny 1 až 4 vodorovné přemístění	m3	16,900	15,00 Kč 253,50 Kč
Σ díl 16 (Přemístění výkopku)					526,74 Kč
17 (Konstrukce ze zemin)					
7	583 44 0002	Kamenivo drcené hrubé 63-125 B	t	1,210	248,00 Kč 299,98 Kč
		1 1,92*0,35*1,8		1,210	
Σ díl 17 (Konstrukce ze zemin)					299,98 Kč
27 (Základy)					
8	271 57 1112 /00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,216	654,50 Kč 141,37 Kč
		1 1,2*0,3**2*0,1+1,2*1,2*0,1		0,216	
9	274 31 3611 /00	Beton základových pasů prostý C16/20(B20)	m3	0,144	1 875,00 Kč 270,00 Kč
Σ díl 27 (Základy)					411,37 Kč
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch)					
10	564 76 1111 /00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm zhut. tl. 20cm	m2	1,920	149,00 Kč 286,08 Kč
		1 1,2*1,6		1,920	
11	564 85 1111 /00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhut. tl. 15cm	m2	1,920	108,00 Kč 207,36 Kč
Σ díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch)					493,44 Kč
99 (Přesun hmot)					
12	998 01 1002 /Z0	Přesun hmot budov s nosnou kci zděnou/kovovou výšky 12 m	t	0,325	204,00 Kč 66,28 Kč
13	998 22 3011 /Z0	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt dlažďený	t	1,281	127,50 Kč 163,28 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)					229,56 Kč
Σ					2 681,77 Kč

rekapitulace


1	Zemní práce	198,68 Kč
13	Hloubené vykopávky	522,00 Kč
16	Přemístění výkopku	526,74 Kč
17	Konstrukce ze zemin	299,98 Kč
27	Základy	411,37 Kč
56	Podkladní vrstvy pozemních komunikací a ploch	493,44 Kč
99	Přesun hmot	229,56 Kč
Σ		2 681,77 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		Plynofikace kasáren VÚ Bučovice				
objekt		SO 001 (Budova mužstva 1)				
dodatek		1 (vicepráce)				
typ činnosti		PSV				

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)							
1	711 16 1314 /00	Izolace proti zemní vlhkosti folii základů nebo stěn FONDALINE S500 šířky 2,0 m	m2	13,170	108,50 Kč	1 428,95 Kč	
2	998 71 1101 /00	Přesun hmot izolací proti vodě objektu výšky do 6m	t	0,011	542,00 Kč	6,06 Kč	
Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)							1 435,00 Kč
767 (Kovové doplňkové konstrukce)							
3	D+ M	Ocelové stříšky z uhlíku a plechovou krytinou 1000x1200mm	kompl.	1,000	9 528,00 Kč	9 528,00 Kč	
Σ díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)							9 528,00 Kč
Σ							10 963,00 Kč

rekapitulace			
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	1 435,00 Kč	
767	Kovové doplňkové konstrukce	9 528,00 Kč	
Σ		10 963,00 Kč	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 3	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – okna kotelna			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis	
		Fotodokumentace stávajícího stavu	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající okenní otvor ve štítové stěně vyplňují plechová dvířka – viz. foto. Na obvodové stěně do ulice jsou osazeny stávající kovové rámy (vel. 1300 x 600 mm) oken s ocelovými křídly vyplněnými z části rozbitým drátosklem. Okna nedovírají, někde jsou zrezivělé nebo chybí panty a celkově neplní svoji funkci.			
<u>Projektové řešení</u> V projektové dokumentaci jsou všechny okenní prostory zakresleny jako sklobetonové příčky (okna). Není proto řešena jejich funkčnost.			
<u>Navrhované řešení</u> Otvor na štítové stěně bude zhruba z jedné poloviny doplněn sklobetonovými tvárnici, zbylá část bude z části zazděna, z části bude otvor vyplněn potrubím VZT (havarijní větrání kotelny). Okenní otvory budou osazeny novými plastovými okny 1300 x 600 mm s mezisloupkem a pákovým ovládáním; do jedné části bude vložena ventilace kotelny (ventilátor + protipožární žaluzie).			
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: zhotovitel V zimním období by docházelo k promrzání prostoru kotelny nevyplněným okenním otvorem, při silných mrazech by neizolované části technologie obsahující vodu mohly mrazy poškodit. Oprava starých kovových oken by byla vzhledem k jejich stavu neekonomická a neodpovídající současným normám, navrhované řešení splňuje současné normové i technické požadavky.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Pro zajištění alespoň minimálního denního osvětlení a částečného odvětrání prostor je nutné tyto práce provést. S jejich rozsahem souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Sklobetonové tvárnice zakreslené v PD vycházely z podkladů stávajícího stavu předaného uživatelem. Zkvalitňování obvodových stavebních konstrukcí včetně výplní nebylo předmětem zadání PD (není v majetku AS-PO). Vzhledem k dezolátnímu stavu okenních výplní doporučuji práce provést.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí a doporučuje navržené řešení. Jedná se o vadu v projektové dokumentaci, kdy neexistuje sklobetonová příčka a je nutné zabránit promrzání objektu.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.


Poznámky:

SO 01

stav stav okna kotelna

02 č. 3





ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – úprava okna			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 3	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
		Výkres	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající okenní otvor ve štítové stěně vyplňují plechová dvířka – viz. foto. Na obvodové stěně do ulice jsou osazeny stávající kovové rámy (vel. 1300 x 600 mm) oken s ocelovými křídly vyplněnými z části rozbitým drátosklem. Okna nedovírají, někde jsou zrezivělé nebo chybí panty a celkově neplní svoji funkci. <u>Projektové řešení</u> V projektové dokumentaci jsou všechny okenní potvory zakresleny jako sklobetonové příčky (okna). Není proto řešena jejich funkčnost. <u>Navrhované řešení</u> Otvor na štítové stěně bude zhruba z jedné poloviny doplněn sklobetonovými tvárnici, zbylá část bude z části zazděna, z části bude otvor vyplněn potrubím VZT (havarijní větrání kotelny). Okenní otvory budou osazeny novými plastovými okny 1300 x 600 mm s mezisloupkem a pákovým ovládáním; do jedné části bude vložena ventilace kotelny (ventilátor + protipožární žaluzie).			
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.**Autorský dozor projektanta stavby**

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**

- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace


REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... --

Cena změny 20.167,97 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení 20.167,97 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	20.167,97
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum: 30.9.2015	Datum: 30.09.2015

SO 01


ZL č. 3 - skutečné provedení
okna kotelna

Změnový list č.3 - fotodokumentace

ÚPRAVA OKNA NA ŠTÍTĚ BUDOVY



VÝTĚNA OKEN

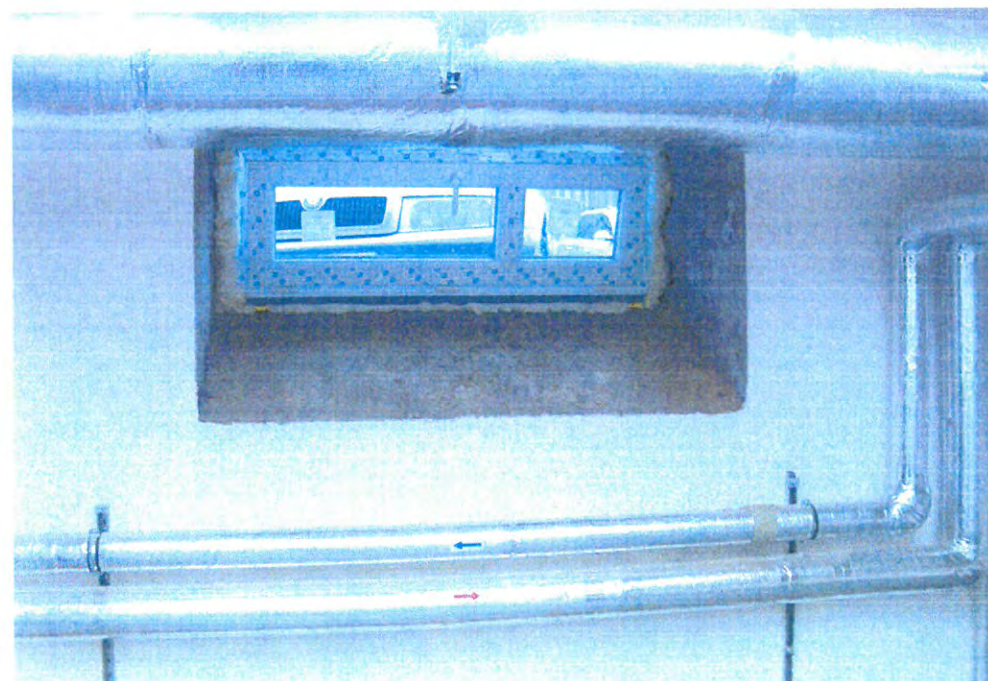

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	SO 001 (Budova mužstva 1) výměna oken

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o. Družstevní 184, 685 01 Bučovice	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
--	---

ODBĚRATEL**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	5 016,46 Kč	6 901,51 Kč	- Kč	11 917,97 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	8 250,00 Kč	- Kč	8 250,00 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	5 016,46 Kč	15 151,51 Kč	- Kč	20 167,97 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		20 167,97 Kč
<i>DPH</i>	<i>21% ze základu</i>	4 235,27 Kč
Σ		24 403,24 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka

stavba

objekt

dodatek

typ činností

297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)

Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

SO 001 (Budova mužstva 1)

3 (výměna oken)

HSV


pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
31 (Zdi podpěrné a volné)						
1	310 23 8211 /00	Zazdivka otvorů cihlami pálenými plocha do 1m2 zdivo malta MVC 1 1,5*0,45*0,3+1,5*0,3*0,45	m3	0,405 0,405	3 745,00 Kč	1 516,73 Kč
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné)						1 516,73 Kč
61 (Úprava povrchů vnitřní)						
2	612 40 9991 /00	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah apod. po opravách 1 (1,3+0,6)*2*2	m	7,600 7,600	30,00 Kč	228,00 Kč
3	612 42 5931 /00	Omítka vnitřního ostění oken a dveří vápenná štuková 1 1,3*0,8*2+0,85*0,6*4+1,3*1,1*2	m2	6,980 6,980	258,50 Kč	1 804,33 Kč
Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)						2 032,33 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						
4	968 07 1112 /00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken plochy do 1,5m2	ks	4,000	10,60 Kč	42,40 Kč
5	968 07 2245 /00	Vybourání rámu oken kovových jednoduchých plochy do 2m2 včetně likvidace 1 1,3*0,6*2	ks	3,000 1,560	475,00 Kč	1 425,00 Kč
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						1 467,40 Kč
Σ						5 016,46 Kč
rekapitulace						
31	Zdi podpěrné a volné			1 516,73 Kč		
61	Úprava povrchů vnitřní			2 032,33 Kč		
96	Bourání a demontáž konstrukcí			1 467,40 Kč		
Σ				5 016,46 Kč		

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		Plynofikace kasáren VÚ Bučovice				
objekt		SO 001 (Budova mužstva 1)				
dodatek		3 (výměna oken)				
typ činnosti		PSV				

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
761 (Konstrukce sklobetonové)						
1	761 12 2100 /00	Sklobetonová stěna tl. Do 10cm z tvárnice bezbarvých (19x19x8cm)	m2	1,300	3 430,00 Kč	4 459,00 Kč
	1 1*1,3			1,300		
Σ díl 761 (Konstrukce sklobetonové)						4 459,00 Kč
764 (Konstrukce klempířské)						
2	764 41 0240 /00	Krytina pozinkovaná oplechování parapetu r.š. 250mm	m	2,600	323,00 Kč	839,80 Kč
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)						839,80 Kč
766 (Konstrukce truhlářské)						
3		montáž plastových oken	m2	1,560	850,00 Kč	1 326,00 Kč
	1 1,3*0,6*2			1,560		
4		okno plastové 1300x600	ks	2,000	4 125,00 Kč	8 250,00 Kč
Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské)						9 576,00 Kč
784 (Malby)						
5	784 45 3601 /00	Malba PRIMALEX hliníková dvojnásobná tekutá bílé místnosti výšky do 3,8m	m2	11,480	18,75 Kč	215,25 Kč
	1 6,98+1,5*1,5+1,5*1,5			11,480		
6	998 78 6101 /Z0	přesun hmot výška-6	t	0,150	409,74 Kč	61,46 Kč
Σ díl 784 (Malby)						276,71 Kč
Σ						15 151,51 Kč

rekapitulace			
761	Konstrukce sklobetonové	4 459,00 Kč	
764	Konstrukce klempířské	839,80 Kč	
766	Konstrukce truhlářské	9 576,00 Kč	
784	Malby	276,71 Kč	
Σ		15 151,51 Kč	

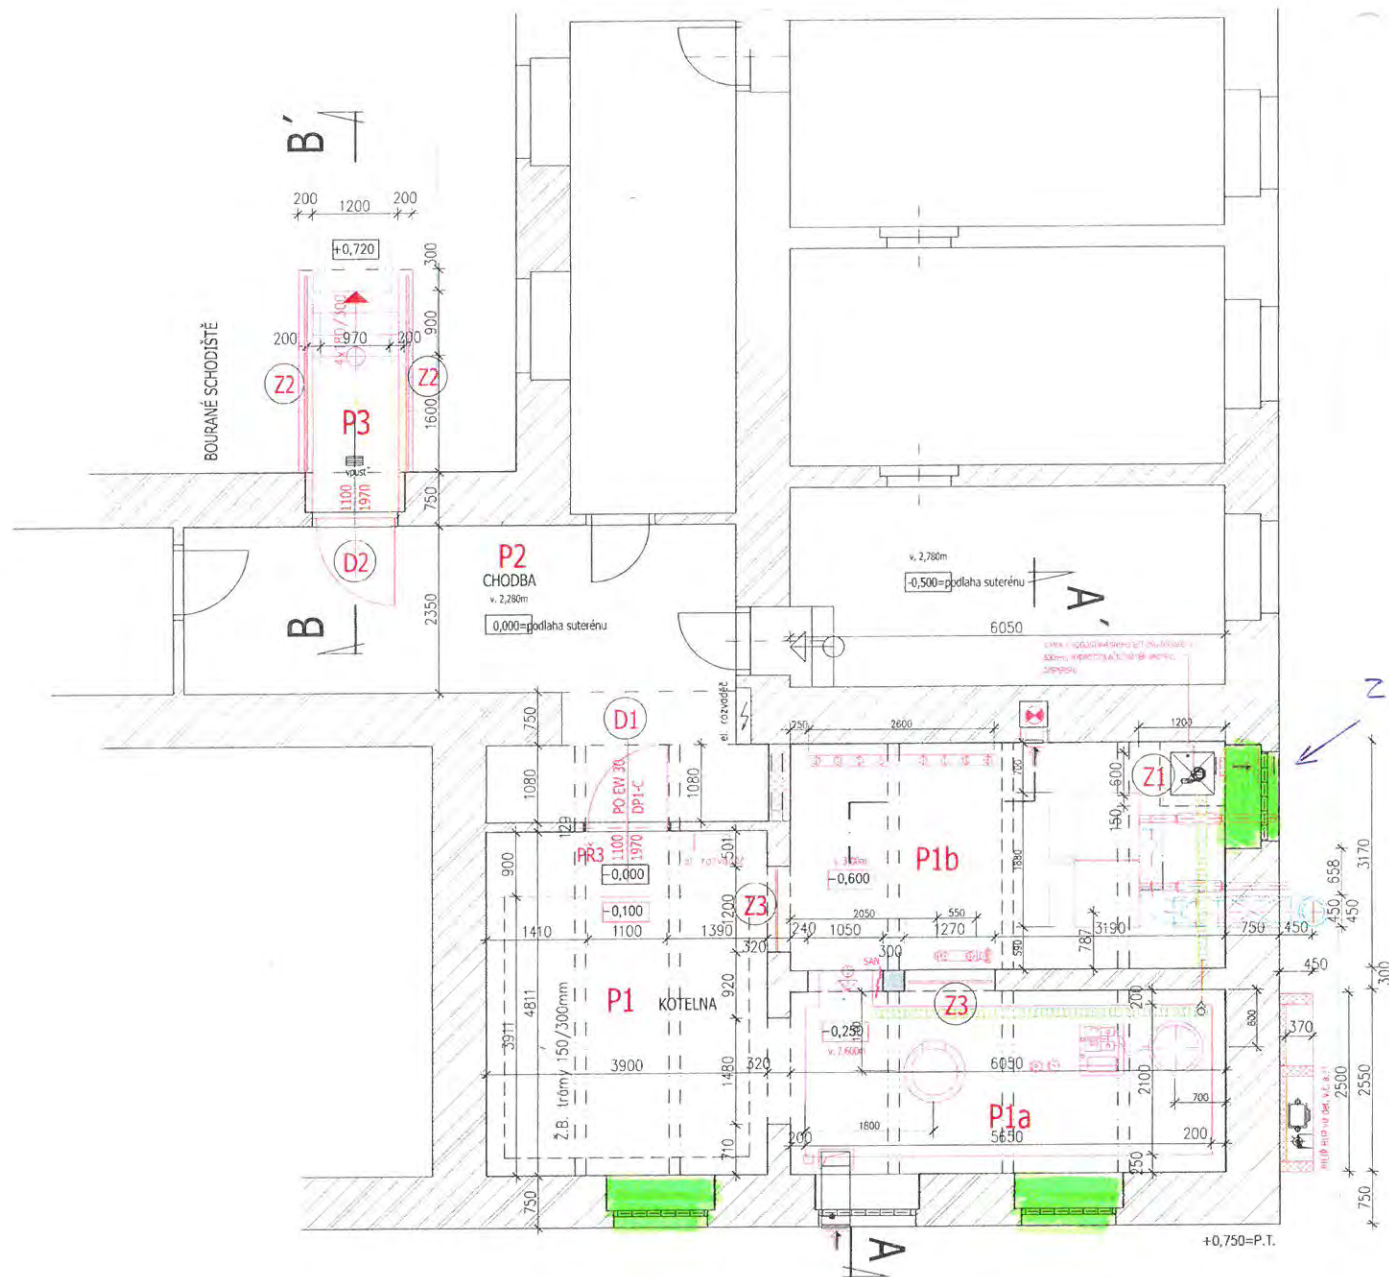

legenda místností--SO 033 --SUTERÉN

číslo	místnost	podlaha	počet stěn	počet stropů	plocha
P1	KOTELNA-vstupní prostor	výhlední stáv. podlahy pro jízdu o 100mm, nová bet. podlaha saražního betonu na malém zcm. výhlední stěbní dílna pro snížení obsahu a záložní bezpečnosti	stávající váp. omítky-větrik váp. -komerční saražní systém-odstranění vlhkosti, včetně san. omítek	podhled omítky-oprava	18,76m ²
P1a	KOTELNA-strojovna	DTTO - snížení podlahy o 250mm	stávající váp. omítky-větrik váp. -komerční saražní systém-odstranění vlhkosti, včetně san. omítek	podhled omítky-oprava	15,43m ²
P1b	KOTELNA-umístění kotlů	zasypání průhledně -nová bet.podlaha na kotež -0,600	stávající váp. omítky-větrik váp. -komerční saražní systém-odstranění vlhkosti, včetně san. omítek	podhled omítky-oprava	19,18m ²
P2	CHODBA	stávající bet. maz.	omítky nového zdiva, oprava stávajících vápenných omítek		
P3	VSTUPNÍ PROSTOR-SCHODIŠTĚ	bet. -základní dlažba il 60mm do kotež dří před vstupem	omítky nového zdiva, oprava stávajících vápenných omítek		2,60m ²

legenda materiálů-- SO 001 -- SUTERÉN

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE
STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
BOURANÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
NAVRŽENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z CINEL PLYNCH NA MVC
KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO C20/25
OBRYS - NOVÝ STAV - ROZSAH UPRAVŮVANÝCH PROSTOR
NAVRŽENÝ POLOHOVÝ ŽLAB, SPECIFIKACE VIZ PROJEKT ZTI, OSAZENÍ VIZ DETAIL v.2. 12
OSAZENÍ VĚTRACÍCH ELEMENTŮ - DODÁVKA VZT-DO STÁVAJÍCÍCH OKEN ZE SKLOBETONU - VYBOURÁNÍ, ZAČISTĚNÍ
PROSTUP cca 450/450mm PRO KOTLIN - VÝŠKOVÉ POD Ž.B.VĚNCEN-NADPRÁŽNÍ OKEN. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA DLE PROJEKTU Ú.T. TECHNOLOGIE KOTLINA TŘESLOŽKOVÝHO, KOVOVÝHO JE DODÁVKOU Ú.T.
NAVRŽENÁ SANACE TRHLIN V ŽEL. BET. PRŮVLAKU STROPŮ, VYPLNĚNÍ SANACÍ VÝPRAVKOVOU CEM. MALTOU. DOPORUČUJEME POSOUZENÍ STATIKEM A SLEDOVÁNÍ STAVU PORUCHY!
VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOTLINA- PO VYTĚPENÍ UHLÍM. BUDE POUŽIT PRO DOVĚTRÁNÍ KOTELNY VÝŠKA DO 20 m.

SO 001 Budova mužstva č.1

a.4 - Půdorys 1.PP - nový stav

1 : 50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 4	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – výměna armatur			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu 	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Otopná soustava má radiátory napojeny ventily a šroubeními v profilech o velikosti $\frac{3}{8}$", $\frac{1}{2}$" a $\frac{3}{4}$". V rozpočtech uvedeno šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$". Nesouhlasí i celkové počty ventilů, šroubení a termostatických hlavice, ve skutečnosti je v objektu navíc 13 otopných těles. <u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace uvažovala na všech otopných tělesech šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$", na stávající přípojku měl být navařen $\frac{1}{2}$" závit a na ně našroubována $\frac{1}{2}$" armatura. <u>Navrhované řešení</u> Stávající přípojky $\frac{3}{8}$" – $\frac{3}{4}$" budou po demontáži stávajících armatur délkově upraveny (proříznutí a zakrácení přípojky) a bude na ně namontována nová armatura v profilu dle stávající přípojky. Navíc budou osazeny armatury a termostatické hlavice u 13 otopných těles.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Důvodem provedení v různých profilech je jednodušší technické řešení, kdy nedojde ke změnám profilu mezi radiátorem a přívodem. Cena bude navýšena o počet příslušenství k radiátorům, se kterými PD neuvažovala.  BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Navržené řešení je technicky vhodnější a průtok otopnou soustavou nebude narušen zúžením profilu potrubí. S jejich provedením souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V průběhu zpracování nebylo řešeno a zmapováno napojení radiátorů otopné soustavy a byl požadavek na doplnění těsně před odevzdáním. Proto se provedl výpočet na modelový prvek (radiátor). Nebylo možné zajistit v krátkém časovém úseku vstup do všech prostor objektu SO 001 a prověřit skutečný stav.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska AHNM:

Fakturace odpovídá skutečnosti.

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



Ing. Aleš PINKAS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Poznámky:

Jedná se o změnu rozsahu předmětu – dle skutečnosti.




OZ č. 4 - Měření: Nov

02 č. 4

Starší slon

Oznámení změny č.4 - fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 4	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – výměna armatur			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 4	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Otopná soustava má radiátory napojeny ventily a šroubeními v profilech o velikosti $\frac{3}{8}$", $\frac{1}{2}$" a $\frac{3}{4}$". V rozpočtech uvedeno šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$". Nesouhlasí i celkové počty ventilů, šroubení a termostatických hlavice, ve skutečnosti je v objektu navíc 13 otopných těles.			
<u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace uvažovala na všech otopných tělesech šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$", na stávající přípojku měl být navařen $\frac{1}{2}$" závit a na ně našroubována $\frac{1}{2}$" armatura.			
<u>Navrhované řešení</u> Stávající přípojky $\frac{3}{8}$" – $\frac{3}{4}$" budou po demontáži stávajících armatur délkově upraveny (proříznutí a zakrácení přípojky) a bude na ně namontována nová armatura v profilu dle stávající přípojky. Navíc budou osazeny armatury a termostatické hlavice u 13 otopných těles.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



Ing. Aleš PINKAS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Přílohy :

- Tabulka profilů u jednotlivých radiátorů – po podlažích
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace


REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 69.426,00 Kč

Cena změny 85.302,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	15.876,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:

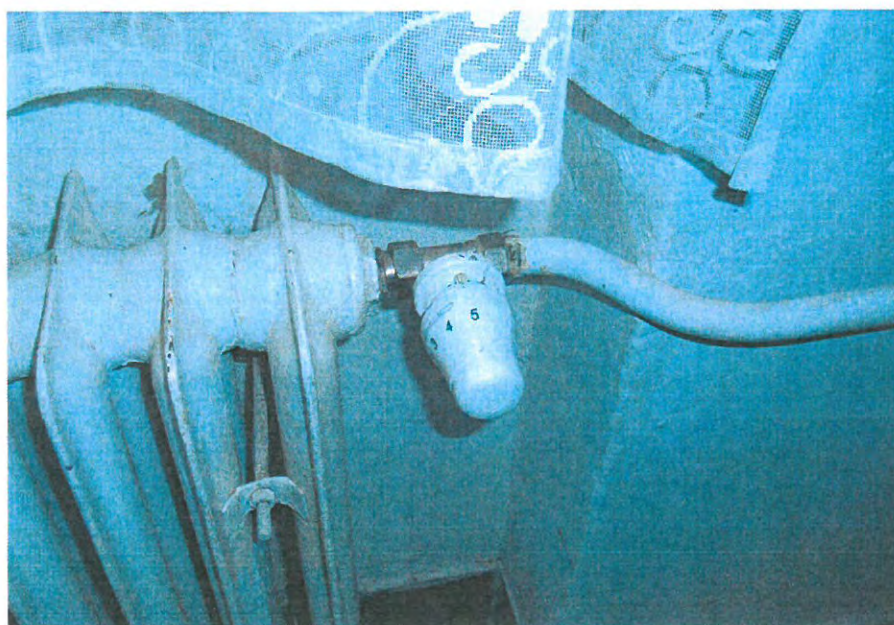

Přehled ventilů SO 001

SO 001	Suterén	I. N.P.	II. N.P.	III. N.P. + podkroví	Celkem
Ventil (šroubení) 3/4"	3	14	6	38	61
Ventil (šroubení) 1/2"		14	7	9	30
Ventil (šroubení) 3/8"		8	17	6	31
Součet	3	36	30	53	122



P. DIVIŠ



ZL č. 4

Změnový list č. 4 - výměna armatur SO 001

Vyčíslení víceprací - rozdíly mezi skutečností, odsouhlasenou se správou budov a PD v počtech a dimenzích vyměňovaných armatur

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace

01 - SO 001 Budova mužstva 1

Část: 01.7 - SO 001 - Výměna armatur

D1 - SO_01: Budova mužstva 1

D2 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

skutečnos rozpočet rozdíl

1	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - odříznutí potrubí a navaření návarku s novou armaturou	kus	0,00	220,000	-220,00	180,00	-39 600,00
			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených -úprava přípojky pro novou armaturu, prořezání - prodloužení závitů na stávající přípojce ručním závitovým očkem, zkrácení přípojky z důvodu delší stav. délky nové armatury 0,5 x 340,- 170 Kč/ks	kus	244,00	0,000	244,00	170,00	41 480,00

D3 - 734: Ústřední vytápění - armatury

2	K	734200822	Demontáž armatur závitových - ventilů, kohoutů a šroubení se dvěma závitů do1 "	kus	244,00	220,000	24,00	90,00	2 160,00
3	K	734221683	Hlavice termostatická kapalinová typu "K" Heimeier - do veřejných prostor - s ochranou proti odcizení a blokadě nastavené hodnoty	kus	122,00	110,000	12,00	225,00	2 700,00
			Ventily regulační závitové termostatické V exakt - přímé, G 3/8" - Heimeier	kus	31,00	0,000	31,00	190,00	5 890,00
4	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické V exakt - přímé, G 1/2" - Heimeier	kus	30,00	110,000	-80,00	225,00	-18 000,00
			Ventily regulační závitové termostatické V exakt - přímé, G 3/4" - Heimeier	kus	61,00	0,000	61,00	262,00	15 982,00
			Šroubení uzavírací regulační s vypouštěním Regulux přímé G 3/8" - Heimeier	kus	31,00	0,000	31,00	158,00	4 898,00
5	K	734261233	Šroubení uzavírací regulační s vypouštěním Regulux přímé G 1/2" - Heimeier	kus	37,00	110,000	-73,00	162,00	-11 826,00
			Šroubení uzavírací regulační s vypouštěním Regulux přímé G 3/4" - Heimeier	kus	54,00	0,000	54,00	208,00	11 232,00
6	K	734300822	Demontáž armatur - rozpojení šroubení, DN od 20 do 25	kus	244,00	220,000	24,00	20,00	480,00

D4 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

7	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních	kus	122,00	110,000	12,00	40,00	480,00
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	-------	-------	--------

CELKEM BEZ DPH

15 876,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 5	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – zkorodované potrubí stávajících stoupaček ÚT v budově			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 9.9.2015	
Způsob odeslání / předání poštu ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis Zápis zástupce Provozního střediska 	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající stoupačka ÚT v prostoru sociálního zařízení je zkorodovaná a teče. Připojovací růžice na stávajícím otopném tělese v 1.PP (místnost šití) jsou zkorodované a tečou.			
<u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace neřešila stávající stav systému ÚT v budově.			
<u>Navrhované řešení</u> Vyšším tlakem v systému po provedení prací a napojení na novou kotelnu se projeví netěsnosti stoupacího potrubí. V současném stavu dochází k trvalému odtékání upravené/změkčené vody z otopné soustavy. Řešení představuje: opětovné vypuštění vody ze systému, výměna zkorodované části potrubí DN 25 v délce 2,3 m, napojení dvou stávajících otopných těles na novou stoupačku, výměna růžic na otopném tělese v 1. PP, zpětné napuštění otopného systému.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel V případě, že se neprovede oprava, bude trvale docházet k úniku vody ze systému, ta se bude muset permanentně doplňovat, nebude možné řádně systém vyregulovat a zajistit správnou funkci vytápění; bude také docházet k zavzdušnění soustavy.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Pro správně fungující otopnou soustavu je nutné provést dané práce. S jejich provedením souhlasím.


Jméno: Ing. Karel Hróz


.....
SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

K úniku vody ze soustavy dochází v důsledku zkorodovaného potrubí. Projektová dokumentace neřešila stav otopné soustavy, nicméně pro funkční vytápění a vyregulování je odstranění úniku nutné.

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel má na základě smlouvy o výpůjčce soustavu zapůjčenou a musí ji vrátit v provozuschopném stavu. Proto je provedení opravy nutné

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


.....
Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS

souhlasím.


.....
AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Poznámky:

Jedná se o změnu rozsahu předmětu – dle skutečnosti.

Zápis z KD koordinátorů BOBP.

9.9.2015

Provedení kontrol stavení a protihavarijních prání, koordinace zhotovitelů dle plánů BOBP (účast na KD zástupce stavby), kontrola poskytnutí stavebních OOPP.

1. Upozornění na provádění stavebních prání na šebitu, mostě, popálení a padl pracovníků
 2. Nepovolit stavební práce na šebitu, poskytnutí pomoci ležení, např. pracovní plochy:
 T: ihned Odpověď: Nováček

Ostatní už samozřejmě zápis

[Signature]

SO 01 - spuštění plyn. kotelen pro ohřev TUV 9. 11. 9. 2015

- spuštění soustavy UT, oplocení
 prokázání slova potrubí - elipsové
 zpidní napětí - více práce

[Signature]
 ELIŠKA OBRÁTKA
 DUB

SO 13 - montáž technologie dopravního kotelního a ohřevu TUV

- montáž elického a D&R pro moderní plyn. kotelnu

SO 41 - montáž technologie nové plyn. kotelní

- dokončení montáže systému vyčerpání TVA, napětí, kotel. zbudování

SO 33 - montáž kotelny rozvodů v 1. P.P. části mlékárny, napojení stupnic

VZT - montáž systému VZT a odvětrávání plyn. kotelní SO 13, 06, 33, 41, 07

SO 18 - servis plynových TVA - montáž do provozu, spuštění plyn.


[Signature]

[Signature]

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 5	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 01 Budova mužstva 1 – zkorodované potrubí stávajících stoupaček ÚT v budově			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:		Oznámení změny č. 5	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
		Půdorys s vyznačením místa	
		Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající stoupačka ÚT v prostoru sociálního zařízení je zkorodovaná a teče. Připojovací růžice na stávajícím otopném tělese v 1.PP (místnost šití) jsou zkorodované a tečou.			
<u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace neřešila stávající stav systému ÚT v budově.			
<u>Navrhované řešení</u> Vyšším tlakem v systému po provedení prací a napojení na novou kotelnu se projeví netěsnosti stoupacího potrubí. V současném stavu dochází k trvalému odtékání upravené/změkčené vody z otopné soustavy. Řešení představuje: vypuštění vody ze systému, výměna zkorodované části potrubí DN 25 v délce 2,3 m, napojení dvou stávajících otopných těles na novou stoupačku, výměna růžic na otopném tělese v 1. PP, zpětné napuštění otopného systému.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor




Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Přílohy :


- dle textu


REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... nebylo předmětem zakázky

Cena změny 13.634,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	13.634,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 24. 11. 2015

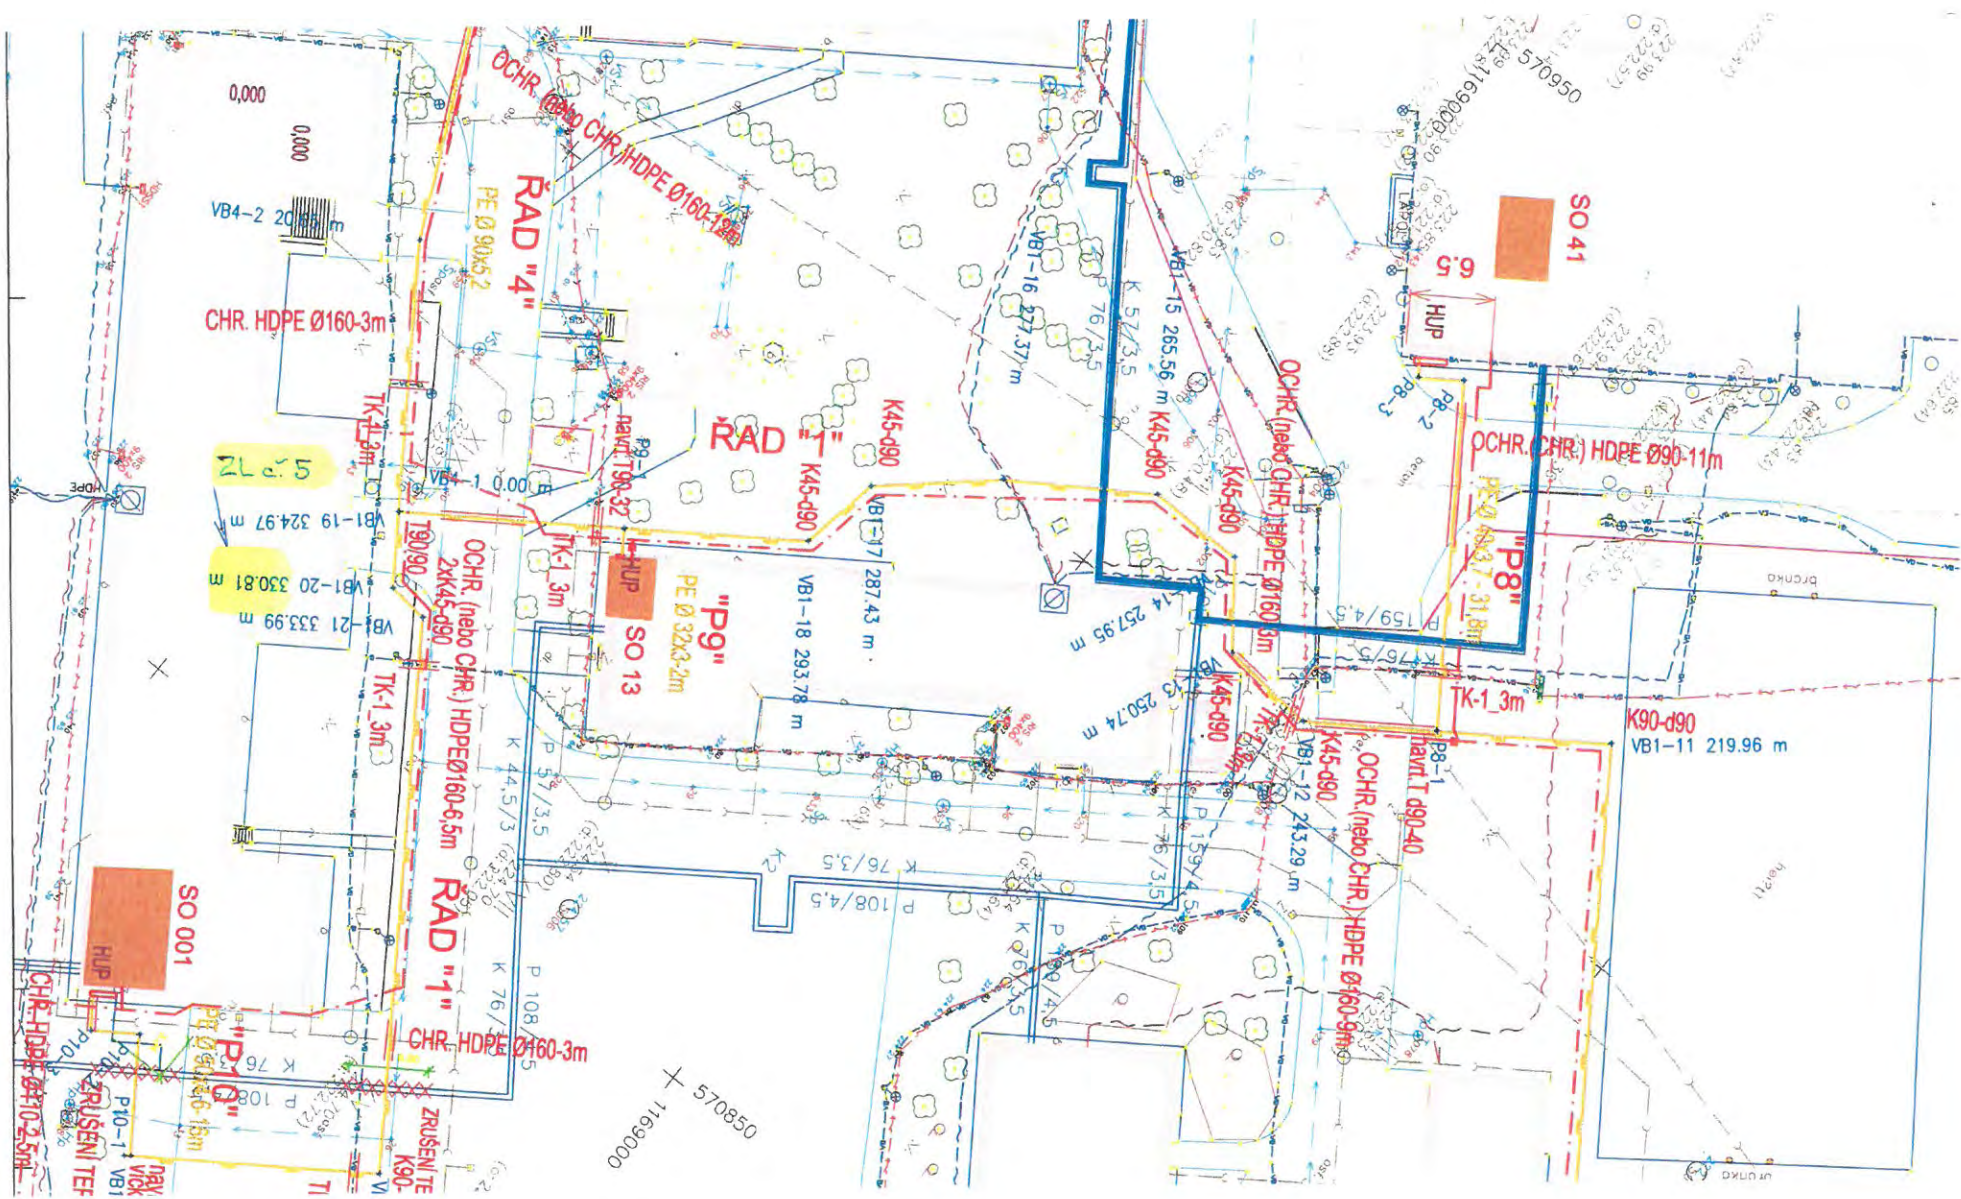

Změnový list č. 5 - fotodokumentace



Změnový list č. 5 - fotodokumentace





VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Stavba:

30.9.2015

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt:


**SO 001 Oprava zkorodovaného potrubí na sociál.zařízení, výměna
radiátor.růžic na otop.tělesech v 1. P.P.**

Soupis:

BOSS montáže, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

				Cena celkem			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK	[CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							13 634
1		735494811	vypuštění vody z otop.soustav	m2	600	6	3600
		735191910	napuštění vody do topného systému	m2	600	9	5400
		733110806	demontáž potrubí ocel. DN 25	m	8	20	160
	R		vybourání prostupu strop.konstrukci	ks	1	290	290
		733191816	odřezání přípojek otop.těles	ks	2	6	12
		734200821	demontáž armatur 1/2", 2 závit	ks	4	65	260
		734200813	demontáž růžic 6/4"	ks	2	48	96
		733111105	potrubí nízkotlaké ocel. DN 25	m	8	245	1960
		733194912	navaření odbočky 1/2" na potrubí	ks	2	130	260
	SPC		růžice 6/4" x 1/2"	ks	2	38	76
		734209107	montáž růžic 6/4"	ks	2	35	70
		734209113	montáž armatur 1/2", 2 závit	ks	4	65	260
		733191112	manžeta prostupová do DN 32	ks	1	205	205
		783425412	nátěr potrubí dvojnás.do DN 50	m	8	50	400
	R		zapravení prostupu strop.konstrukci	ks	1	585	585
							13634

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 6	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 02 Budova mužstva 2 – izolace proti vodě			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Prostory nové strojovny jsou pod úrovní terénu. V těchto prostorách jsou zdi značně vlhké vlhkostí, která se do zdi dostává z okolního terénu díky chybějící svislé izolaci. <u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace řeší pouze sanaci vnitřních prostor, navrhuje odstranění vlhkosti nové strojovny pomocí vodorovné infuzní clony a sanačních omítek s vodorovnou izolací podlah. <u>Navrhované řešení</u> Zhotovitel navrhuje odizolování použitím nerez vtláčených plechů po obvodu strojovny, provedení svislé izolace asfaltovými pásy, doplnění novou folií, utěsnění prostupu předizolovaného potrubí teplovodu do prostoru strojovny, zazdění stávajícího teplovodního kanálu. Infuzní clona bude nahrazena mechanickou izolací nerezovými plechy. Sanační omítky budou provedeny dle PD.			
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: zhotovitel Při použití projektem navrženého řešení by docházelo k výskytu zvýšené vlhkosti, kterou by infuzní clona a sanační omítky nebyly schopny absorbovat. Zhotovitel by nemohl držet záruku, protože by docházelo k trvalému poškození omítek vlhkostí. Vlhkostí by mohlo docházet i k poškození technologického zařízení teplovodní strojovny v objektu SO 002.  BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Vzhledem k vysokému procentu vyskytující se a vztlínající vlhkosti je nutné prostory sanovat. S navrženými pracemi souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Zkvalitňování obvodových stavebních konstrukcí nebylo předmětem zadání PD (není v majetku AS-PO). V průběhu stavebně-technického průzkumu před zahájením projektových prací (před 3 lety) nebylo zatékání povrchových vod zaregistrováno. Poškození vnitřních omítek bylo způsobeno kondenzací páry. V současné době dochází k průniku vody do prostorů kotelný v době intenzivních dešťů.

Navržené řešení odstranění vlhkosti mechanickou zábranou doporučuji.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s navrženou změnou. Důvodem je skutečnost, že by nerealizací navržených prací docházelo k znehodnocení provedených prací, hlavně zabudované technologie předávací stanice.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o změnu řešení.

So 002 02 č. 6
Stalovojči star-



ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 6	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 02 Budova mužstva 2 – izolace proti vodě				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015		
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:		Oznámení změny č. 6		
		Fotodokumentace skutečného provedení		
		Výkres - půdorys		
		Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Prostory nové strojovny jsou pod úrovní terénu. V těchto prostorách jsou zdi značně vlhké vlhkostí, která se do zdi dostává z okolního terénu díky chybějící svislé izolaci. <u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace řeší pouze sanaci vnitřních prostor, navrhuje odstranění vlhkosti nové strojovny pomocí vodorovné infuzní clony a sanačních omítek s vodorovnou izolací podlah. <u>Navrhované řešení</u> Zhotovitel navrhuje odizolování použitím nerez vtláčených plechů po obvodu strojovny, provedení svislé izolace asfaltovými pásy, doplnění nopovou folií, utěsnění prostupu předizolovaného potrubí teplovodu do prostoru strojovny, zazdění stávajícího teplovodního kanálu. Infuzní clona bude nahrazena mechanickou izolací nerezovými plechy. Sanační omítky budou provedeny dle PD.				
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.				
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.				

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :


- Půdorys PP objektu SO 02
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 58.444,50 Kč


Cena změny 68.807,22 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	10.362,72 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:

ZL č. 6
skutečné provedení



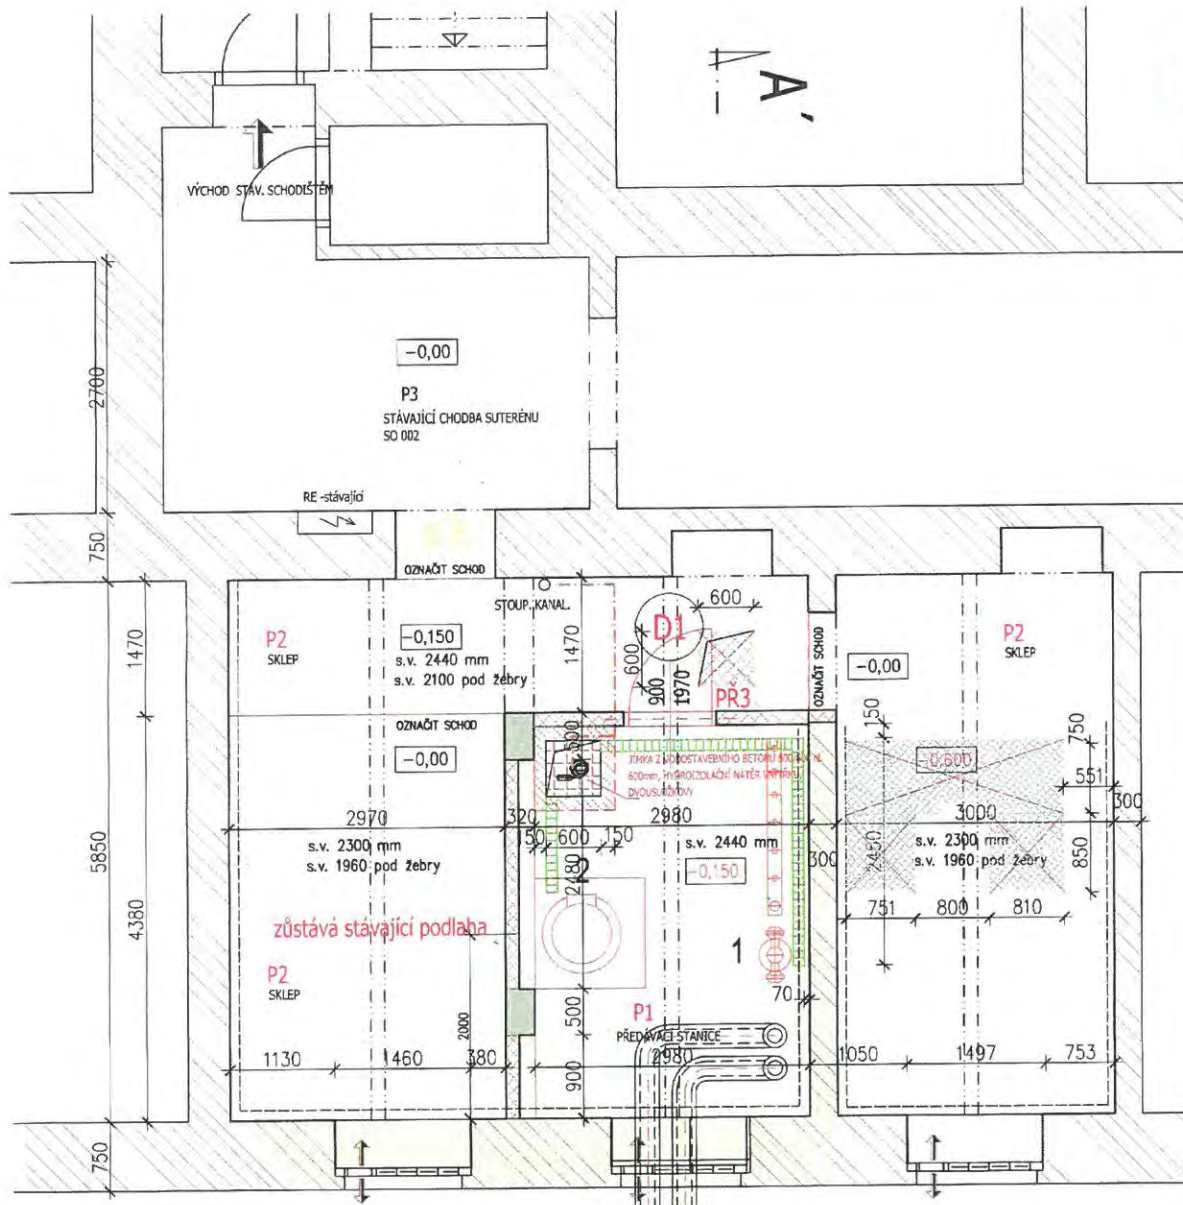

legenda materiálů- SO 002 - SUTERÉN

č.m.	místnost	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	plocha
P1	PŘEDÁVACÍ STANICE	stáv. bet.maz. podlahy včetně podkladního betonu se vybourá nová nová bet. podlaha ze sanačního betonu ukončená samoniv. cem. vyrovnáv. stěrkou+ dis.p nátěr pro snížení ohrubů a zajištění bezpečnosti. Pod ohřív. TUV pos. 2 zesílit podl. bet. na 300mm -základ 1,2x1,2m.	stáv.-váp. štukomítka-vlhkost vlhkost-vlhkost omítka vlnitost, kompletní sanační systém dodatečného odvětrání vlhkosti, provedení sanační omítky a zpráva a odepření stávající vlhkosti, malba na par. omítku v rozestřích a rozsvětlených prostorech	stáv. strop žel. beton.tramový, omítka vápenná štuková	13,20m2
P2	SKLAD	bet. podlaha, sníží se o 150mm		podhled omítaný, ž.B.	40,10m2
P3	CHODBA	stávající		žebrový strop	

legenda materiálů- SO 002 - SUTERÉN

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO CIHLENÉ
- ZASYPÁNÍ PROHLUBNÉ INERTNÍM HUTNITELNÝM MATERIÁLEM(LUPEK, ŠTĚRK A POD), ZHUTNĚNÍ A PŘEBETONOVÁNÍ PODKL. BETONEM
- OBRYŠ - NOVÝ STAV
- stávající zákryt kanálů oc. rýh. plechem- demontovat včetně lemov. úhelníků
- BOURÁNÍ ZÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ V.S.
- NAVRŽENÝ PODLAHOVÝ ŽLAB. SPECIFIKACE VIZ PROJEKT ZTI, OSAZENÍ VIZ DETAIL
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MC 50
- STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO S VĚTRACÍ ŽALUZIÍ
- ROZSAH NAVRŽENÉHO PROVEDENÍ SANACE-ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

SO 002 Budova mužstva č.2
a.3 - Půdorys-stavební úpravy

1 : 50

ZL č. 6

VÝKAZ VÝMÉR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		Plynofikace kasáren VÚ Bučovice					
objekt		002 (méněpráce izolace)					
typ činnosti		PSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
		711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)					
4		odpočet chemické izolace z rozpočtu - položka 71, 72 rozpočtu	kompl.	1,000		58 444,50 Kč	58 444,50 Kč
		Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)					58 444,50 Kč
		Σ					58 444,50 Kč
rekapitulace							
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti				58 444,50 Kč	
	Σ					58 444,50 Kč	

30.9.2015

BOSS montáže, s.r.o.

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
30.9.2015	

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	SO 002 (Budova mužstva 2) izolace proti vodě

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

BOSS montáže, s.r.o.	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Družstevní 184, 685 01 Bučovice	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	37 266,61 Kč	30 548,23 Kč	- Kč	67 814,84 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	992,38 Kč	- Kč	992,38 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	37 266,61 Kč	31 540,61 Kč	- Kč	68 807,22 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		68 807,22 Kč
<i>DPH</i>	<i>21% ze základu</i>	14 449,52 Kč
Σ		83 256,73 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		Plynofikace kasáren VÚ Bučovice					
objekt		SO 002 (Budova mužstva 2)					
dodatek		2 (oprava izolace skutečnost)					
typ činnosti		HSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
12 (Odkopávky a prokopávky)							
1	120 90 1123 /00	Bourání konstrukcí ve výkopu ze zdiva železobetonového nebo předpjatého	m3	2,121	8 899,00 Kč	18 874,78 Kč	
	1	3,0*0,5*0,15*4+3,3*0,4*0,8+3*0,5*0,11		2,121			
2	122 20 1101 /00	Odkopávky nezapažené v hornině 3 objemu do 100 m3	m3	1,690	100,50 Kč	169,85 Kč	
	1	1,69		1,690			
Σ díl 12 (Odkopávky a prokopávky)							19 044,62 Kč
13 (Hloubené vykopávky)							
3	132 20 1201 /00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v horninách 3 do 100 m3	m3	6,289	256,00 Kč	1 610,09 Kč	
	1	(1,0+0,3+2,98+0,3+1,0)*1,3*1,1-1,69		6,289			
4	132 20 2101 /00	Hloubení rýh šířky do 60cm v soudržných horninách 3 ručně	m3	0,893	659,00 Kč	588,36 Kč	
	1	(1+0,3+2,98+0,3+1,0)*0,8*0,2		0,893			
Σ díl 13 (Hloubené vykopávky)							2 198,44 Kč
16 (Přemístění výkopku)							
5	161 10 1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m	m3	8,871	57,00 Kč	505,65 Kč	
	1	1,69+6,289+0,892		8,871			
Σ díl 16 (Přemístění výkopku)							505,65 Kč
17 (Konstrukce ze zemin)							
6	174 10 1101 /00	Zásyp zhutněný -jam, rýh, šachet	m3	8,500	70,00 Kč	595,00 Kč	
	1	8,5		8,500			
Σ díl 17 (Konstrukce ze zemin)							595,00 Kč
31 (Zdi podpěrné a volné)							
7	310 23 9411 /00	Zazdivka otvorů cihlami pálenými plocha do 4 m2 zdivo malta MC	m3	1,296	3 609,00 Kč	4 677,26 Kč	
	1	(1,5*0,3*0,8+1,2*0,3*0,8)*2		1,296			
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné)							4 677,26 Kč
62 (Úprava povrchů vnější)							
8	622 45 4511 /00	Oprava omítky cementové venkovní hladké do 50% opr. plochy	m2	8,370	154,50 Kč	1 293,17 Kč	
	1	(1,0+0,3+2,98+0,3+1,0)*1,5		8,370			
9	622 45 9141 /00	Postřik fasády maltou cementovou -lžici	m2	8,370	46,00 Kč	385,02 Kč	
	1	8,37		8,370			
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)							1 678,19 Kč
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							
10	631 31 2141 /00	Doplnění mazaniny betonem prostým do rýhy	m3	0,839	2 643,00 Kč	2 216,16 Kč	
	1	(1,0+0,3+2,98+0,3+1,0)*1,0*0,15		0,839			
11	631 57 2111 /00	Doplnění násypů štěrkopískem plocha přes 2m2	m3	0,920	747,50 Kč	687,70 Kč	
	1	(4,6)*1,0*0,2		0,920			
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							2 903,86 Kč
93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb)							
12	938 53 3111 /00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	6,900	56,50 Kč	389,85 Kč	
	1	4,6*1,5		6,900			
Σ díl 93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb)							389,85 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)							
13	965 04 2131 /00	Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10cm plochy do 4m2	m3	1,120	1 125,00 Kč	1 260,00 Kč	
	1	5,6*1,0*0,2		1,120			
14	969 01 1121 /00	Vybourání potrubí vodovodního, plynového apod. do DN 52mm	m	2,000	26,50 Kč	53,00 Kč	
15	969 01 1131 /00	Vybourání potrubí vodovodního, plynového apod. do DN 125mm	m	2,000	31,00 Kč	62,00 Kč	
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)							1 375,00 Kč
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							
16	978 02 3411 /00	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínové	m2	8,400	36,00 Kč	302,40 Kč	
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							302,40 Kč
99 (Přesun hmot)							
17	999 28 1111 /00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů do výšky 25m	t	6,883	522,50 Kč	3 596,34 Kč	
Σ díl 99 (Přesun hmot)							3 596,34 Kč
Σ							37 266,61 Kč

rekapitulace

12	Odkopávky a prokopávky	19 044,62 Kč
13	Hloubené vykopávky	2 198,44 Kč
16	Přemístění výkopku	505,65 Kč

Změnový list č. 6 - rozpočet /str.4/

17	Konstrukce ze zemin	595,00 Kč
31	Zdi podpěrné a volné	4 677,26 Kč
62	Úprava povrchů vnější	1 678,19 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 903,86 Kč
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	389,85 Kč
96	Bourání a demontáž konstrukcí	1 375,00 Kč
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot	302,40 Kč
99	Přesun hmot	3 596,34 Kč
Σ		37 266,61 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		Plynofikace kasáren VÚ Bučovice					
objekt		SO 002 (Budova mužstva 2)					
dodatek		2 (oprava izolace skutečnost)					
typ činnosti		PSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)							
1		Izolace proti vlhkosti vodorovná vtlačení nerezových plechů tl.stěny do 450 mm	m	5,980		1 289,50 Kč	7 710,67 Kč
	1	0,5+0,5+4,38+0,6		5,980			
2		Izolace proti vlhkosti vodorovná vtlačení nerezových plechů tl.stěny do 900 mm	m	4,600		3 421,00 Kč	15 736,60 Kč
	1	0,32+2,98+0,3+1,0		4,600			
3	711 11 2001 /00	Izolace proti zemní vlhkosti za studena svislá -nátěr penetrační	m2	8,370		12,30 Kč	102,95 Kč
	1	(1,0+0,3+2,98+0,3+1,0)*1,5		8,370			
4	711 14 2559 /00	Izolace proti zemní vlhkosti přitavená svislá -pásy NAIP	m2	8,400		60,00 Kč	504,00 Kč
5	711 19 3131 /00	Izolace proti vlhkosti zdiva svislá -těsnící kaší Aquafin 2K	m2	9,800		354,00 Kč	3 469,20 Kč
6	711 74 7688 /00	Izolace detailu trubního prostupu na plášťovou trubu -NAIP průměru do 500mm	ks	2,000		959,00 Kč	1 918,00 Kč
7	711 83 2513 /00	Izolace svislá Fondaline Plus 2 m	m2	9,240		115,50 Kč	1 067,22 Kč
	1	8,4*1,1		9,240			
8	111 63 0001	Asfaltový lak penetrační ALP-Penetrat	t	0,017		14 970,00 Kč	251,50 Kč
	1	8,4*0,002		0,017			
9	628 32 0005	Pás asfaltovaný těžký BITAGIT V 60 S 40	m2	10,080		73,50 Kč	740,88 Kč
	1	8,4*1,2		10,080			
10	998 71 1101 /00	Přesun hmot izolací proti vodě objektu výšky do 6m	t	0,025		542,00 Kč	13,76 Kč
11	998 71 1101 /00	Přesun hmot izolací proti vodě objektu výšky do 6m	t	0,048		542,00 Kč	25,83 Kč
Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)							31 540,61 Kč
Σ							31 540,61 Kč
rekapitulace							
711		Izolace proti vodě a vlhkosti		31 540,61 Kč			
Σ				31 540,61 Kč			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 7	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 02 Budova mužstva 2 – výměna armatur			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu 	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Otopná soustava má radiátory napojeny ventily a šroubeními v profilech o velikosti $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " a $\frac{3}{4}$ ". V rozpočtech uvedeno šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$ ". Nesouhlasí i celkové počty ventilů, šroubení a termostatických hlavic, ve skutečnosti je v objektu navíc 25 otopných těles. <u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace uvažovala na všech otopných tělesech šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$ ", na stávající přípojku měl být navařen $\frac{1}{2}$ " závit a na ně našroubována $\frac{1}{2}$ " armatura. <u>Navrhované řešení</u> Stávající přípojky $\frac{3}{8}$ " – $\frac{3}{4}$ " budou po demontáži stávajících armatur délkově upraveny (proříznutí závitu a zakrácení přípojky) a bude na ně namontována nová armatura v profilu dle stávající přípojky. Navíc budou osazeny armatury a termostatické hlavice u 25 otopných těles.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Důvodem provedení v různých profilech je jednodušší technické řešení, kdy nedojde ke změnám profilu mezi radiátorem a přívodem. Cena bude navýšena pouze o počet příslušenství k radiátorům, se kterými PD neuvažovala.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Navržené řešení je technicky vhodnější a průtok otopnou soustavou nebude narušen zúžením profilu potrubí. S jejich provedením souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V průběhu zpracování nebylo řešeno a zmapováno napojení radiátorů otopné soustavy a byl požadavek na doplnění těsně před odevzdáním. Výměna armatur nebyla předmětem zadání. Proto se provedl výpočet na modelový prvek (radiátor). Nebylo možné zajistit v krátkém časovém úseku vstup do všech prostor objektu SO 02 a prověřit skutečný stav.

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:


Pro správnou funkci systému je potřeba provést úpravu všech radiátorů, aby bylo možné systém správně vyregulovat a nastavit. Není možné provést úpravu pouze na počtu radiátorů, který byl uveden v PD a zbytek (25 ks rad.) nechat v původním stavu.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS


Ing. Aleš PINKAS

AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Poznámky:


Jedná se o změnu rozsahu předmětu – dle skutečnosti.



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 7
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice		
Předmět změny: SO 02 Budova mužstva 2 – výměna armatur		
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015
Způsob odeslání / předání		
	poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 7
	na rozpočtové podklady:	Fotodokumentace skutečného provedení
		Soupis armatur dle podlaží – potvrzený PS
		Rozpočet
<u>Popis stávajícího stavu</u>		
Otopná soustava má radiátory napojeny ventily a šroubeními v profilech o velikosti $\frac{3}{8}$", $\frac{1}{2}$" a $\frac{3}{4}$". V rozpočtech uvedeno šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$". Nesouhlasí i celkové počty ventilů, šroubení a termostatických hlavice, ve skutečnosti je v objektu navíc 25 otopných těles.		
<u>Projektové řešení</u>		
Projektová dokumentace uvažovala na všech otopných tělesech šroubení a ventily o velikosti $\frac{1}{2}$", na stávající přípojku měl být navařen $\frac{1}{2}$" závit a na ně našroubována $\frac{1}{2}$" armatura.		
<u>Navrhované řešení</u>		
Stávající přípojky $\frac{3}{8}$" – $\frac{3}{4}$" budou po demontáži stávajících armatur délkově upraveny (proříznutí závitu a zakrácení přípojky) a bude na ně namontována nová armatura v profilu dle stávající přípojky. Navíc budou osazeny armatury a termostatické hlavice u 25 otopných těles.		
Důvod změny:		
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Zhotovitel		
Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.		
Technický dozor stavebníka		
Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.		

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Investor:**

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


.....
Armádní Servisní, p.o.**Zástupce uživatele:**

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS


Ing. Aleš PINKAS
.....
AHNM Praha, PS 0624 Vyškov**Přílohy :**


- Tabulka profilů u jednotlivých radiátorů – po podlažích
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 63.396,00 Kč

Cena změny 95.085,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	31.689,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:





Přehled ventilů SO 002

SO 001	Suterén	I. N.P.	II. N.P.	III. N.P. + podkroví	Celkem
Ventil (šroubení) 3/4"	3	20	2	33	58
Ventil (šroubení) 1/2"		21	6	8	35
Ventil (šroubení) 3/8"		2	31	2	35
Součet	3	43	39	43	128

p. DIVIS

[Handwritten signature]

PROVOZNI STŘEDISKO
Vyškov
0624

ZL č. 7

Změnový list č. 7 - rozpočet

Vyčíslení víceprací - rozdíly mezi skutečností, odsouhlasenou se správou budov a PD v počtech a dimenzích vyměřovaných armatur

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace

02 - SO 002 Budova mužstva 2

30.9.2015

Část: 02.7 - SO 002 - Výměna armatur

D1 - SO_02: Budova mužstva 2

D2 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

skutečnos rozpočet rozdíl

1	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - odříznutí potrubí a navaření návarku s novou armaturou	kus	0,00	206,000	-206,00	180,00	-37 080,00
			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených -úprava přípojky pro novou armaturu, prořezání - prodloužení závitů na stávající přípojce ručním závitovým očkem, zkrácení přípojky z důvodu delší stav.délky nové armatury 0,5 x 340,- 170 Kč/ks	kus	256,00	0,000	256,00	170,00	43 520,00

D3 - 734: Ústřední vytápění - armatury


2	K	734200822	Demontáž armatur závitových - ventilů, kohoutů a šroubení se dvěma závitů do1 "	kus	256,00	206,000	50,00	90,00	4 500,00
3	K	734221683	Hlavice termostatická kapalinová typu "K" Heimeier - do veřejných prostor - s ochranou proti odcizení a blokací nastavené hodnoty	kus	128,00	103,000	25,00	225,00	5 625,00
			Ventily regulační závitové termostatické V exakt - přímé, G 3/8" - Heimeier	kus	35,00	0,000	35,00	190,00	6 650,00
4	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické V exakt - přímé, G 1/2" - Heimeier	kus	35,00	103,000	-68,00	225,00	-15 300,00
			Ventily regulační závitové termostatické V exakt - přímé, G 3/4" - Heimeier	kus	58,00	0,000	58,00	262,00	15 196,00
			Šroubení uzavírací regulační s vypouštěním Regulux přímé G 3/8" - Heimeier	kus	35,00	0,000	35,00	158,00	5 530,00
5	K	734261233	Šroubení uzavírací regulační s vypouštěním Regulux přímé G 1/2" - Heimeier	kus	35,00	103,000	-68,00	162,00	-11 016,00
			Šroubení uzavírací regulační s vypouštěním Regulux přímé G 3/4" - Heimeier	kus	58,00	0,000	58,00	208,00	12 064,00
6	K	734300822	Demontáž armatur - rozpojení šroubení, DN od 20 do 25	kus	256,00	206,000	50,00	20,00	1 000,00

D4 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

7	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních	kus	128,00	103,000	25,00	40,00	1 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	-------	-------	----------

CELKEM BEZ DPH

31 689,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 8	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 02 Budova mužstva 2 – okno, parapet				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015		
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒				
Odkazy:		Popis 		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V rozpočtu SO 02 se vyskytují položky - stavební část D10, 7667.: Okna, vnější dveře (položky č. 76 – č.80 v celkové výši bez DPH 13.476,-), které neodpovídají skutečnosti. <u>Projektové řešení</u> PD ve výkresové části neobsahuje dodávky, které jsou popsány v rozpočtu. Jedná se o chybu v PD. <u>Navrhované řešení</u> Zhotovitel odečte výše uvedené položky jako neprovedené práce (méněpráce).				
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Oznámení vydává: zhotovitel Rozpor PD se skutečností zjištěn zhotovitelem a zpracován do změnového listu.  BOSS montáže, s.r.o.				

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím.


Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o méněpráce.

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 8	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 02 Budova mužstva 2 – okno, parapet				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015		
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 8		
		Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V rozpočtu SO 02 se vyskytují položky - stavební část D10, 7667.: Okna, vnější dveře (položky č. 76 – č.80 v celkové výši bez DPH 13.476,-), které neodpovídají skutečnosti. <u>Projektové řešení</u> PD ve výkresové části neobsahuje dodávky, které jsou popsány v rozpočtu. Jedná se o chybu v PD. <u>Navrhované řešení</u> Zhotovitel odečte výše uvedené položky jako neprovedené práce (méněpráce).				
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.				
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.				
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jiří Babor  Jiří Babor				

Investor:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Položkový rozpočet

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... 13.703,10 Kč

Cena změny - 13.703,10 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


- 13.703,10 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

30. 09. 2015

Měněpráce

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt: 02- SO 002 Budova mužstva 2

Část: 02.1 - SO 002 - a. stavební část

Místo: Bučovice

Datum: 31.07.2015

Objednavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant: VPÚ Plzeň

Zhotovitel: BOSS montáže s.r.o. Bučovice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

D9 - 764.: Konstrukce klempírske

-227,10

74	K	764410240	Oplechování parapetů včetně rohů Pz - rš 250 mm	m	1,200	-187,50	-225,00
75	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempírské v objektech v do 6 m	t	0,002	-1 050,00	-2,10

D10 - 7667.: Okna , vnější dveře

-13 476,00

76	K	766621103	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m	m2	2,880	-1 125,00	-3 240,00
77	M	01	okno dřevěné 1200/ 2400	kus	1,000	-9 750,00	-9 750,00
78	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	1,200	-112,50	-135,00
79	M	R607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	1,200	-262,50	-315,00
80	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,032	-1 125,00	-36,00


Součet

-13 703,10

Celkem měněpráce bez DPH

-13 703,10

30.9.2015

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 9	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 03 Ubytovna – stavební část - obklady			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V prostoru stávajícího sociálního zázemí se vyskytují obklady, které se budou obnovovat pouze částečně – v trasách vedení rozvodů.			
<u>Projektové řešení</u> Montáž a dodávka keramických obkladů obsahuje menší množství, než bude třeba ve skutečnosti.			
<u>Navrhované řešení</u> Vyčíslení skutečných výměr a porovnání s PD → je celkem 8,5 m ² ve skutečnosti bude třeba 14 m ² , zvýšení výměry činí 5,5 m ² . Větší potřebu obkladů si vyžádaly stavební úpravy spojené se zřízením náhradní úklidové místnosti.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Rozpor PD se skutečností zjištěn zhotovitelem a zpracován do změnového listu.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Pro zdárné dokončení díla je práce nutné provést. S jejich rozsahem souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz


.....
SAFETY PRO, s.r.o.**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Požadavek investora byl na minimalizaci nákladů, proto se navrhovaly výměny obkladů pouze v trasách vedení. Souhlasím s uvedeným navýšením.

Jméno: Ing. Jiří Babor




.....
Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



.....
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.


Oznámení změny č. 9 - fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 9	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 03 Ubytovna – stavební část – obklady			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 9	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
		Výkres - půdorys	
<u>Popis stávajícího stavu</u> V prostoru stávajícího sociálního zázemí se vyskytují obklady, které se budou obnovovat pouze částečně – v trasách vedení rozvodů.			
<u>Projektové řešení</u> Montáž a dodávka keramických obkladů obsahuje menší množství, než bude třeba ve skutečnosti.			
<u>Navrhované řešení</u> Doplnění obkladů a dlažeb, vyčíslení skutečných výměr, v PD je celkem 8,5 m ² ve skutečnosti bude třeba 14 m ² , zvýšení výměry činí 5,5 m ² . Větší potřebu obkladů si vyžádaly stavební úpravy spojené se zřízením náhradní úklidové místnosti.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
.....
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**



- Položkový rozpočet
- Půdorys s vyznačením zvýšených potřeb obkladů

REKAPITULACE CENY:


Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... ----

Cena změny 2.852,41 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	2.852,41 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:

ZL č. 9.
Slučně
provedení!

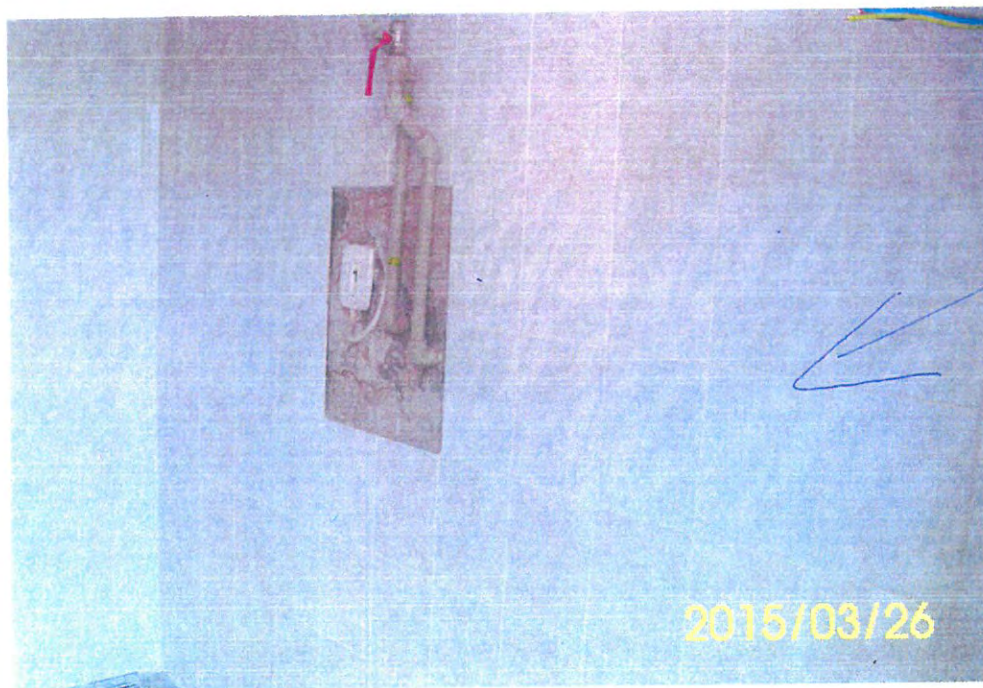

obklady keramické!



2015/03/26

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	
		30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	SO 003 vícepráce obklady

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	- Kč	1 821,16 Kč	- Kč	1 821,16 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	1 031,25 Kč	- Kč	1 031,25 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	- Kč	2 852,41 Kč	- Kč	2 852,41 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		2 852,41 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	599,01 Kč
Σ		3 451,42 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

<i>zakázka</i> <i>stavba</i> <i>objekt</i> <i>dodatek</i> <i>typ činnosti</i>		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice) Plynofikace kasáren VÚ Bučovice SO 003 (Úbytovna) 1 (vicepráce) PSV					
<i>pořadí</i>	<i>číslo</i>	<i>popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena</i>	<i>celkem</i>
781 (Obklady keramické)							
1	781 41 3114 /00	Montáž -obklad porovinový lepený do 45 ks/m2	m2	5,000	337,50 Kč	1 687,50 Kč	
2	597 61 0005	Obkladačky Blanka 25x33x0,7 l.jak.	m2	5,500	187,50 Kč	1 031,25 Kč	
3	998 78 1101 /00	Přesun hmot pro obklady keramické objektů do 6m	ks	1,000	133,66 Kč	133,66 Kč	
Σ díl 781 (Obklady keramické)							2 852,41 Kč
Σ							2 852,41 Kč
rekapitulace							
781		Obklady keramické				2 852,41 Kč	
Σ						2 852,41 Kč	

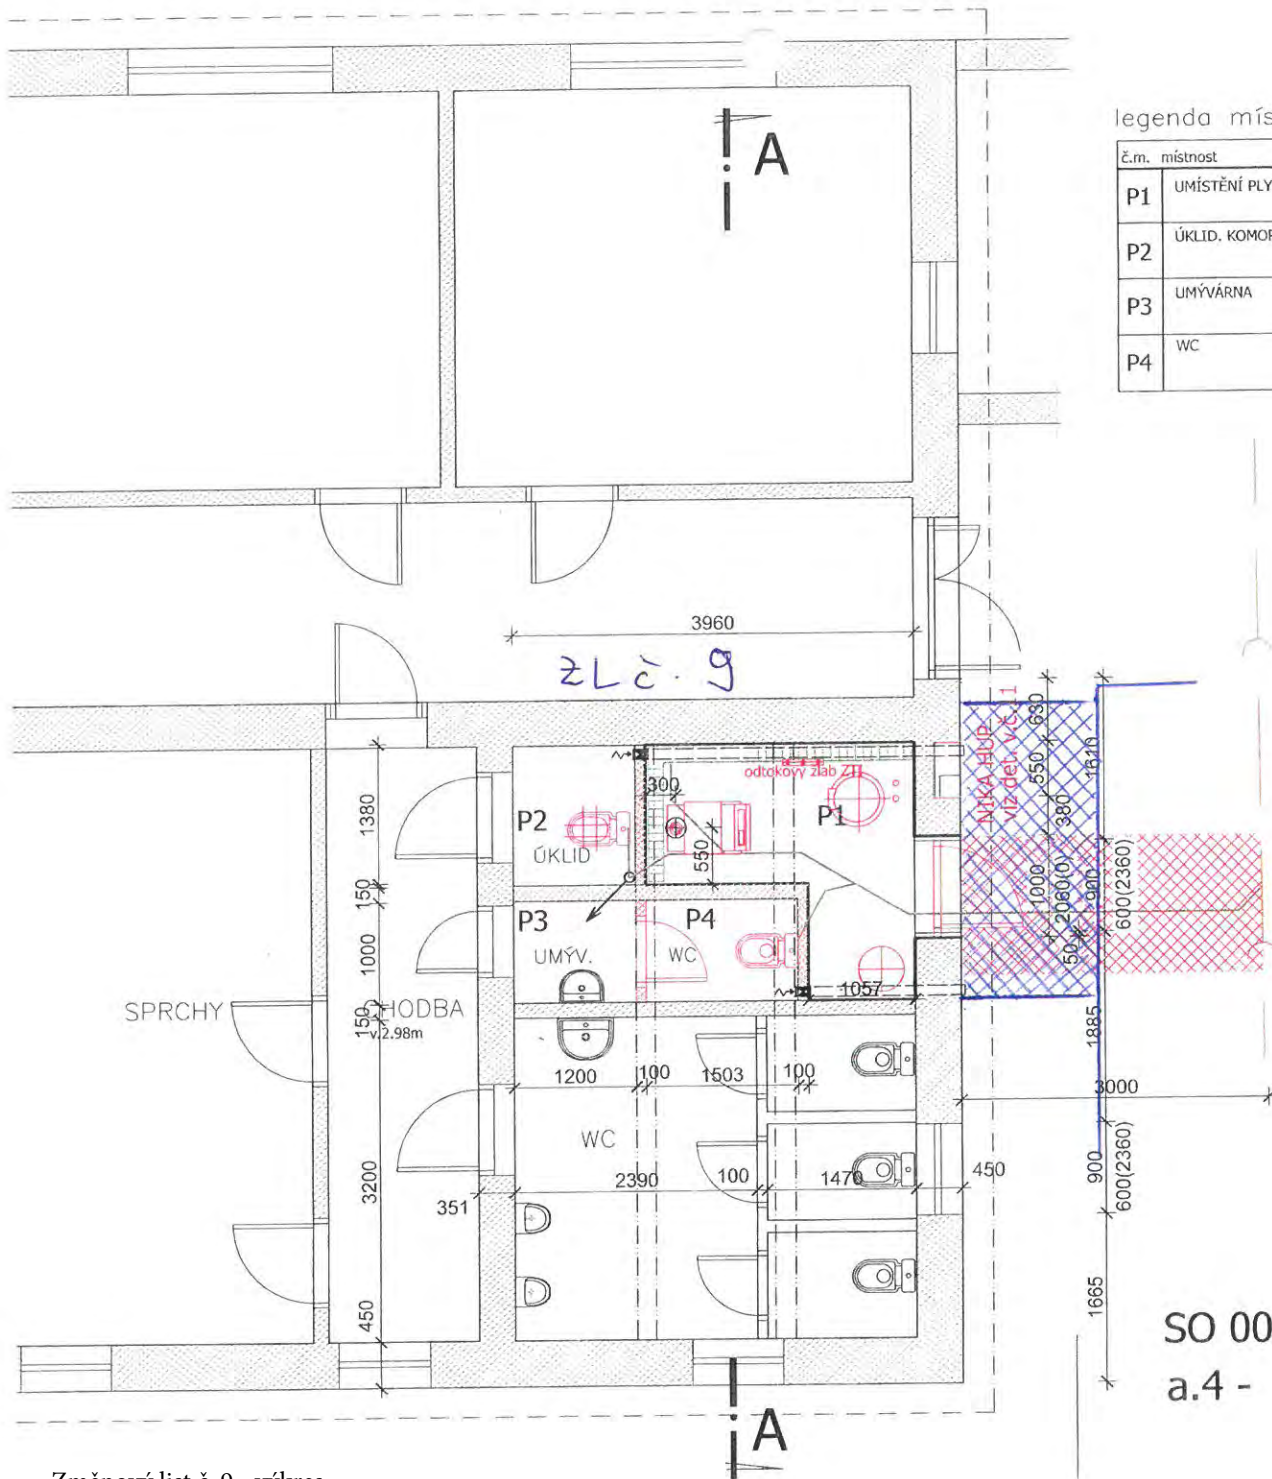

legenda místností- OBJ. SO 003 - PŘÍZEMÍ

č.m.	místnost	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	plocha
P1	UMÍSTĚNÍ PLYN. KOTLŮ	ker. dl.	štuk. omítka+K.O. v 2,1 m	štuk. om. stávající,v.3,45m	5,05m2
P2	ÚKLID. KOMORA	ker. dl.	štuk. omítka+K.O. v 2,1 m	štuk. om. stávající,v.3,45m	1,84m2
P3	UMÝVÁRNA	ker. dl.	štuk. omítka+K.O. v 2,1 m	štuk. om. stávající,v.3,45m	1,34m2
P4	WC	ker. dl.	štuk. omítka+K.O. v 2,1 m	štuk. om. stávající,v.3,45m	1,50m2

legenda materiálů- OBJ.SO 003 - PŘÍZEMÍ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY, SNÍŽENÉ, VÝŠKY 2,1m
	OPRAVA CHODNÍKU Z BETON. ZÁMKOVÉ DLAŽBY PO PROVEDENÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE, S ÚPRAVOU NIVELETY U VSTUPU DO P1 TAK, ABY NÁŠLAP BYL max. v.160mm. PROVEDE SE ZBORCENÍ PLOCHY CHODNÍKU S MAX. SKLONEM PRO NAVÁZÁNÍ DO 6,25%.
	SKUTEČNÉ PŘÍZEMÍ

SO 003 Ubytovna
a.4 - Půdorys- nový stav

1 : 50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 10	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 06 Klub útvaru - úprava podesty vchod do kotelny - úprava kanalizace pro odvod kondenzátu - poklop na kondenzátní jímce			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 19.8.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu 	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Před vstupem do kotelny je betonová plocha v úrovni podlahy kotelny s podlahovou vpustí, která je nefunkční (slepá). Zakreslená kanalizace vedená za objektem je dle informace PS (pana Divíše) neexistující. Při provádění prací zhotovitel zjistil, že kanalizační potrubí, do kterého měl být zaústěn odvod kondenzátu z kotelny neexistuje.			
<u>Projektové řešení</u> Kanalizace - stávající vpust' ve vchodu není dle provozovatele funkční. Při prohlídce nebyla zjištěna viditelně vedená vnitřní kanalizace. Vně budovy je vedena kanalizace, hloubka nebyla zjištěna. Vzhledem k zahloubené místnosti s podlahou 1,8 m pod terénem je řešeno odvedení vod do kanalizace přečerpáním z nově zřízené kondenzační jímky. Odvod kondenzátu z kotelny bude napojen na stávající venkovní kanalizaci vedenou podél zadní stěny objektu SO 06, dále bude před kotelnou vybudována nová revizní plastová šachta prům. 425 mm s poklopem. Ze šachty mělo být potrubí zaústěno do nově zhotovené odbočky ve stávajícím potrubí.			
<u>Navrhované řešení</u> Navrhujeme vybourání betonové plochy před vstupem, snížení terénu cca o 5 cm (zabránění zatékání do kotelny) – důvodem je, že kotelna již byla vyplavena dešťovými srážkami v průběhu prací na kotelně. Dále navrhujeme zhotovení vsakovací jímky a nové zámkové dlažby před vstupem do kotelny. Není jasné, zda je nutno vpust' pouze vyčistit, případně opravit její napojení na kanalizaci (v neznámé hloubce) vedoucí za objektem. Zhotovitel provede vyvedení kondenzátu potrubím a instalaci revizní šachty dle PD; odvedení kondenzátu z revizní šachty bude provedeno potrubím DN 100 vedeném v zeleném pásu a pouze v místě zpětného průchodu do objektu pod okapovým			

chodníkem, potrubí bude zaústěno přes obvodovou zeď do jiné místnosti v suterénu do vnitřního ležatého rozvodu /viz. výkres/.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Pro zabezpečení funkčnosti odvodu srážkových vod z venkovní podesty a odvodu kondenzátu z kotelny se nabízí jako neekonomičtější navržené řešení. Průchody v budově nejsou realizovatelné z hlediska vyšších nákladů (problém se zajištěním vstupů do místností, vystěhovávání místností, vyvolané stavební práce, úklidové práce). Poklop nad kondenzátní jímkou není obsažen ve smluvním rozpočtu., ale z důvodu bezpečnosti a na základě upozornění SOTD navrhujeme provedení ocelového rámu s poklopem z ocelového plechu pro zakrytí kondenzátní jímky.


BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Snížení podlahy podesty o 5 cm a vybudování vsaku zajistí, že kotelna nebude vyplavena přívalovým deštěm. Navržené řešení odvodu kondenzátu je vyhovující. Pro zdárné dokončení díla je práce nutno provést a s jejich rozsahem souhlasím.


Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Kanalizace za objektem byla zakreslena na základě dodaných podkladů. Navržené řešení zajistí bezproblémový chod kotelny. S navrženými pracemi souhlasím.


Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


Armádní Servisní, p.o.



Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

Oznámení změny č. 10 - stávající stav, resp. průběh real.



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice		
Předmět změny: SO 06 Klub útvaru - úprava podesty vchod do kotelny - úprava kanalizace pro odvod kondenzátu - poklop na kondenzátní jímce		
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒		
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:	Oznámení změny č. 10	
	Fotodokumentace skutečného provedení	
	Výkresová dokumentace	
	Rozpočet	
Stanovisko Provozního střediska AHNM		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Před vstupem do kotelny je betonová plocha v úrovni podlahy kotelny s podlahovou vpustí, která je nefunkční (slepá). Zakreslená kanalizace vedená za objektem je dle informace PS (pana Divíše) neexistující. Při provádění prací zhotovitel zjistil, že kanalizační potrubí, do kterého měl být zaústěn odvod kondenzátu z kotelny, neexistuje.		
<u>Projektové řešení</u> Kanalizace - stávající vpust' ve vchodu není dle provozovatele funkční. Při prohlídce nebyla zjištěna viditelně vedená vnitřní kanalizace. Vně budovy je vedena kanalizace, hloubka nebyla zjištěna. Vzhledem k zahloubené místnosti s podlahou 1,8 m pod terénem je řešeno odvedení vod do kanalizace přečerpáním z nově zřízené kondenzační jímky. Odvod kondenzátu z kotelny bude napojen na stávající venkovní kanalizaci vedenou podél zadní stěny objektu SO 06, dále bude před kotelnou vybudována nová revizní plastová šachta prům. 425 mm s poklopem. Ze šachty mělo být potrubí zaústěno do nově zhotovené odbočky ve stávajícím potrubí.		
<u>Navrhované řešení</u> Navrhujeme vybourání betonové plochy před vstupem, snížení terénu cca o 5 cm (zabránění zatékání do kotelny) – důvodem je, že kotelna již byla vyplavena dešťovými srážkami v průběhu prací na kotelně. Dále navrhujeme zhotovení vsakovací jímky a nové zámkové dlažby před vstupem do kotelny. Není jasné, zda je nutno vpust' pouze vyčistit, případně opravit její napojení na kanalizaci (v neznámé hloubce) vedoucí za objektem. Zhotovitel provede vyvedení kondenzátu potrubím a instalaci revizní šachty dle PD; odvedení kondenzátu z revizní šachty bude provedeno potrubím DN 100 vedeným v zeleném pásu a pouze v místě zpětného průchodu do objektu pod okapovým chodníkem, potrubí bude zaústěno přes obvodovou zeď do jiné místnosti v suterénu do vnitřního ležatého rozvodu /viz. výkres/.		

Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.	
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.	
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jiří Babor  Jiří Babor	
Investor: Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková nebo Bc. Petr Kroupa  Armádní Servisní, p.o.	
Přílohy : - dle odkazu v úvodu Změnového listu č. 10	
REKAPITULACE CENY: Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... -1.459,40 Kč Cena změny 32.529,03 Kč (uvedené částky jsou bez DPH)	
Výsledná cena změny bez DPH :	+ 31.069,63 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:  Datum:	Podpis zástupce objednatele:  Datum: 30. 09. 2015



SO 006 - nácepráve
- odvod kondenzátu

ZL č. 10





ZL č. 10

skutečné provedení




Sádrokartonový zábrus

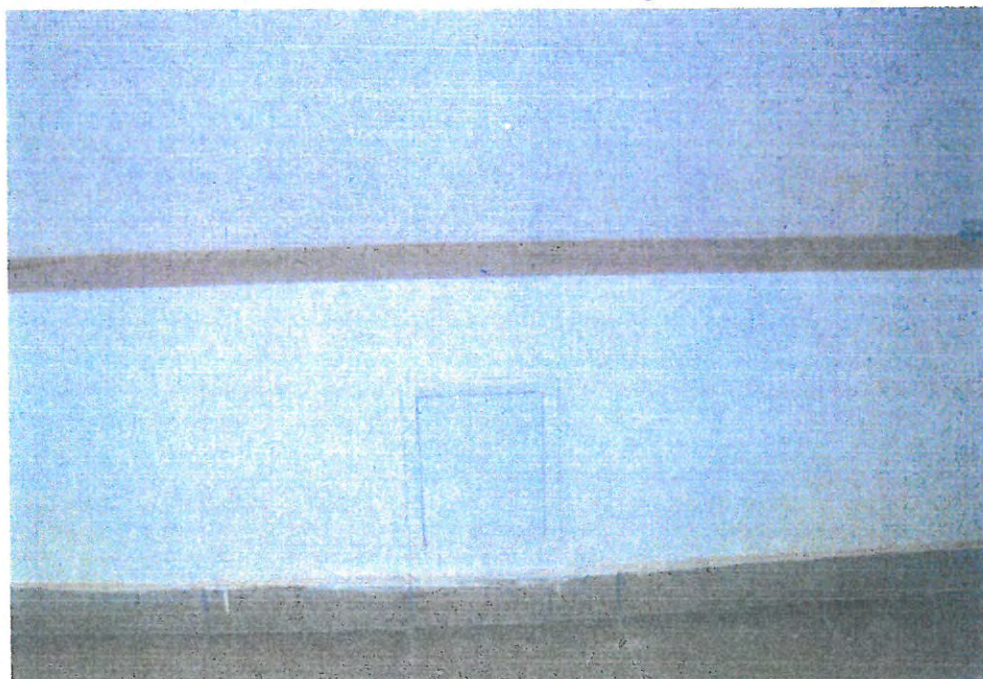

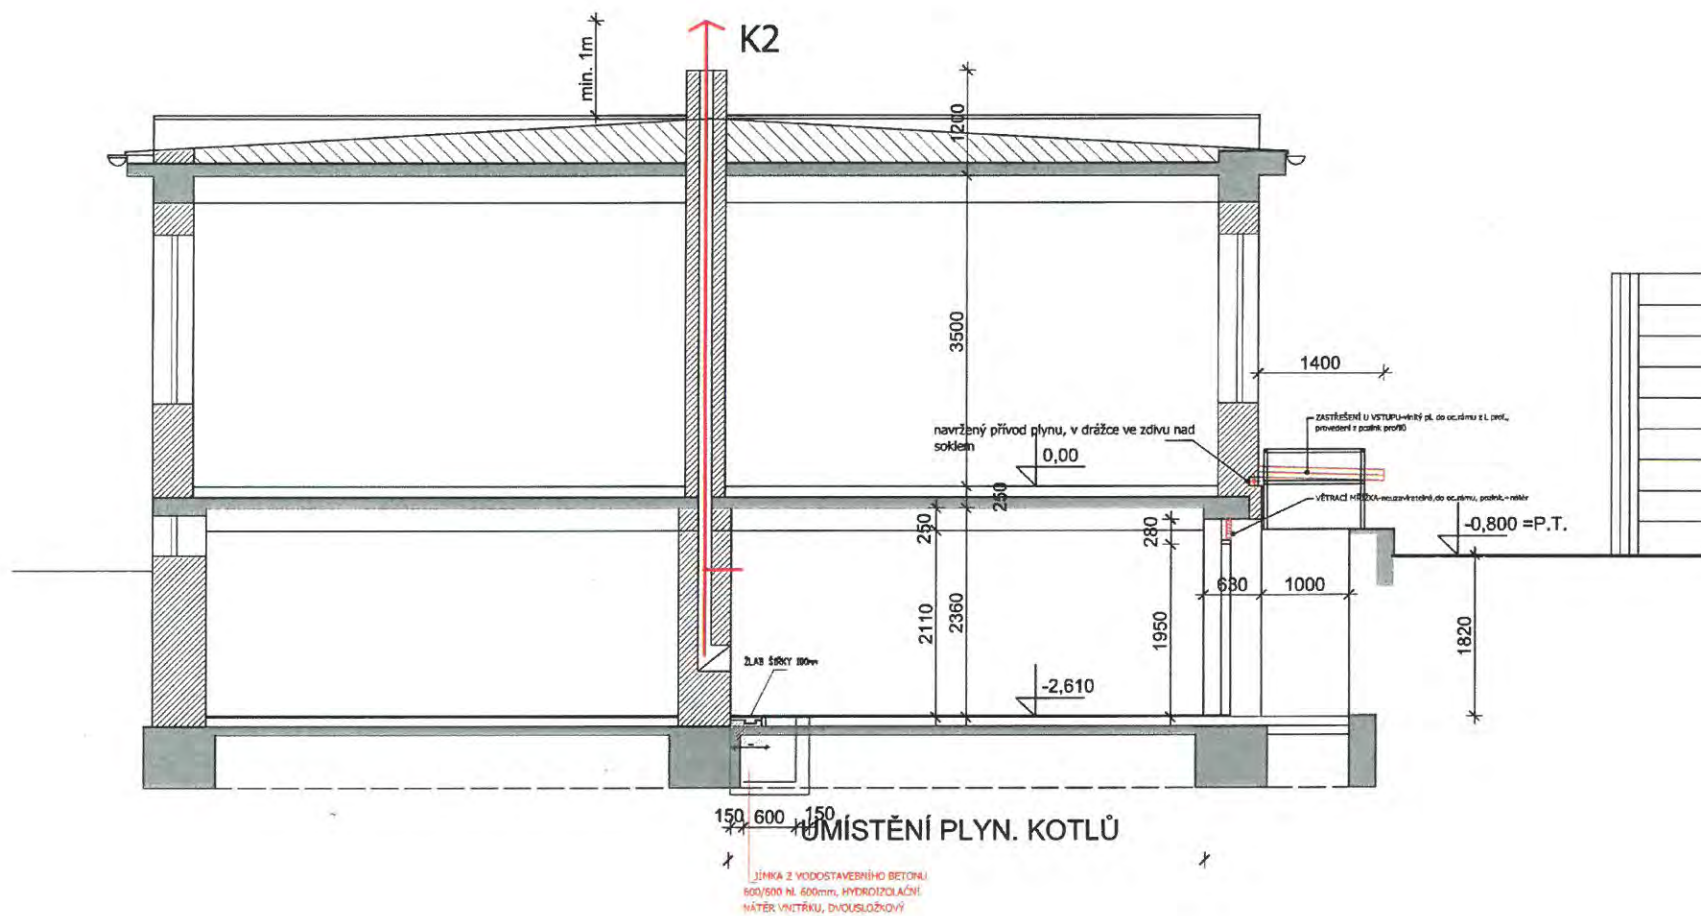

SO 006 Klub útvaru
a.8 - Řez B - B' - nový stav

1 : 50

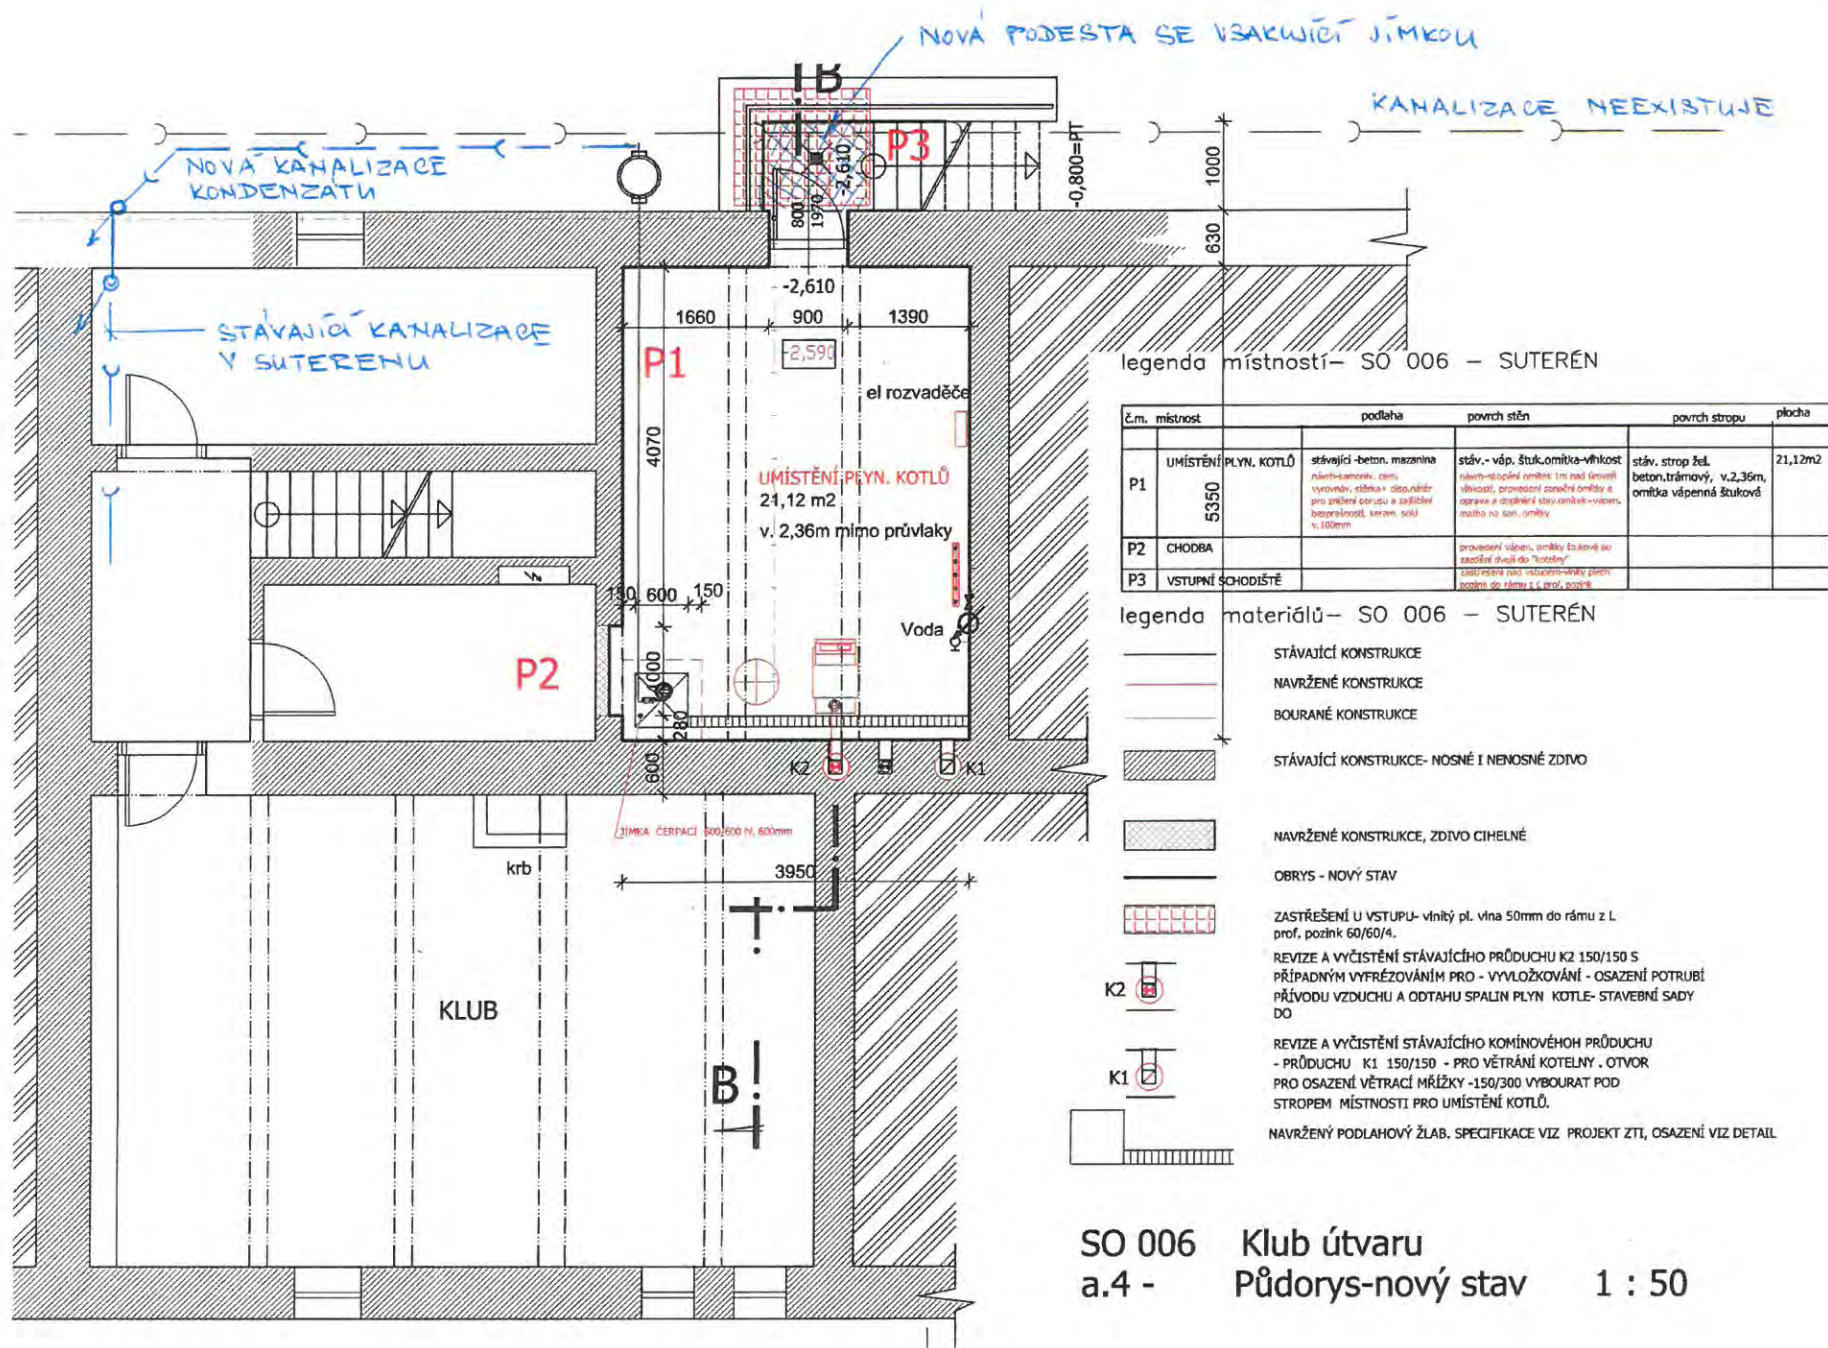

Méněpráce

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt: 04 - SO 006 Klub útvaru

Část: 6.3 - SO 006 - d.ZTI

Místo: Bučovice

Datum: 31.07.2015

Objednavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant: VPÚ Plzeň

Zhotovitel: BOSS montáže s.r.o. Bučovice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

D4 - 008: Trubní vedení

-1 459,40

Celkem bez DPH

-1 459,40

D4 - 008: Trubní vedení

-1 459,40

10	K	Pol45	Koleno z PP kanalizační KG - PPKGB, DN 150, úhel 45 °	kus	-3,150	60,00	-189,00
11	K	Pol46	Trubka z PP hrdlová kanalizační KG - SN 4 ML, DN 150, délka 2000 mm	kus	-1,050	200,00	-210,00
12	K	Pol47	Přesuvka z PP kanalizační KG - PPKGU, DN 150	kus	-2,100	64,00	-134,40
13	K	Pol48	Odbočka z PP kanalizační KG - PPKGEA, DN 200/150, úhel 45 °	kus	-1,050	220,00	-231,00
14	K	Pol49	D+M Utěsnění potrubí v chrániče 100/63 - např. DISA	kus	-2,000	310,00	-620,00
17	K	877353121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu - odbočné, DN	kus	-1,000	75,00	-75,00

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	ZL č. 10 - SO 006 (Klub útvaru) - podesta, kanalizace, poklop

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

BOSS montáže, s.r.o.	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Družstevní 184, 685 01 Bučovice	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>podesta</i>	2 492,53 Kč	4 965,50 Kč		7 458,03 Kč
<i>kanalizace</i>	22 094,00 Kč			22 094,00 Kč
<i>poklop</i>		2 977,00 Kč		2 977,00 Kč
				- Kč
				- Kč
Σ				32 529,03 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		32 529,03 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	6 831,10 Kč
Σ		39 360,13 Kč

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	ZL č. 10 - SO 006 (Klub útvaru) - podesta, kanalizace, poklop

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	2 158,03 Kč	4 965,50 Kč	- Kč	7 123,53 Kč
<i>specifikace</i>	334,50 Kč	- Kč	- Kč	334,50 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	2 492,53 Kč	4 965,50 Kč	- Kč	7 458,03 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		7 458,03 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	1 566,19 Kč
Σ		9 024,22 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka stavba objekt dodatek typ činnosti		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice) Plynofikace kasáren VÚ Bučovice ZL č. 10 - SO 006 (Klub útvaru) 2 (úprava podesty schodiště) HSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
13 (Hloubené vykopávky)						
1	139 71 1101 /00	Vykopávky v uzavřených prostorách v horninách 1 až 4 1 1,3*0,5	m3	0,650 0,650	1 274,50 Kč	828,43 Kč
Σ díl 13 (Hloubené vykopávky)						828,43 Kč
16 (Přemístění výkopku)						
2	161 10 1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m	m3	0,650	57,00 Kč	37,05 Kč
Σ díl 16 (Přemístění výkopku)						37,05 Kč
27 (Základy)						
3	271 53 1111 /00	Polštář základu z kameniva hrubého drceného frakce 16-63mm 1 1,3*0,3	m3	0,390 0,390	828,50 Kč	323,12 Kč
Σ díl 27 (Základy)						323,12 Kč
59 (Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných (předlažby))						
4	596 21 1110 /00	Položení zámkové dlažby pro pěši tl.60mm skupiny A v ploše do 50 m2	m2	1,300	200,00 Kč	260,00 Kč
5	592 45 0282	Dlažba zámková parketa 20x10x6	m2	1,500	223,00 Kč	334,50 Kč
Σ díl 59 (Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných (předlažby))						594,50 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						
6	965 04 2131 /00	Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10cm plochy do 4m2 1 1,3*1,0*0,15	m3	0,195 0,195	1 795,00 Kč	350,03 Kč
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						350,03 Kč
979 (Odvoz sutí)						
7	979 01 1111 /Z0	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	0,429	153,50 Kč	65,85 Kč
8	979 08 1121 /00	Odvoz sutí na skládku -příplatek za každý další 1km	t	0,429	9,90 Kč	4,26 Kč
9	979 08 1121 /Z0	Odvoz sutí na skládku za každý další 1km	t	6,864	9,90 Kč	67,95 Kč
10	979 08 2111 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	t	0,429	155,00 Kč	66,50 Kč
11	979 08 2121 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná -příplatek za každých dalších 5m	t	2,145	17,20 Kč	36,89 Kč
12	979 09 8113 /00	Poplatek za skládku (beton + příměs<10%)	t	0,429	275,00 Kč	117,98 Kč
Σ díl 979 (Odvoz sutí)						359,42 Kč
Σ						2 492,53 Kč
rekapitulace						
13	Hloubené vykopávky			828,43 Kč		
16	Přemístění výkopku			37,05 Kč		
27	Základy			323,12 Kč		
59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných (předlažby)			594,50 Kč		
96	Bourání a demontáž konstrukcí			350,03 Kč		
979	Odvoz sutí			359,42 Kč		
Σ				2 492,53 Kč		

VÝKAZ VÝMĚR

základka	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)
stavba	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
objekt	ZL č. 10 - SO 006 (Klub útvaru)
dodatek	2 (Přrava podesty schodiště)
typ činnosti	PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
721 (Vnitřní kanalizace)							
1	721 21 1407 /00	Vpust' dvorní DN 300	ks	1,000		4 965,50 Kč	4 965,50 Kč
Σ díl 721 (Vnitřní kanalizace)							4 965,50 Kč
Σ							4 965,50 Kč

rekapitulace

721	Vnitřní kanalizace	4 965,50 Kč
Σ		4 965,50 Kč

Vícepráce

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt: ZL č. 10 - 04 - SO 006 Klub útvaru

Část:
6.3 - SO 006 - d.ZTI
Kanalizace - venkovní napojení

Místo: Bučovice

Datum: 31.07.2015

Objednavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant: VPÚ Plzeň

Zhotovitel: BOSS montáže s.r.o. Bučovice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

D2 - 001: Zemní práce

14 781,00

	K		Rozebrání stáv. okap. chodníku 500x500-bet	m	7,000	100,00	700,00
	K		Ruční provedení výkopu hornina 4 do 100 m3	m3	5,000	1 570,00	7 850,00
2	K	133301109	Příplatek k cenám hloubení šachet za lepivost horniny - hornina 4	m3	5,000	196,00	980,00
	K		Odvoz zeminy na skládku do 5 km	m3	2,000	177,00	354,00
	K		Poplatek za skládku	m3	2,000	1 000,00	2 000,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,000	78,00	390,00
6	K	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopkách, se	m3	3,000	89,00	267,00
7	K	180401211	Založení trávníku - luční, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	85,00	595,00
8	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - souvislá plocha do 500	m2	7,000	29,00	203,00
			Oprava chodníku	m2	3,500	412,00	1 442,00

D3 - 004: Vodorovné konstrukce

1 123,50

9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	1,500	749,00	1 123,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D4 - 008: Trubní vedení

2 344,50

15	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 150	m	9,500	15,00	142,50
16	K	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu - jednoosé, DN 150	kus	10,000	70,00	700,00
			Koleno KG DN 100/45 st	kus	9,000	24,00	216,00
			Trubka KG DN 100/5000-SN 4	kus	1,000	263,00	263,00
			Trubka KG DN 100/1000-SN4	kus	3,000	71,00	213,00
			Přesuvka KG DN 100	kus	1,000	36,00	36,00
			Trubka KG DN 100/500-SN 4	kus	3,000	43,00	129,00
			Vsazení odbočky do stáv. potrubí DN 400	soubor	1,000	567,00	567,00
			Odbočka KG DN 100/100/100/45st	kua	1,000	78,00	78,00

D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce

3 845,00

			Demontáž stáv. sádkartonu příčky	m2	1,000	120,00	120,00
			Dodávka a montáž sádkartonové příčky	m2	1,500	650,00	975,00
			Vrtání otvoru přes stěnu pr 130 pln. zdívo	m	0,600	3 500,00	2 100,00
			Oprava izolace proti vlhkosti	m2	0,500	300,00	150,00
			Oprava malby 3 m2	sbr	1,000	500,00	500,00

Vícepráce celkem bez DPH

22 094,00

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	
		30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	ZL č. 10 - SO 006 (Klub útvaru) - poklop

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	- Kč	2 977,00 Kč	- Kč	2 977,00 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	- Kč	2 977,00 Kč	- Kč	2 977,00 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**CENA OBJEKTU**

<i>cena bez DPH</i>		2 977,00 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	625,17 Kč
Σ		3 602,17 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

<i>zakázka</i> <i>stavba</i> <i>objekt</i> <i>dodatek</i> <i>typ činnosti</i>		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice) Plynofikace kasáren VÚ Bučovice SO 006 (Klub útvaru) 1 (jimka) PSV					
<i>pořadí</i>	<i>číslo</i>	<i>popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena</i>	<i>celkem</i>
		767 (Kovové doplňkové konstrukce)					
1		D+ M ocelového rámu a poklopu na jimku 60x60cm	kompl.	1,000		2 977,00 Kč	2 977,00 Kč
		Σ díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)					2 977,00 Kč
		Σ					2 977,00 Kč
rekapitulace							
	767	Kovové doplňkové konstrukce				2 977,00 Kč	
	Σ					2 977,00 Kč	

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Skutečné provedení ZL č. 10 - SO 006 Úprava kanalizace pro odvod kondenzátu


Potvrzujeme tímto, že potrubí výtlačku kondenzátu je napojeno do stávající kanalizace, která je vedena v sádrokartonovém zákrytu v suterénu objektu.

Za provozní středisko VÚ Bučovice



p. Petr Diviš

V Bučovicích 30.9.2015

OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 11	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 06 Klub útvaru – úprava komínu				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 19.8.2015		
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒				
Odkazy:		Popis 		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Průduchy stávajícího komína jsou nad střechou zabetonovány; úpravu provedlo provozní středisko ve všech objektech, které komíny nepoužívaly, aby nedocházelo k degradaci objektů zatékáním skrz komíny. Komínové průduchy jsou zaplněné suti. <u>Projektové řešení</u> PD uvažovala stávající využití komínů, protože nebylo patrné, že jsou komínové hlavy zabetonované a proto bylo navrženo odvětrání a přívod vzduchu do místnosti kotelný stávajícím komínovým tělesem. <u>Navrhované řešení</u> Hlava komínového tělesa nad plochou střechou objektu SO 06 se musí odbourat kvůli zjištění stavu průduchů, jejich vyčištění a zprůchodnění některého (nejméně zasypaného) průduchu. Provede se vyložkování komína pro odvod spalin od kotle – je součástí PD, a znovu se vybetonuje komínová hlava.				
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Oznámení vydává: zhotovitel				
Provedení této opravy je nutné z důvodu dodržení projektu – napojení vzduchotechniky a umožnění odvětrání místnosti kotelný.  BOSS montáže, s.r.o.				

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Pro zdárné dokončení díla je práce nutné provést. S jejich rozsahem souhlasím.


Jméno: Ing. Karel Hróz


.....
SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Zaslepení komínových průduchů betonovými hlavami nikdo neavizoval a z obhlídky místa při zpracovávání PD nebylo možné zjistit, že komíny jsou nefunkční. S navrženým řešením souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:


Souhlasím s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


.....
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o:
vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení / jiné okolnosti.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 06 Klub útvaru – úprava komínu			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:	Oznámení změny č. 11		
	Fotodokumentace skutečného provedení		
	Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Průduchy stávajícího komína jsou nad střechou zabetonovány; úpravu provedlo provozní středisko ve všech objektech, které komíny nepoužívaly, aby nedocházelo k degradaci objektů zatékáním skrz komíny. Komínové průduchy jsou zaplněné suti. <u>Projektové řešení</u> PD uvažovala stávající využití komínů, protože nebylo patrné, že jsou komínové hlavy zabetonované a proto bylo navrženo odvětrání a přívod vzduchu do místnosti kotelný stávajícím komínovým tělesem. <u>Navrhované řešení</u> Hlava komínového tělesa nad plochou střechou objektu SO 06 se musí odbourat kvůli zjištění stavu průduchů, jejich vyčištění a zprůchodnění některého (nejméně zasypaného) průduchu. Provede se vyložkování komína pro odvod spalin od kotle – je součástí PD, a znovu se vybetonuje komínová hlava.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :


- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 1.350,00 Kč

Cena změny + 3.650,85 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 2.300,85 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015



Méněpráce

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt: 04 - SO 006 Klub útvaru

Část: 6.1 - SO 006 - a. stavební

Místo: Bučovice

Datum: 31.07.2015

Objednavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant: VPÚ Plzeň

Zhotovitel: BOSS montáže s.r.o. Bučovice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

D8 - 009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 350,00

84	K	541712190	komínová zděř 120	ks	2,000	-112,50	-225,00
85	K	953941421	Osazení komínových dvířek	ks	2,000	-187,50	-375,00
86	K	553475590	dvířka komínová plechová	ks	2,000	-375,00	-750,00

ZAKÁZKA

Označení	297
Popis	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

Stavba	ZL č. 11 - SO 06 Klub útvaru - úprava komínu
Objekt	SO 006 Klub útvaru

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	3 650,85 Kč	- Kč	- Kč	3 650,85 Kč
specifikace	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	3 650,85 Kč	- Kč	- Kč	3 650,85 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH			3 650,85 Kč
DPH	21% ze základu	3 650,85 Kč	766,68 Kč
Σ			4 417,53 Kč

VÝKAZ VÝMĚR


zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 11 - SO 06 Klub útvaru - úprava komínu				
objekt		SO 006 Klub útvaru				
typ činností		HSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
31 (Zdi podpěrné a volné)						
1	314 23 1125 /00	Zdivo komínů volných z cihel dl. 290mm pálených plných líčovka P25 SMS 2,5MPa	m3	0,169	5 857,00 Kč	989,83 Kč
		1,5*0,45*0,25		0,169		
2	316 38 1117_00	Komínové krycí desky z betonu C12/15(B15) až C16/20(B20) o tloušťce do 12cm s přesahem	m2	0,675	706,50 Kč	476,89 Kč
		1,5*0,45		0,675		
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné)						1 466,72 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						
5	962 03 2631 /00	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel, malta MV/MVC	m3	0,185	423,00 Kč	78,26 Kč
		1,5*0,45*0,25*1,1		0,185		
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						78,26 Kč
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						
6	976 04 7331_00	Vybourání krycí desky betonové z prostého nebo železového betonu na zdivu tl. nad 10cm	m	3,900	130,50 Kč	508,95 Kč
		1,5+0,45*2		3,900		
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						508,95 Kč
979 (Odvoz sutí)						
7	979 01 1111 /Z0	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	1,582	153,50 Kč	242,82 Kč
8	979 08 1121 /00	Odvoz sutí na skládku -příplatek za každý další 1km	t	1,582	9,90 Kč	15,66 Kč
9	979 08 1121 /Z0	Odvoz sutí na skládku za každý další 1km	t	25,310	9,90 Kč	250,57 Kč
10	979 08 2111 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	t	1,582	155,00 Kč	245,19 Kč
11	979 08 2121 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná -příplatek za každých dalších 5m	t	7,909	17,20 Kč	136,04 Kč
12	979 09 8113 /00	Poplatek za skládku (beton + příměs<10%)	t	1,582	275,00 Kč	435,02 Kč
Σ díl 979 (Odvoz sutí)						1 325,31 Kč
99 (Přesun hmot)						
13	998 01 2025 /00	Přesun hmot	t	0,525	517,50 Kč	271,62 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)						271,62 Kč
Σ						3 650,85 Kč
rekapitulace						
31	Zdi podpěrné a volné			1 466,72 Kč		
96	Bourání a demontáž konstrukcí			78,26 Kč		
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot			508,95 Kč		
979	Odvoz sutí			1 325,31 Kč		
99	Přesun hmot			271,62 Kč		
Σ				3 650,85 Kč		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 12	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 07 Provozní objekt – stavební část – vstupní dveře			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
	Výkresová dokumentace		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Ve vchodu do stávající místnosti (budoucí kotelny) jsou osazeny dřevěné interiérové dveře, které jsou značně poškozené a rozpadlé.			
<u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace neřeší výměnu vstupních dveří, pouze rekonstrukci vnitřních prostor.			
<u>Navrhované řešení</u> Realizace dodávky a montáže nových vstupních plastových dveří včetně zárubně (vchod do kotelny).			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: zhotovitel Z důvodu zabezpečení a zajištění ochrany technologického zařízení kotelny je nutno osadit vchodové venkovní dveře.  BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Stávající dveře jsou zcela zdevastované a jejich případná repase není možná. Proto je nutno tento otvor osadit novými dveřmi. S navrženými pracemi souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:


PD neřešila výměnu dveří. Dveře jsou součástí stavebního objektu, vzhledem k jejich dezolátnímu stavu je nutno je vyměnit. S návrhem změny souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změna rozsahu položky / změna řešení.






č.m.	místnost	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	plocha
P1	UMÍSTĚNÍ PLYN. KOTLO náhrn+samoniv. ocm. vyrovnáv. stěrka 20mm+ disperzní pro srdění obzmu a zajištění bezpečnosti	stávající ocm. potěr náhrn+samoniv. ocm. vyrovnáv. stěrka 20mm+ disperzní pro srdění obzmu a zajištění bezpečnosti	štuk. omítka náhrn - oprava stávající štuk. omítky z 50%, zejména u podlahy	štuk. om. stávající v. 2,82m náhrn - oprava stávající štuk. omítky z 50%, včetně prostupů pro odhazy	10,55m ²
P2	UHŮVÁRNA				
P3	GARÁŽE A DÍLNY		saradní omítky za radiátory		

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVŘZENÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ A ŽEBŘÍKŮ
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	NAVŘZENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO CIHELNÉ
	ZASYPÁNÍ PROHLUBNÉ INERTNÍM HUTNITELNÝM MATERIÁLEM(LUXEK, ŠTERK A POD), ZHUTNĚNÍ A PŘEBETONOVÁNÍ PODKL. BETONEM A BET. MAZ. DO ÚROVNĚ STÁV. PODL.
	OBRYS - NOVÝ STAV
	stávající zakryt kanálů oc. rýh, plechem- demontovat včetně lemov. úhelníků
	ROZSAH BOURÁNÉ PODKLAD. BET. A VÝKOP PRO PROVEDENÍ NAVŘZENÉ PŘÍPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI


WERE HEISOU

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 12	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 07 Provozní objekt – stavební část			
– vstupní dveře			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 12	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Výkres	
		Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Ve vchodu do stávající místnosti (budoucí kotelny) jsou osazeny dřevěné interiérové dveře, které jsou značně poškozené a rozpadlé.			
<u>Projektové řešení</u>			
Projektová dokumentace neřeší výměnu vstupních dveří, pouze rekonstrukci vnitřních prostor.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Realizace dodávky a montáže nových vstupních plastových dveří včetně zárubně (vchod do kotelny).			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Pavel Omelka		 BOSS montáže, s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Karel Hróz		 SAFETY PRO, s.r.o.	
Autorský dozor projektanta stavby			
Jméno: Ing. Jiří Babor		 Jiří Babor	

Investor:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Půdorys NP objektu SO 07
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 2.391,00 Kč


Cena změny + 6.683,94 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 4.292,94 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 27. 11. 2015



Změnový list č. 12 - fotodokumentace

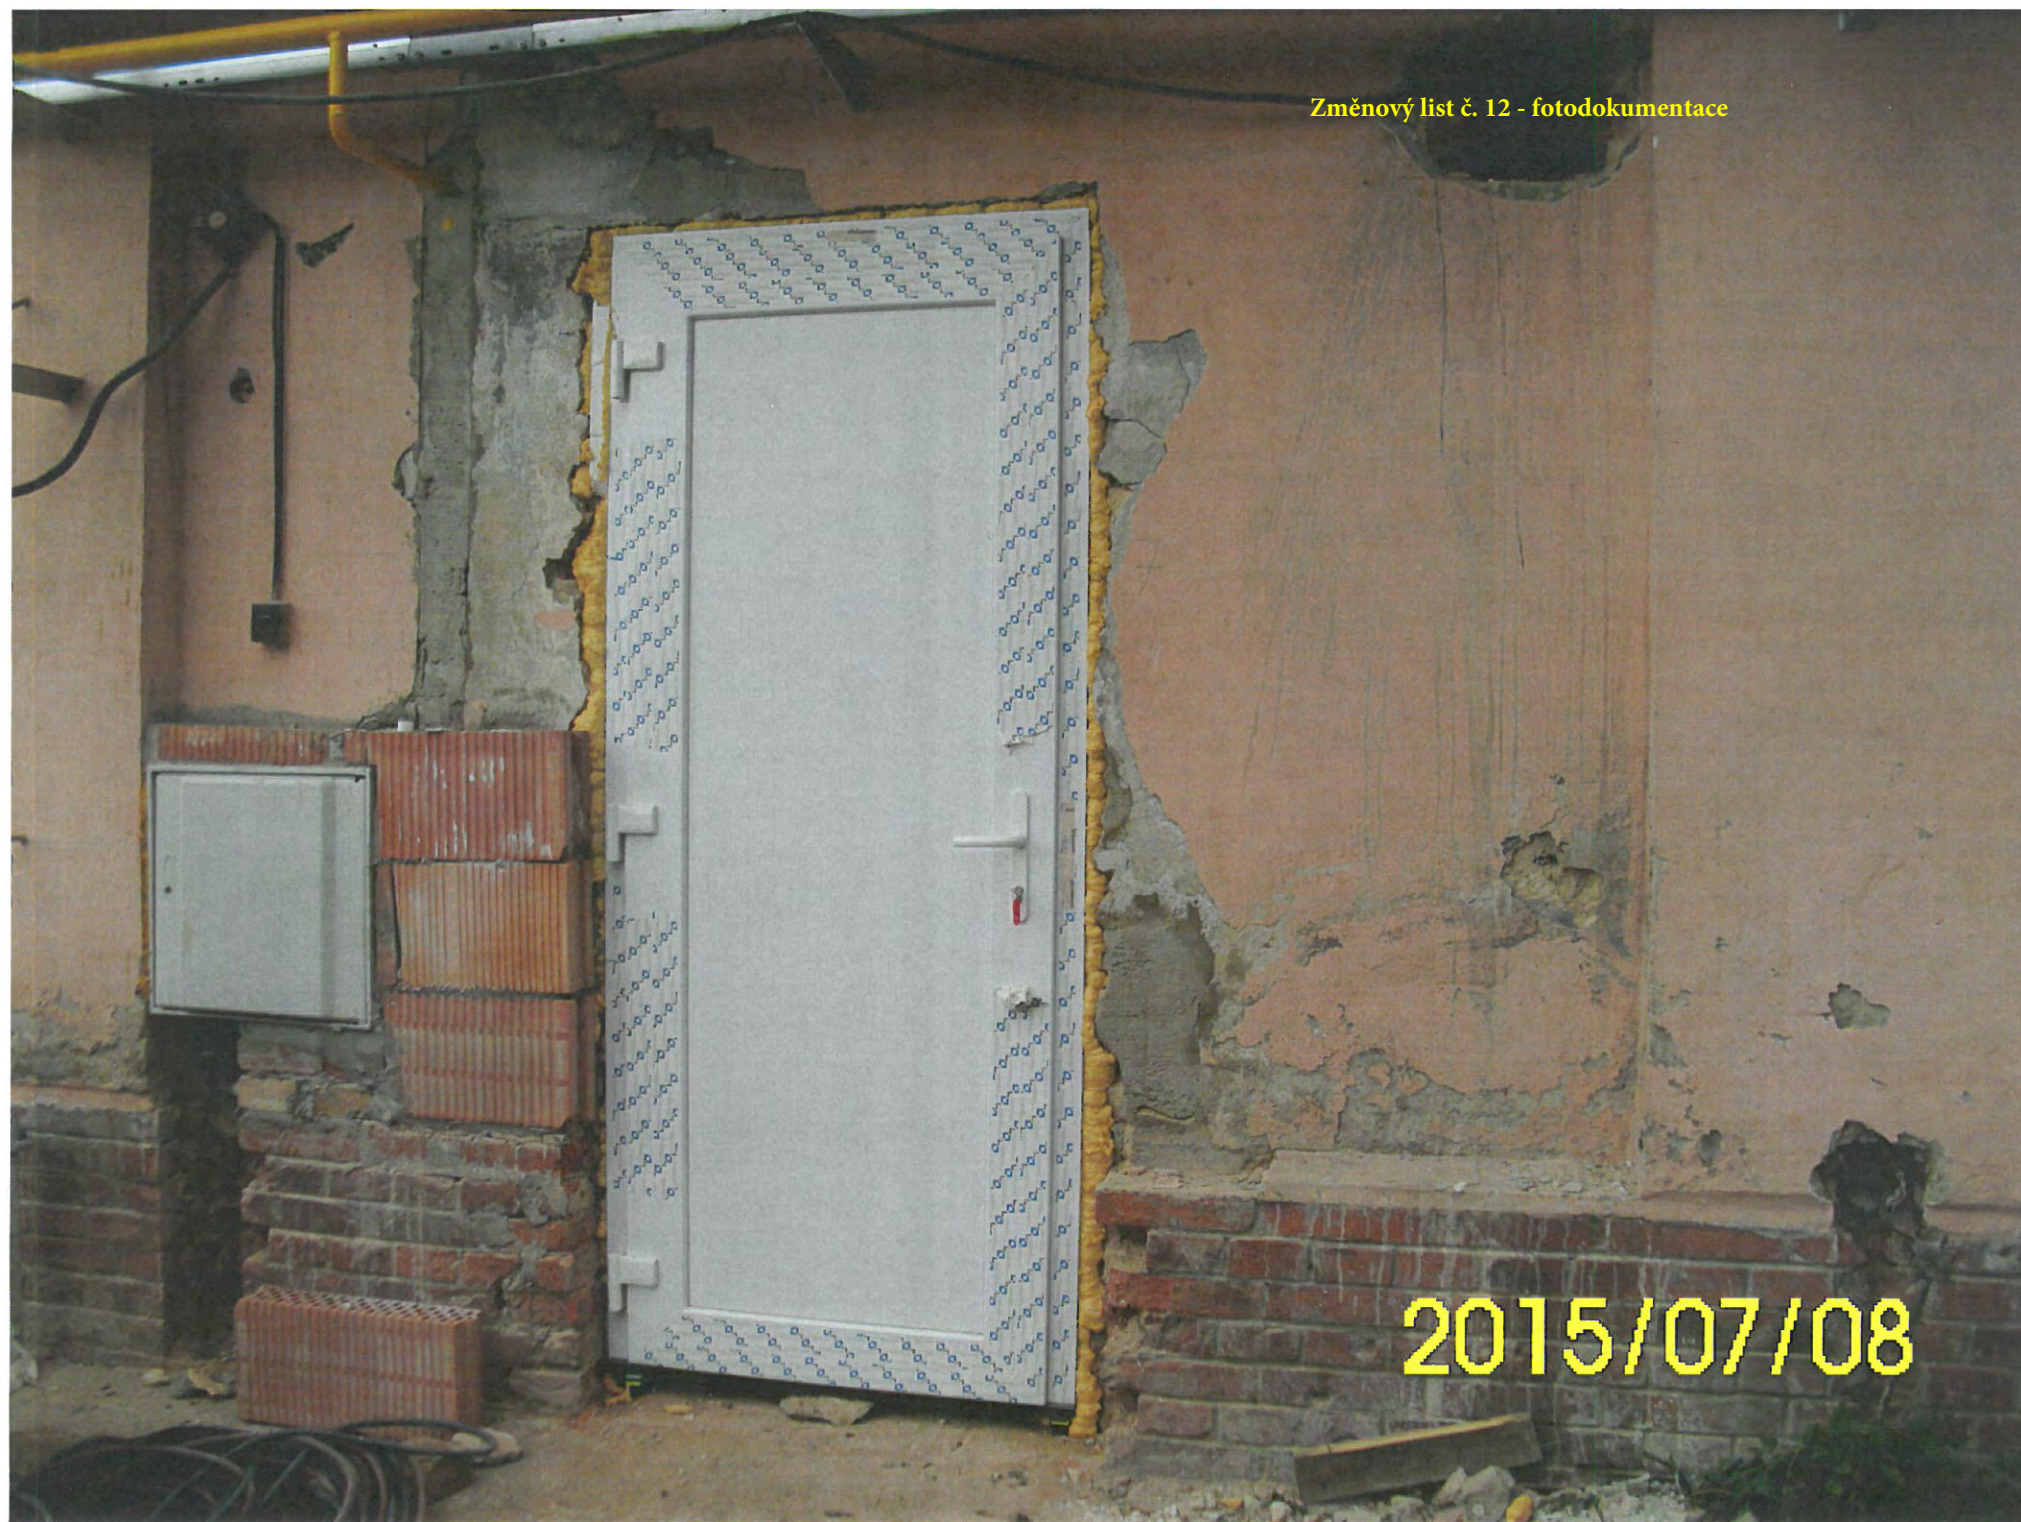

Měněpráce

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt: 04 - SO 007 Provozní objekt

Část: 7.1. - SO 007 - a. stavební část

Místo: Bučovice

Datum: 31.07.2015

Objednavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant: VPÚ Plzeň

Zhotovitel: BOSS montáže s.r.o. Bučovice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

D12 - 766: Dveře

2.391,-

Celkem bez DPH

2.391,-

D12 - 766: Dveře

101	K	766660001	Montáž vnitřních dveří do ocelové zárubně do 800 mm	ks	1	375	375
102	K	766661912	Oprava dveřních křídel s výměnou kování	ks	1	375	375
103	K	Pol310	kování dveří zámek dozický	ks	1	375	375
104	K	766663916	Seřízení dveřních křídel	ks	1	375	375
105	K	766663920	Přihoblování dveř křídla po obvodu	m	4,74	187,5	888,8
106	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu do 6 m	ř	0,002	1 125,00	2,25
Celkem bez DPH							2391

30.9.2015

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	
		30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 12 - SO 07 Provozní objekt - stavební část - vstupní dveře
<i>Objekt</i>	SO 07 Provozní objekt

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Družstevní 184, 685 01 Bučovice	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ODBĚRATEL**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	3 276,32 Kč	782,63 Kč	- Kč	4 058,94 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	2 625,00 Kč	- Kč	2 625,00 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	3 276,32 Kč	3 407,63 Kč	- Kč	6 683,94 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		6 683,94 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	688,03 Kč
Σ		7 371,97 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 12 - SO 07 Provozní objekt - stavební část - vstupní dveře				
objekt		SO 07 Provozní objekt				
typ činnosti		HSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
31 (Zdi podpěrné a volné)						
1	317 94 4311 /00	Dodatečně osazované nosníky válcované do připravených otvorů do č 12	t	0,055	24 928,00 Kč	1 369,67 Kč
		1 3*1,5*11,1*1,1*0,001		0,055		
Σ díl 31 (Zdi podpěrné a volné)						1 369,67 Kč
						2 739,34 Kč
61 (Úprava povrchů vnitřní)						
2	612 40 9991 /00	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah apod. po opravách	m	5,100	37,50 Kč	191,25 Kč
3	612 42 5931 /00	Omítka vnitřního ostění oken a dveří vápenná štuková	m2	1,530	337,50 Kč	516,38 Kč
		0 (2,15*2+0,8)*0,3		1,530		
Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)						707,63 Kč
62 (Úprava povrchů vnější)						
4	620 41 1125 /00	Nátěr vnějších omítek EPOXYESTEROvou barvou z postaveného lešení	m2	2,550	131,25 Kč	334,69 Kč
5	620 47 1811 /00	Nátěr základní penetrační silikon Baumit	m2	2,550	18,75 Kč	47,81 Kč
6	620 99 1121 /00	Zakrývání výplní vnějších otvorů, zábradlí, oplechování apod. z lešení	m2	1,600	56,25 Kč	90,00 Kč
7	622 42 3121 /00	Oprava fasád vápenných stupně členitosti III štukových do 10% opr. plochy	m2	2,550	55,00 Kč	140,25 Kč
		1 5,1*0,5		2,550		
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)						612,75 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						
8	967 03 1734 /00	Přisekání plošné, zdiva cihelného malta MV nebo MVC do tl. 30cm	m2	0,600	276,50 Kč	165,90 Kč
9	968 06 1125 /00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří plochy do 2m2	ks	1,000	18,75 Kč	18,75 Kč
10	968 07 2455 /00	Vybourání zárubní dveřních kovových plochy do 2m2	m2	1,600	187,50 Kč	300,00 Kč
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						484,65 Kč
99 (Přesun hmot)						
11	998 01 1001 /00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 6 m	t	0,542	187,50 Kč	101,63 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)						101,63 Kč
Σ						3 276,32 Kč
rekapitulace						
31		Zdi podpěrné a volné			1 369,67 Kč	
61		Úprava povrchů vnitřní			707,63 Kč	
62		Úprava povrchů vnější			612,75 Kč	
96		Bourání a demontáž konstrukcí			484,65 Kč	
99		Přesun hmot			101,63 Kč	
Σ					3 276,32 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 12 - SO 07 Provozní objekt - stavební část - vstupní dveře				
objekt		SO 07 Provozní objekt				
typ činnosti		PSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena	celkem
				jednotka		
769 (Otvorové prvky z plastu)						
1	76660411	Montáž plast.vchodových dveří vč rámu jednokř bez nadsvětliku do zdiva	ks	1,000	750,00	750,00
2	D1/L	dveře vchodové plastové .jednokř. plné s tepel izol. 800/1970 , zámek s bezp vložkou	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
3	998766101	přesun hmot v obj. 6 m	t	0,029	1 125,00	32,63
Σ díl 769 (Otvorové prvky z plastu)						3 407,63 Kč
Σ						3 407,63 Kč
rekapitulace						
769	Otvorové prvky z plastu				3 407,63 Kč	
Σ					3 407,63 Kč	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 13

Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Předmět změny: SO 07 Provozní objekt – stavební část
– omítky

Zhotovitel: BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 2.6.2015

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy:

Popis

Fotodokumentace stávajícího stavu

Výkresová dokumentace

Popis stávajícího stavu

Po demontáži stávajících otopných registrů v místnostech garáží jsou v několika místech vnitřní omítky opadané a narušené. Ve stávajícím zdivu je zvýšená vlhkost, která způsobuje degradaci vnitřních omítek.

Projektové řešení

Projektová dokumentace řeší opravy vnitřních omítek pouze v místnosti nové kotelny a oprava omítek v místnostech garáží nebyla řešena.


Navrhované řešení

Navrhujeme provedení otlučení a vyčištění spár stávajícího zdiva a provedení nových štukových omítek v místech, kde nebyla zvýšená vlhkost. V místech zvýšené vlhkosti navrhujeme provedení sanačních omítek.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **zhotovitel**

Realizací sanačních opatření (omítek) dojde k zamezení pronikání vlhkosti a nebude docházet k další degradaci obvodového zdiva.


BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

V rámci rekonstrukce bude nejvhodnější provést tyto práce. V případě budoucího provádění omítek by vznikly zbytečné vícenáklady na demontáž a zpětnou montáž otopné soustavy.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Sanace stavebních konstrukcí mimo prostor zdroje nebyla předmětem zadání. Úprava omítek je nutná. Souhlasím s navrženými změnami.


Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změna rozsahu položky / změna řešení.


Oznámení změny č. 13 - fotodokumentace




Oznámení změny č. 13 - fotodokumentace



LOKALNI OPERAY OSHTEY

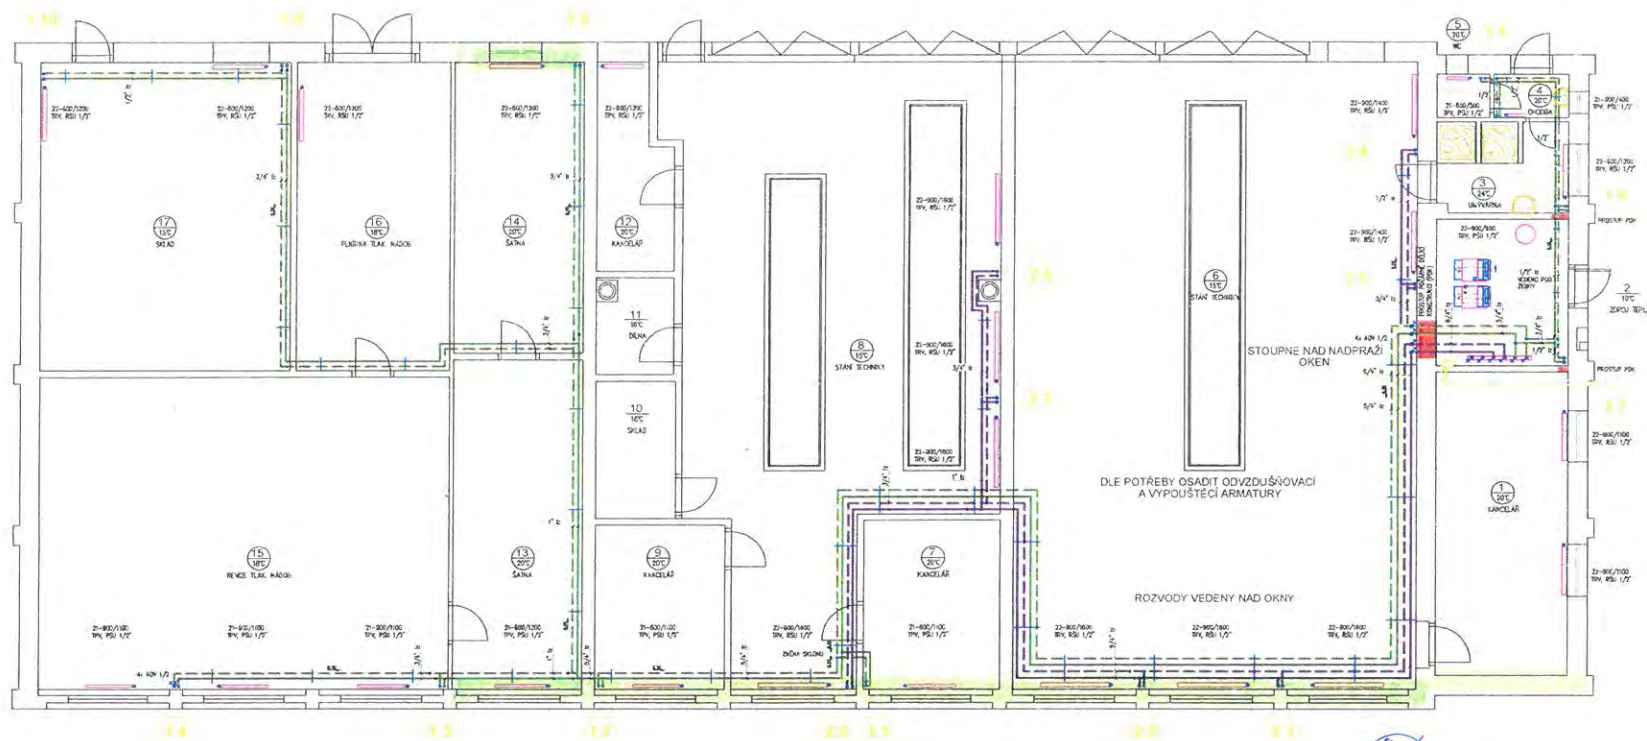

VÝKONOVÁ	PROJEKTANT	KONTROLNÍ	PSH
Ing. J. Šubr	Ing. J. Baber		
Obj. KAPPA	Stavba		
Zpracování	Ambas Group s.p.a. - Projektová činnost		
FALT	Zpracování projektové dokumentace PLYNOFKACE KASAREN JIRINO Z PODEBRAD VU BUČOVICE		
DŘAN	S0 607 Provozní objekt		

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 13	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 07 Provozní objekt – stavební část			
– omítky			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: Oznámení změny č. 13		
	na rozpočtové podklady: Fotodokumentace skutečného provedení		
	Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Po demontáži stávajících otopných registrů v místnostech garáží jsou v několika místech vnitřní omítky opadané a narušené. Ve stávajícím zdivu je zvýšená vlhkost, která způsobuje degradaci vnitřních omítek.			
<u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace řeší opravy vnitřních omítek pouze v místnosti nové kotelny a oprava omítek v místnostech garáží nebyla řešena.			
<u>Navrhované řešení</u> Navrhujeme provedení otlučení a vyčištění spár stávajícího zdiva a provedení nových štukových omítek v místech, kde nebyla zvýšená vlhkost. V místech zvýšené vlhkosti navrhujeme provedení sanačních omítek.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jiří Babor  Jiří Babor			

Investor:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa


.....
Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Půdorys NP objektu SO 07
- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... -----


Cena změny + 12.321,75 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 12.321,75 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



27. 11. 2015

Datum:

Změnový list č. 13 - fotodokumentace

2015/07/29

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 13 - SO 07 Provozní objekt - stavební část -
<i>Objekt</i>	SO 07 Provozní objekt

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Armádní servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	11 310,41 Kč	1 011,34 Kč	- Kč	12 321,75 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	11 310,41 Kč	1 011,34 Kč	- Kč	12 321,75 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		12 321,75 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	2 587,57 Kč
Σ		14 909,31 Kč

Změnový list č. 13 - rozpočet /str.2/

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 13 - SO 07 Provozní objekt - stavební část - omítky				
objekt		SO 07 Provozní objekt				
typ činnosti		HSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
61 (Úprava povrchů vnitřní)						
1	612 40 1391 /00	Oprava malých ploch omítek vnitřních stěn do plochy 1m2	ks	14,000	195,00 Kč	2 730,00 Kč
2	612 40 3399 /00	Zaplnění rýh ve stěnách maltou (hrubá výplň)	m2	6,505	179,00 Kč	1 164,40 Kč
		1 3,5*0,3+2,85*0,3+3,6*0,2+2*0,1+3,1*0,8+3,0*0,4		6,505		
3	612 40 9991 /00	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah apod. po opravách	m	6,000	37,50 Kč	225,00 Kč
		1 2,65+3,35		6,000		
4	612 47 6112 /00	Postřik sanační na zdivo Otavit 305 tl. 5mm	m2	12,570	37,50 Kč	471,38 Kč
		1 2,65*1,3+3,0*1,1+2,85*1,3+2,65*0,8		12,570		
5	612 47 6612 /00	Sanační omítka štuková Otavit 310,312 tl. 22mm	m2	12,570	412,50 Kč	5 185,13 Kč
Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)						9 775,90 Kč
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						
7	978 01 3161 /00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 50%	m2	16,553	56,25 Kč	931,11 Kč
		1 2,65*1,3+3,0*1,1+2,85*1,3+2,65*0,8+2,95*1,35		16,553		
8	978 02 3411 /00	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínové	m2	16,553	36,00 Kč	595,91 Kč
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)						1 527,01 Kč
979 (Odvoz sutí)						
9	979 08 2111 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 50m	t	0,050	150,00 Kč	7,50 Kč
Σ díl 979 (Odvoz sutí)						7,50 Kč
Σ						11 310,41 Kč

rekapitulace

61	Úprava povrchů vnitřní	9 775,90 Kč
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot	1 527,01 Kč
979	Odvoz sutí	7,50 Kč
Σ		11 310,41 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 14	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 12 Sklad materiálu – omítky, obklady, podhled			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání poštu ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající obklady a dlažba jsou poškozené v daleko větším měřítku, než předpokládala projektová dokumentace. Vlivem špatného podkladu opadávají stávající obklady, akulitový podhled je v havarijním stavu.			
<u>Projektové řešení</u> Proveďte se skopání keramických obkladů v místn. P1 a porušených omítek stěn. Předpokládá se provedení z 50 %. Stávající pohled z akulitových desek se v místn. P1 demontuje vč. podkonstrukce, proveďte se nový podhled z SDK desek s požární odolností dle zprávy PBŘ /REW 15 DP3/, zavěšený na nosné k.ce stávajícího stropu. Zavěšení bude upřesněno po obnažení stropní k.ce.			
<u>Navrhované řešení</u> Místnosti P1, P2, kterých se týkaly stavební úpravy, byly původně průchozí a stavební úpravy se týkaly obou místností. Oprava obkladů není možná, protože stávající druh, rozměry obkladů i dlaždic se již nevyrábí. Akulitový podhled i dřevěná konstrukce, na které je připevněn, se vlivem vlhkosti rozpadá a napojení není možné. Je potřeba vyměnit obklady v celé ploše (zůstalo by cca 15-20% původních obkladů). Dlažba je popraskaná, místy dlaždice chybí. Navrhujeme v místnosti P2 provedení nových obkladů, dlažby a podhledu jako u P1.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Zhotovitel provede keramické obklady, dlažbu a sádkokarton v místnosti P2 dle výše uvedeného textu a na základě odsouhlasené výměry.			



BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Akulitový podhled, obklady i dlažba jsou v havarijním stavu. Obklady odpadávají, dlažba je nevyhovující do těchto prostor (kluzká). Napojení jak bylo uváděno v PD není možné. S navrženými pracemi souhlasím a doporučuji je provést.

Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Požadavek investora byl na minimalizaci nákladů, proto se navrhovaly výměny obkladů pouze lokálně. Rozsah byl určen opravou do cca 50%. Stav nosné konstrukce nebyl prověřován, bylo uvažováno pouze s výměnou podhledu. S úpravami souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Prohlídkou místa v průběhu realizace byla skutečnost konstatována i na místě a objednatel souhlasí s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

ZL č. 14

SO 012 - obklady - stávající stav



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 14	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 12 Sklad materiálu – omítky, obklady, podhled			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 14	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
		Výkresová část	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající obklady a dlažba jsou poškozené v daleko větším měřítku, než předpokládala projektová dokumentace. Vlivem špatného podkladu opadávají stávající obklady, akulitový podhled je v havarijním stavu. <u>Projektové řešení</u> Provede se skopání keramických obkladů v místnosti P1 a porušených omítek stěn. Předpokládá se provedení z 50 %. Stávající pohled z akulitových desek se v místnosti P1 demontuje vč. podkonstrukce, provede se nový podhled z SDK desek s požární odolností dle zprávy PBR /REW 15 DP3/, zavěšený na nosné k.ce stávajícího stropu. Zavěšení bude upřesněno po obnažení stropní k.ce. <u>Navrhované řešení</u> Místnosti P1, P2, kterých se týkaly stavební úpravy, byly původně průchozí a stavební úpravy se týkaly obou místností. Oprava obkladů není možná, protože stávající druh, rozměry obkladů i dlaždic se již nevyrábí. Akulitový podhled i dřevěná konstrukce, na které je připevněn, se vlivem vlhkosti rozpadá a napojení není možné. Je potřeba vyměnit obklady v celé ploše (zůstalo by cca 15-20% původních obkladů). Dlažba je popraskaná, místy dlaždice chybí. Navrhujeme v místnosti P2 provedení nových obkladů, dlažby a podhledu jako u P1.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.**Autorský dozor projektanta stavby**

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**


- Položkový rozpočet
- Půdorys s vyznačením dotčených částí

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) viz. jednotkové ceny rozpočtu

Cena změny + 18.079,71 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 18.079,71 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015

50 12 oklady

Změnový list č. 14 - fotodokumentace

č. 14





ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	
		30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
<i>Objekt</i>	SO 012 (Sklad materiálu) omítky, obklady

DODAVATEL**ODBĚRATEL**


BOSS montáže, s.r.o.	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Družstevní 184, 685 01 Bučovice	Podbabská 1589/1, Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	<i>Σ</i>
<i>stavební práce</i>	3 334,05 Kč	9 461,83 Kč	- Kč	12 795,88 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	5 283,83 Kč	- Kč	5 283,83 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	3 334,05 Kč	14 745,66 Kč	- Kč	18 079,71 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		18 079,71 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	3 796,74 Kč
Σ		21 876,45 Kč

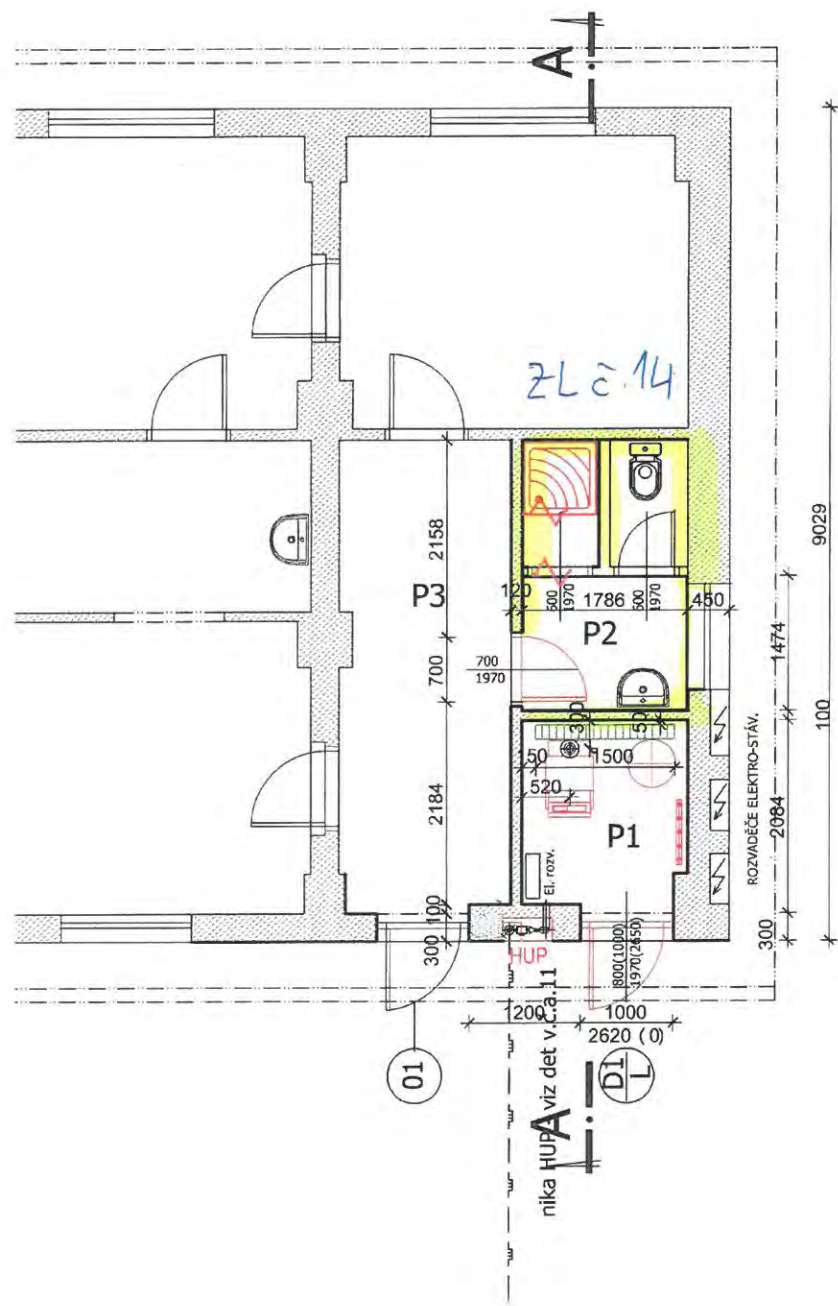

legenda místností- OBJ.12

č.m.	místnost	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	plocha
P1	UMÍSTĚNÍ PL. KOTLŮ	ker. dlažba	štuk. omítka, ker. sokl 150mm	SDK s PO REW 15 DP3,v.2.65m	3,6 m2
P2	UMÝVÁRNA	ker. dlažba	K.O. v 2,1m	STÁVAJÍCÍ -AKULIT,v.2.65m	5,3 m2
P3	CHODBA	ker. dlažba	štuk. omítka	STÁVAJÍCÍ -AKULIT,v.2.65m	9,4 m2

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE- NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ DĚLICÍ PŘÍČKY, SNÍŽENÉ, VÝŠKY 2,1m
- NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE Ú.T. - plyn. kotel , rozdělovače, ohřev TUV
- PROSTUP STROPEM, KROVEM A STŘEŠNÍM PROSTOREM PRO ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPAL. VZDUCHU KOTLE - VIZ DETAIL DOKUMENTACE Ú.T. CHRÁNIČKA S POŽ. IZOLACÍ REW 15 DP3

SO 012 Sklad materiálu
a.4 - Půdorys - nový stav

1 : 50

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 15

Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Předmět změny: SO 18 Sklad – stavební část
– přesun oplocení, podlaha v kotelně

Zhotovitel: BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 2.6.2015

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy:

Popis

Fotodokumentace stávajícího stavu

Popis stávajícího stavu

- 1) Stávající oplocení je ukončeno na rohu objektu SO 18. Kiosek HUP je umístěn na štítové stěně objektu SO 18 a je přístupný pouze přes střežený prostor autoparku.
- 2) Stávající podlaha v místnosti nové kotelny je propadlá, betonová podlaha je křivá a beton je zvětralý a rozpraskaný.

Projektové řešení

- 1) PD neřeší přístup k HUP od kotelny SO 18.
- 2) Beton ve stávající výměňkové stanici měl být zachován pro podlahu nové kotelny.


Navrhované řešení

- 1) Prodloužení oplocení autoparku za HUP – montáž ocelových sloupků a strojního pletiva, demontáž části stávajícího oplocení.
- 2) Vybourání a provedení nové podlahy v místnosti nové kotelny – mazanina + potěr.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **zhotovitel**

- 1) Přístup k HUP je nutno zajistit pro obsluhu kotelny co nejkratší, aby v případě nutnosti bylo možné co nejrychleji zajistit uzavření plynu pro kotelnu. Servis zařízení HUP a kotelny nebude vstupovat do střeženého prostoru autoparku.
- 2) Stávající podlaha je pro novou plynovou kotelnu nepoužitelná, jsou nutné navržené bourací a stavební práce.



BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Přístup k HUP musí být umožněn mimo autopark, který tvoří samostatnou střeženou část kasáren.

Stavební úpravy stávající podlahy jsou nezbytné pro její nerovnosti a zvětralý beton. S navrženými pracemi souhlasím a doporučuji je provést.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Požadavek na úpravu plotu nebyl v době zpracování PD schválen investorem.

Z důvodu snazšího přístupu obsluhy k HUP je nutné plot přesunout.

V PD bylo uvažováno se zásypem jímky, novou podlahou nad jímkou a stěrkou v celé ploše prostoru. Při realizaci díla byl zjištěn havarijní stav skrytých částí podlahové konstrukce.

Souhlasím s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.


Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změna rozsahu položky / změna řešení.

OZ č. 15

Priloha k rozpočtu stavební vícepráce SO 018 - oplocení

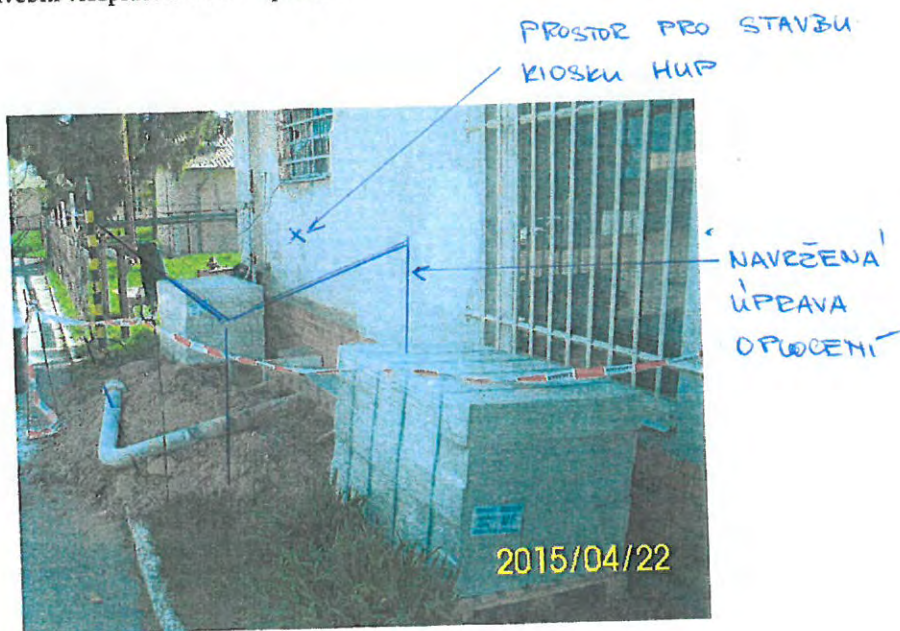

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 15	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 18 Sklad – stavební část – přesun oplocení, podlaha v kotelně			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 15	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Výkres	
		Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
1) Stávající oplocení je ukončeno na rohu objektu SO 18. Kiosek HUP je umístěn na štítové stěně objektu SO 18 a je přístupný pouze přes střežený prostor autoparku. 2) Stávající podlaha v místnosti nové kotelny je propadlá, betonová podlaha je křivá a beton je zvětralý a rozpraskaný.			
<u>Projektové řešení</u>			
1) PD neřeší přístup k HUP od kotelny SO 18. 2) Beton ve stávající výměňkové stanici měl být zachován pro podlahu nové kotelny.			
<u>Navrhované řešení</u>			
1) Prodloužení oplocení autoparku za HUP – montáž ocelových sloupků a strojního pletiva, demontáž části stávajícího oplocení. 2) Vybourání a provedení nové podlahy v místnosti nové kotelny – mazanina + potěr.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Pavel Omelka		 BOSS montáže, s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Karel Hróz		 SAFETY PRO, s.r.o.	

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :


- dle textu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... ----

Cena změny + 12.511,13 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 12.511,13 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015

SO 018

ZLč. 15
- skutečné provedení



STAV. STAV



2015/05/05

NOVÁ PODLAHA



2015/05/12



ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	
		30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 15 SO 18 Sklad - stavební část - přesun oplocení, podlaha v kotelně
<i>Objekt</i>	SO 018 Sklad

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	9 939,88 Kč	1 800,90 Kč	- Kč	11 740,78 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	770,35 Kč	- Kč	770,35 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	9 939,88 Kč	2 571,25 Kč	- Kč	12 511,13 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		12 511,13 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	2 627,34 Kč
Σ		15 138,46 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		ZL č. 15 SO 18 Sklad - stavební část - přesun oplocení, podlaha v kotelně					
objekt		SO 018 Sklad					
typ činnosti		HSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
Přesun oplocení							
1 (Zemní práce)							
1	460 30 0101 /00	Vrtání jámy	ks	3,000	222,00 Kč		666,00 Kč
Σ díl 1 (Zemní práce)							666,00 Kč
27 (Základy)							
2	275 31 3611 /00	Beton základových patek prostý C16/20(B20)	m3	0,054	2 069,50 Kč		111,75 Kč
	1	0,8*0,15*0,15*3		0,054			
Σ díl 27 (Základy)							111,75 Kč
Podlaha v kotelně							
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							
3	631 31 1125 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C16/20(B20) tl. do 12cm	m3	1,059	2 625,00 Kč		2 779,88 Kč
	1	(3,15*4,6-1,5*2,6)*0,1		1,059			
4	631 31 1135 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C16/20(B20) tl. do 24cm	m3	1,589	1 875,00 Kč		2 978,44 Kč
	1	10,59*0,15		1,589			
5	631 31 9153 /00	Příplatek za přehlazení ocelovým hladítkem pod povlaky mazaninou tl. do 12cm	m3	1,059	187,50 Kč		198,56 Kč
6	631 31 9175 /00	Příplatek za srovnání povrchu před vložení výztuže mazaninou tl. do 24cm	m3	1,589	187,50 Kč		297,84 Kč
7	631 36 1921 /00	Výztuž mazanin z betonů a lehkých betonů ze svařovaných sítí z drátů ocelových tažených	t	0,075	26 250,00 Kč		1 968,75 Kč
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							8 223,47 Kč
99 (Přesun hmot)							
8	998 01 1001 /00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 6 m	t	6,175	152,00 Kč		938,65 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)							938,65 Kč
Σ							9 939,88 Kč

rekapitulace

1	Zemní práce	666,00 Kč
27	Základy	111,75 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 223,47 Kč
99	Přesun hmot	938,65 Kč
Σ		9 939,88 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		ZL č. 15 SO 18 Sklad - stavební část - přesun oplocení, podlaha v kotelně					
objekt		SO 018 Sklad					
typ činnosti		PSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
Přesun oplocení							
767 (Kovové doplňkové konstrukce)							
1	767 91 1130 /00	Mříž oplocení ze strojového pletiva výšky do 200cm	m	7,300	219,50 Kč		1 602,35 Kč
		5,5 * 1,8 m					
2	767 91 4830 /00	Demontáž oplocení rámového na ocelových sloupcích výšky do 200cm	m	1,800	107,00 Kč		192,60 Kč
3		napínací strojek	ks	3,000	16,40 Kč		49,20 Kč
4		objímka komaxit 48mm	ks	3,000	19,00 Kč		57,00 Kč
5		příchytka	ks	3,000	18,20 Kč		54,60 Kč
6	313 27 0007	Pletivo čtyřhranné 50x2,2x200	m	7,300	83,50 Kč		609,55 Kč
7	998 76 7101 /00	Přesun hmot kovových doplňujících kci v objektu výšky do 6m	t	0,011	543,50 Kč		5,95 Kč
Σ díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)							2 571,25 Kč
Σ.							2 571,25 Kč

rekapitulace

767	Kovové doplňkové konstrukce	2 571,25 Kč
Σ		2 571,25 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 16

Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

**Předmět změny: SO 18 Sklad – stavební část
– doplnění protipožárních ucpávek**

Zhotovitel: BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 2.6.2015

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy:**

Popis

Fotodokumentace stávajícího stavu

Výkresová dokumentace

Popis stávajícího stavu

Objekt SO 18 je stavebně rozdělen na 5 samostatných požárních úseků, stávající potrubí páry a kondenzátu, které bude zdemontováno, je opatřeno požárními ucpávkami.

Projektové řešení

PD předpokládala, že celý objekt SO 18 je pouze 1 požární úsek a výstavbou nové plynové kotelny bude vytvořen druhý požární úsek. Požární ucpávky byly navrženy pouze u prostupu nového potrubí stěnou kotelny.


Navrhované řešení

Instalovat požární prostupy potrubí přes průchody stavebními konstrukcemi, které dělí jednotlivé požární úseky.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **zhotovitel**

Bude zajištěno provedení požárních ucpávek pro ocelové potrubí plynu a topné vody při jejich prostupu mezi jednotlivými sklady, prostory garáží a kanceláří. Dle podkladů předaných provozním střediskem je v objektu celkem 5 samostatných požárních úseků + 1 nový (plynová kotelna). Pro získání kladného stanoviska požárního specialisty je nutné doplnění požárních ucpávek u prostupů mezi jednotlivými požárními úseky.


BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:


Aby bylo možné vydat souhlasné stanovisko HZS ke kolaudaci, je nutné tyto práce provést. S navrženým rozsahem souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz


.....
SAFETY PRO, s.r.o.**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

V PD byly řešeny pouze ucpávky z nově budovaného požárního úseku, členění objektu na požární úseky nebylo ověřeno (nesnadný přístup). Tyto požární ucpávky je nutné doplnit. S navrženými změnami souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Stanovisko objednatele stavby:**


Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


.....
Armádní Servisní, p.o.**Poznámky:**

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změna rozsahu položky / změna řešení.


OZ č. 16 - strojici stav






ZL č. 16

NOVÉ POŽÁRNÍ UCPÁVKY - ČÁST B^u

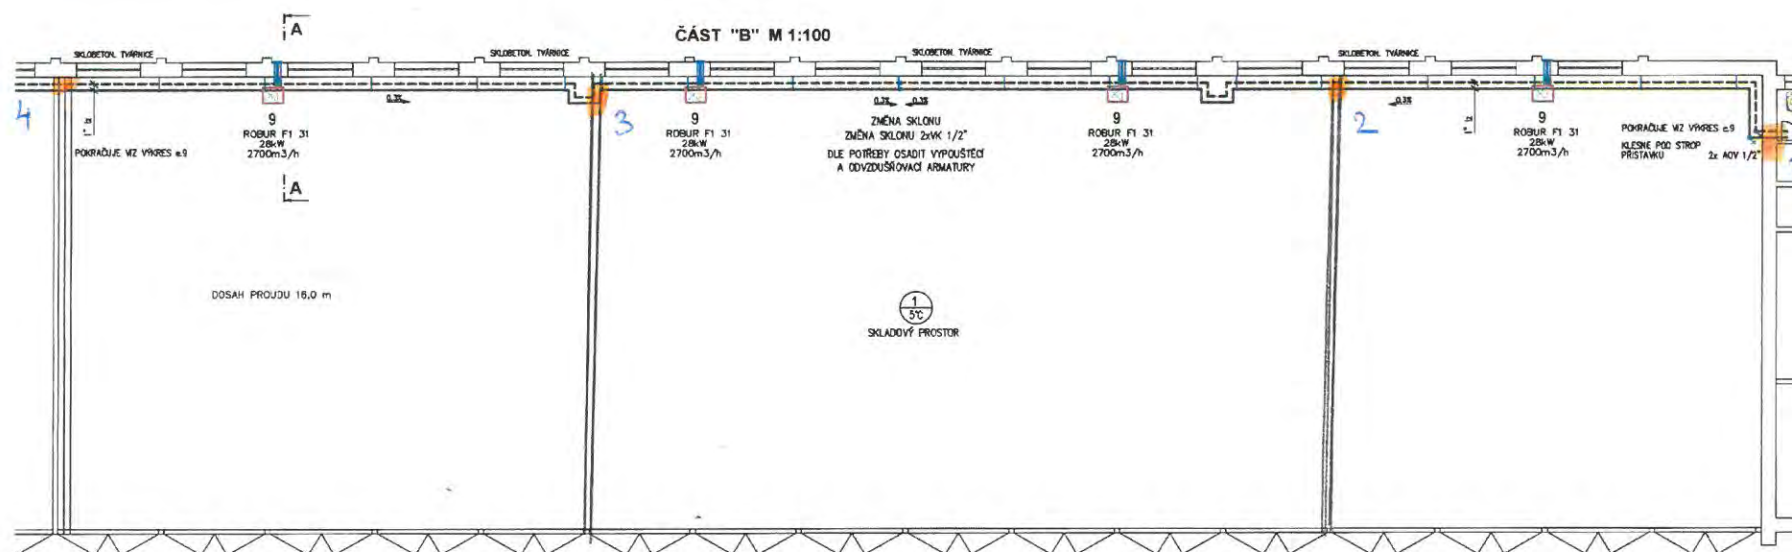


A - A M 1:50

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 16	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 18 Sklad – stavební část – doplnění protipožárních ucpávek			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 16	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Objekt SO 18 je stavebně rozdělen na 5 samostatných požárních úseků, stávající potrubí páry a kondenzátu, které bude zdemontováno, je opatřeno požárními ucpávkami.			
<u>Projektové řešení</u> PD předpokládala, že celý objekt SO 18 je pouze 1 požární úsek a výstavbou nové plynové kotelny bude vytvořen druhý požární úsek. Požární ucpávky byly navrženy pouze u prostupu nového potrubí stěnou kotelny.			
<u>Navrhované řešení</u> Instalovat požární prostupy potrubí přes průchody stavebními konstrukcemi, které dělí jednotlivé požární úseky.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
.....
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**


- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... -----

Cena změny 7.200,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	7.200,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:



VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice
 Objekt:

30.9.2015

Soupis: ZL č. 16 - SO 018 Sklad - stavební část - doplnění protipožárních ucpávek

BOSS montáže, s.r.o.
 Družstevní 184, Bučovice

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							7 200
1			protipožární prostup potrubí ÚT	kpl	9	800	7200
Celkem bez DPH							7200
Celkem vícepráce bez DPH							7200

Horáček, 777 799 002
 BOSS montáže, s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 17

Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Předmět změny: SO 19 provozní budova – tělocvična - HUP

Zhotovitel: BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 2.6.2015

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy:

Popis

Fotodokumentace stávajícího stavu

Výkres – půdorys

Popis stávajícího stavu

Konstrukce obvodové stěny není zděná, jak předpokládal projekt, ale dřevěná, nosná konstrukce je opláštěna heraklitem a je dutá.

Projektové řešení

HUP a regulátor bude umístěny v nice obvodového zdiva - provedení v místě dle dokumentace půdorysu stavebních úprav /v.č. 3/ a dle detailu HUP /v.č. a.11/.

Navrhované řešení

Před stávající sendvičovou obvodovou stěnou bude vyzděn nový kiosek z váp. cihel, na základové pásy z betonu. Na kiosek bude zhotovena stropní železobetonová deska, s krytinou z Pz plechu. Projektovaná plastová skříň HUP bude osazena do nového zděného kiosku.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **zhotovitel**

Výstavba předsazeného zděného kiosku je nutná vzhledem ke špatnému stavu stávající konstrukce obvodové stěny. Obvodovou stěnu by bylo potřeba nově vyzdít, jinak by nebylo možné osadit plynoměrovou skříň s HUP, ale to by bylo finančně nákladnější, než vyzdít novou skříň na nově zřízený betonový základ.



BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Projektem navržené řešení – dozdění přičky a niky a do nesoudržné obvodové zdi, kdy tato stěna není cihelná, jak je uvedeno v PD, ale sendvičová, by při její výšce 4,0 m byla nákladnější než zhotovitelem navržené řešení. Pro zdárné provedení prací doporučuji přistoupit k navrženému řešení a provést je. S rozsahem prací souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Navržené řešení je vhodné a doporučuji jej. Zásahem do obvodové zdi by práce vyšly finančně nákladněji (lešení, bourání, nové vnitřní omítky, nová fasáda, přesuny).

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Problematická situace byla konzultována na místě a objednatel souhlasí s návrhem na provedení. Při vyúčtování budou odečteny neprovedené práce

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

02 č. 14



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 17	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 19 provozní budova – tělocvična – HUP			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 17	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Konstrukce obvodové stěny není zděná, jak předpokládal projekt, ale dřevěná, nosná konstrukce je oplášťena heraklitem a je dutá. <u>Projektové řešení</u> HUP a regulátor bude umístěny v nice obvodového zdiva - provedení v místě dle dokumentace půdorysu stavebních úprav /v.č. 3/ a dle detailu HUP /v.č. a.11/. <u>Navrhované řešení</u> Před stávající sendvičovou obvodovou stěnou bude vyzděn nový kiosek z bílých cihel, na základové pásy z betonu. Na kiosek bude zhotovena stropní železobetonová deska, s krytinou z Pz plechu. Projektovaná plastová skříň HUP bude osazena do nového zděného kiosku.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- dle textu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) viz. jednotkové ceny rozpočtu

Cena změny + 6.841,84 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 6.841,84 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

30. 09. 2015



ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 17 SO 19 provozní budova - tělocvična - HUP
<i>Objekt</i>	SO 019 Provozní budova - tělocvična

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	6 841,84 Kč	- Kč	- Kč	6 841,84 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	6 841,84 Kč	- Kč	- Kč	6 841,84 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		6 841,84 Kč
<i>DPH</i>	<i>21% ze základu</i>	1 436,79 Kč
Σ		8 278,63 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 18	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 19 Tělocvična – omítka za radiátory			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu Půdorys s vyznačením dotčených míst	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Po demontážích stávajících otopných těles byla v několika místech objektu odkryta vlhká a opadaná omítka. Před osazením nových otopných těles je nutná oprava omítky. <u>Projektové řešení</u> Demontáž stávajících otopných těles a montáž nových deskových otopných těles bez nutnosti zednického zapravení. <u>Navrhované řešení</u> Po demontovaných stávajících těles v nejnutnější míře (plocha za tělesem s přesahem 10 cm na každou stranu) opravit omítky v rozsahu - odstranění poškozených vlhkých a opadávajících omítek, očištění a sanace stávajícího zdiva, zhotovení nových sanačních omítek a malby Primalex. Nová otopná tělesa není možné osadit na holé zdivo, tloušťka opadané omítky je 20 – 40 mm.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Před montáží nových otopných těles je nutné stávající degradované omítky odstranit a zdivo opatřit novou sanační omítkou a malbou.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

V rámci rekonstrukce je nejvhodnější provést tyto práce. V případě budoucího provádění omítek by vznikly zbytečné vícenáklady na demontáž a zpětnou montáž radiátorů a vypuštění a napuštění otopné soustavy upravovanou vodou.


Jméno: Ing. Karel Hróz


.....
SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Sanace mimo zdroj tepla nebyla předmětem PD. Vzhledem k montáži nového topného systému je nutné obvodovou zeď za radiátory sanovat. Souhlasím s navrženými změnami.


Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s provedením omítek, ale nesouhlasím s provedením omítek sanačních, protože lokální vyspravení drahými sanačními omítkami by bylo neekonomické.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


.....
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

Vícepráce dokumentace : objekt SO 019 - vnitřní sanační omítky




Oznámení změny č. 18 - fotodokumentace




Oznámení změny č. 18 - fotodokumentace





07 č. 18

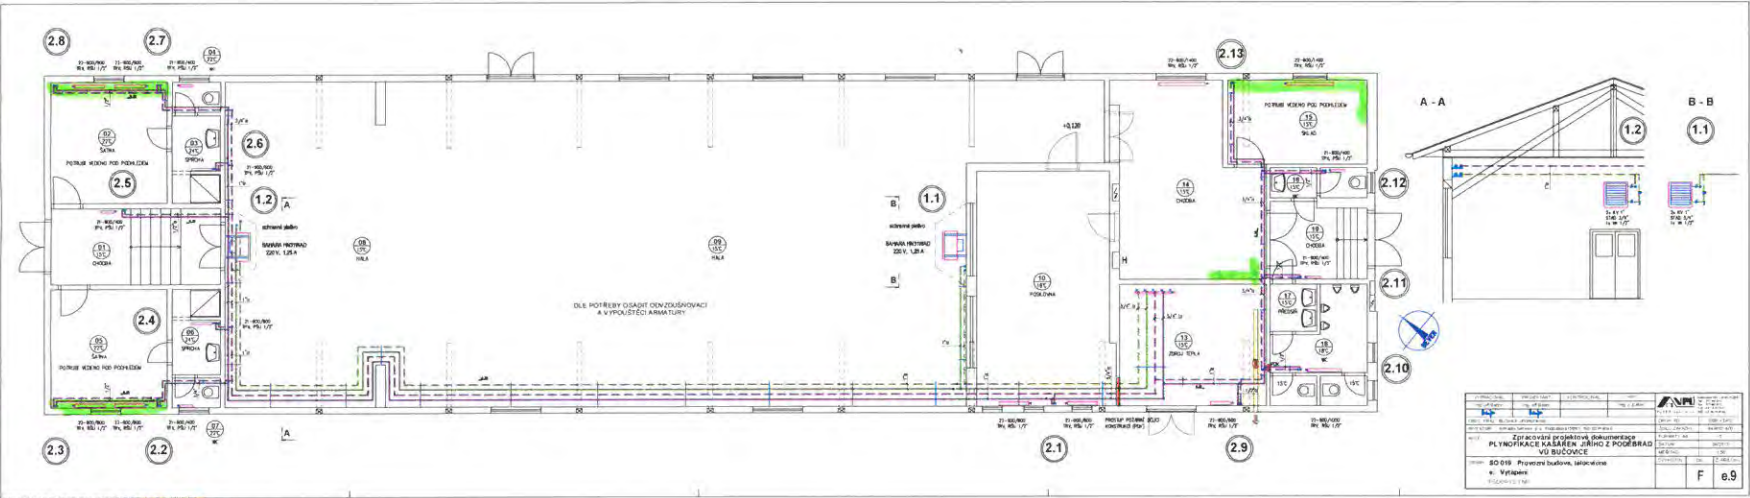

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 18	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 19 Tělocvična – omítky za radiátory			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:	Oznámení změny č. 19		
	Fotodokumentace skutečného provedení		
	Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Po demontážích stávajících otopných těles byla v několika místech objektu odkryta vlhká a opadaná omítka. Před osazením nových otopných těles je nutná oprava omítky. <u>Projektové řešení</u> Demontáž stávajících otopných těles a montáž nových deskových otopných těles bez nutnosti zednického zapravení. <u>Navrhované řešení</u> Po demontovaných stávajících těles v nejnutnější míře (plocha za tělesem s přesahem 10 cm na každou stranu) opravit omítky v rozsahu - odstranění poškozených vlhkých a opadávajících omítek, očištění a sanace stávajícího zdiva, zhotovení nových sanačních omítek a malby Primalex. Nová otopná tělesa není možné osadit na holé zdivo, tloušťka opadané omítky je 20 – 40 mm.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
.....
Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- dle textu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce


Cena změny + 17.720,77 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 17.720,77 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:  Datum:	Podpis zástupce objednatele:  30. 11. 2015 Datum:

SD 19

ZL č. 18

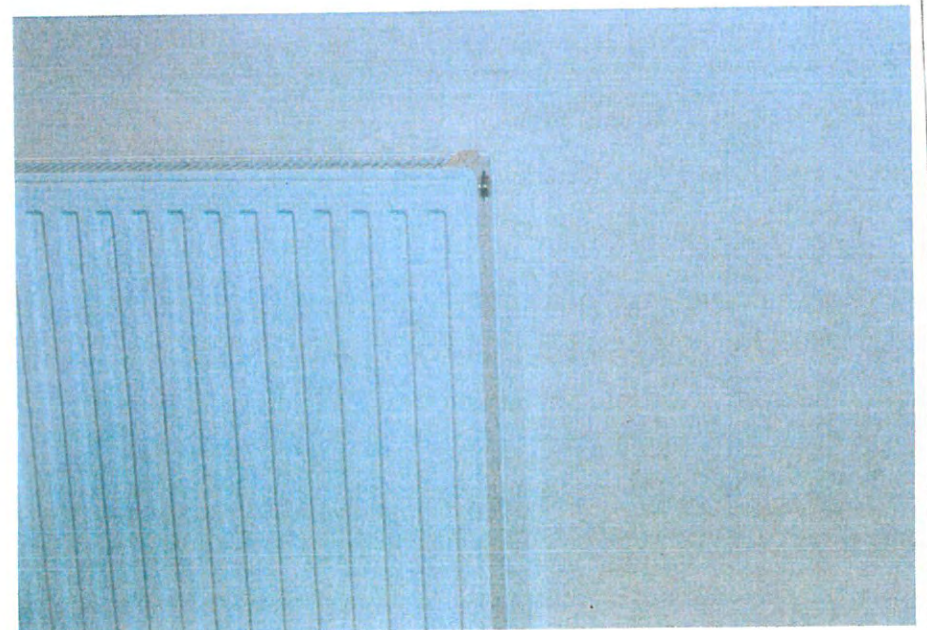

SLČ. 18

Shrubné provedení



ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 18 - SO 19 Tělocvična - omítky za radiátory
<i>Objekt</i>	SO 019 Tělocvična

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

685 01

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	16 144,43 Kč	1 576,35 Kč	- Kč	17 720,77 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	16 144,43 Kč	1 576,35 Kč	- Kč	17 720,77 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>			17 720,77 Kč
<i>DPH</i>	<i>21% ze základu</i>	17 720,77 Kč	3 721,36 Kč
Σ			21 442,14 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)						
stavba	ZL č. 18 - SO 19 Tělocvična - omítky za radiátory						
objekt	SO 019 Tělocvična						
typ činnosti	HSV						
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
61 (Úprava povrchů vnitřní)							
1	612 40 1391 /00	Oprava malých ploch omítek vnitřních stěn do plochy 1m2	ks	16,000	195,00 Kč		3 120,00 Kč
		1 6+2+4+4		16,000			
2	612 42 1131 /00	Oprava vápenných omítek stěn vnitřních štukových do 5% opr. plochy	m2	296,100	23,00 Kč		6 810,30 Kč
		1 (3,6+3,45)*2*4,2+(3,5+6,3)*2*4,2+(2,6+2,4)*2*4,2+(3,5+2,1)*2*4,2+(3,5+4,3)*2*4,2		296,100			
3	612 47 6112 /00	Postřik sanační na zdivo Otavit 305 tl. 6mm	m2	5,850	37,50 Kč		219,38 Kč
		1 4,5*0,9+1,5*1,2		5,850			
4	612 47 6612 /00	Sanační omítka štuková Otavit 310,312 tl. 22mm	m2	5,850	412,50 Kč		2 413,13 Kč
Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)							12 562,80 Kč
62 (Úprava povrchů vnější)							
5	620 47 1811 /00	Nátěr základní penetrační silikon Baumit	m2	20,665	18,50 Kč		382,30 Kč
		((3,6+3,45)*2*4,2+(3,5+6,3)*2*4,2+(2,6+2,4)*2*4,2+(3,5+2,1)*2*4,2+(3,5+4,3)*2*4,2)*0,05+4,5*0,9+1,5*1,2		20,665			
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)							382,30 Kč
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							
6		Vyčištění a příprava podkladu	kompl.	1,000	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							2 000,00 Kč
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							
7	978 01 3161 /00	Otučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 50%	m2	20,665	56,25 Kč		1 162,41 Kč
		((3,6+3,45)*2*4,2+(3,5+6,3)*2*4,2+(2,6+2,4)*2*4,2+(3,5+2,1)*2*4,2+(3,5+4,3)*2*4,2)*0,05+4,5*0,9+1,5*1,2		20,665			
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							1 162,41 Kč
979 (Odvoz sutí)							
8	979 08 2111 /00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 50m	t	0,050	150,00 Kč		7,50 Kč
Σ díl 979 (Odvoz sutí)							7,50 Kč
99 (Přesun hmot)							
9	998 01 1031 /Z0	Přesun hmot budov s nosnou kci z bloků výšky 6 m	t	0,226	130,00 Kč		29,42 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)							29,42 Kč
Σ							16 144,43 Kč
rekapitulace							
61	Úprava povrchů vnitřní			12 562,80 Kč			
62	Úprava povrchů vnější			382,30 Kč			
63	Podlahy a podlahové konstrukce			2 000,00 Kč			
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot			1 162,41 Kč			
979	Odvoz sutí			7,50 Kč			
99	Přesun hmot			29,42 Kč			
Σ				16 144,43 Kč			

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		ZL č. 18 - SO 19 Tělocvična - omítky za radiátory					
objekt		SO 019 Tělocvična					
typ činností		PSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
784 (Malby)							
1	784 45 5941_/00	Obnova -malba PRIMALEX disperzní dvojnásobná fungicidní bílé místnosti výšky do 3,8m	m2	30,060	52,44 Kč		1 576,35 Kč
		4,0*1,1+2,5*1,1+0,8*2,0+0,5*0,6+3,5*1,5*2+1,8*1,5+2,6*0,8+3,6*1,2+0,6*0,4*4+0,3*1,5					
Σ díl 784 (Malby)							1 576,35 Kč
Σ							1 576,35 Kč
rekapitulace							
	784	Malby		1 576,35 Kč			
Σ				1 576,35 Kč			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 19	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 19 Tělocvična – přeložka potrubí z polypropylenu (PPR)			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
	Půdorys s vyznačením místa		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Plastové potrubí DN 25 zásobující zadní sociální zařízení (místnosti 03, 06 a 07) prochází ve výšce 130 cm podél obvodové vnitřní stěny a vede místem, kde má být nový vstup do kotelny.			
<u>Projektové řešení</u> V PD se vedení potrubí vody v těchto místech nepředpokládalo.			
<u>Navrhované řešení</u> Demontáž stávajícího potrubí PPR v délce 3,5 m v úseku obvodové stěny budoucí kotelny, montáž nového potrubního rozvodu z trubek PPR, napojení na stávající rozvody. Nové rozvody budou vedeny po obvodu půdorysné plochy kotelny.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Přeložka stávajícího rozvodu vodovodu je nutná pro zajištění přístupu do kotelny a montáž technologie nové plynové kotelny. Potrubí nebylo možné vést nade dveřmi, protože nade dveřmi je umístěn nadsvětlík..			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Zajištění funkčního vodovodního potrubí je nutné zachovat, zásobuje sociální zařízení (místnosti 03, 06 a 07). Delší vedení (po obvodu místnosti) je nutné, nelze vést jinudy. Z provozních důvodů je nutné tyto práce provést. Souhlasím s rozsahem.


Jméno: Ing. Karel Hróz


.....
SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Stávající rozvod byl veden v zazděné drážce ve zdivu. V PD nebylo s přeložkou uvažováno. S navrženými změnami souhlasím.


Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


.....
Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

SO 019 - práce
- přeložka potrubí PPR

Oz č. 19



SO 019

ZL č. 19

PŮDORYS VODOVODU A

NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ ROZVOD VODOVODU

ZEUŠIT -
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
Z TRUBEK PPR

VYHLEDÁNÍ POTRUBÍ OD VPUSTI A NAPOJENÍ
ZRUŠENÍ VPUSTI

SV: 20x2.8i

přívod vody
1500mm nad podl

Ku

1470

110 87

600

800

1600

520

700

900

3650 mm

1200

820

400

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

NAVRŽENA PŘELOŽKA
VODOVODU - PPR 25

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 19	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 19 Tělocvična – přeložka potrubí z polypropylenu			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 20	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Plastové potrubí DN 25 zásobující zadní sociální zařízení (místnosti 03, 06 a 07) prochází ve výšce 130 cm podél obvodové vnitřní stěny a vede místem, kde má být nový vstup do kotelny. <u>Projektové řešení</u> V PD se vedení potrubí vody v těchto místech nepředpokládalo. <u>Navrhované řešení</u> Demontáž stávajícího potrubí PPR v délce 3,5 m v úseku obvodové stěny budoucí kotelny, montáž nového potrubního rozvodu z trubek PPR, napojení na stávající rozvody. Nové rozvody budou vedeny po obvodu půdorysné plochy kotelny.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
.....
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**

- Fotodokumentace
- Položkový rozpočet

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce

Cena změny + 3.056,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 3.056,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:

ZL č. 19


- přeložka PPR

Změnový list č. 19 - fotodokumentace



ZL č. 19

Přeložba potrubí PPR - skutečné provedení

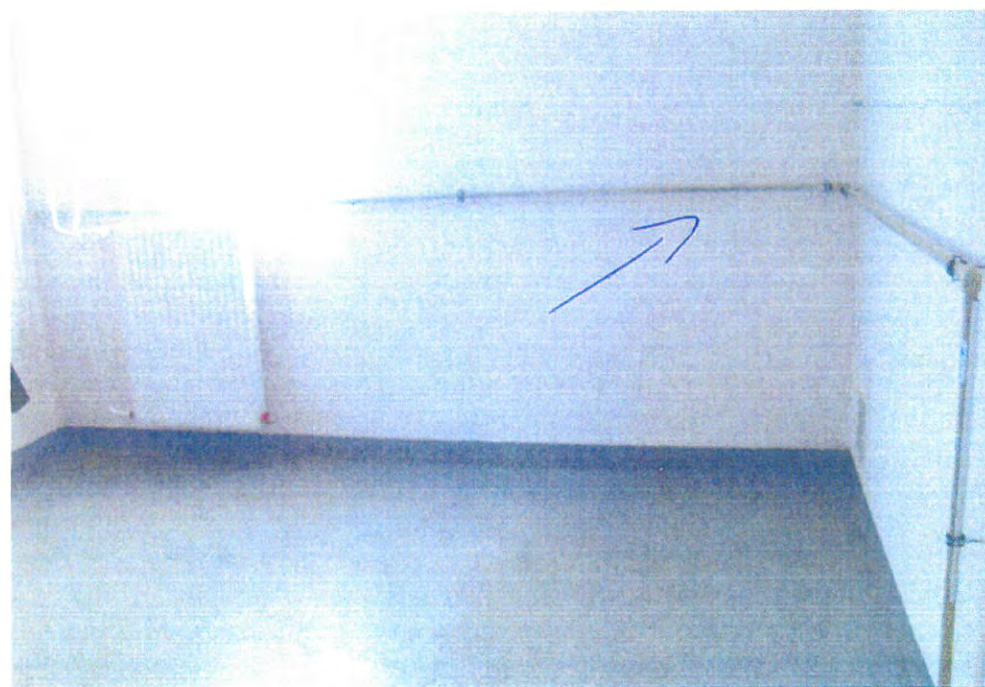

VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Stavba: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice
 Objekt: SO 019 Přeložka potrubí SV - sociální zařízení
 Soupis: SO 019 ZTI

30.9.2015

Berčák, 777 785 689
 BOSS montáže, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							3 056
							2 992
1			demontáž potrubí PPR prům. 25	m	3	13	39
2			D+M potrubí PPR prům. 25, PN 20	m	6,5	267	1735,5
3			D+M nosný profil Zn prům. 25	m	6	35	210
4			demontáž stávajícího ventilu výtakového 3/4"	ks	1	15	15
5			napojení na stávající potrubí PPR prům. 25	ks	1	96	96
6			D+M kulový uzávěr DN 20	ks	1	268	268
7			D+M upevnění potrubí DN 20	ks	5	45	225
8			tlaková zkouška potrubí DN 50	m	6,5	34	221
9			proplach potrubí do 6 m	m	6,5	28	182
			přesun hmot				65
10			přesun hmot do 6 m	%	0,0102	2992	31
11			příplatek za zvětšený přesun do 500 m	%	0,0114	2992	34

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 20	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva a) vstupní schodiště b) dělicí příčka mezi novou PK a stávající strojvnou c) vyrovnaní podlahy ve velínu			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu Výkres – půdorys a řez	
<u>Popis stávajícího stavu</u> a) Výměra z rozpočtu příčky tl. 15 cm (stavebně oddělující prostor dřívějšího ohřevu TUV od nově vzniklé plynové kotelny) neodpovídá skutečnosti. Rozdíl – navýšení o 3 m ² . b) Po demontáži venkovních stávajících násypek na uhlí se nevyskytoval podkladní beton uvažovaný v PD, který měl sloužit jako základ pod nově zhotovované schodiště do velínu. c) Stávající betonová podlaha v místnosti velínu a nové kotelně. Z důvodu velkých nerovností stávající betonové podlahy místností velínu (velké spády) bude potřeba podlahu vyrovnat vyšší vrstvou betonu, než je uvažováno v projektu.			
<u>Projektové řešení</u> Ad a) Nová dělicí příčka je v rozpočtu v rozsahu o 3 m ² (což byl montážní prostor pro kotle) menším, než je nutná skutečnost. Pravděpodobně omyl rozpočtáře. Ad b) V průběhu zpracování PD nebyl zpracován podrobný průzkum a na základě dodaných podkladů projektant uvažoval, že pod stávajícími násypkami na uhlí je podkladní beton, což se po vybourání násypek nepotvrdilo. Ad c) Projektová dokumentace předpokládala menší nerovnosti podlahy v místnosti budoucího velínu.			
<u>Navrhované řešení</u> Ad a) dozdění příčky tl 15 cm v ploše 3 m ² Ad b) provedení nového betonového základu pod vstupním schodištěm včetně zemních prací; provedení betonové mazaniny a potěru u vstupního schodiště. Ad c) zvýšit tloušťku bet. mazaniny v ploše podlahy velína o cca 6 m ³ .			

Důvod změny:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Díky výše popsanému problému zhotovitel považuje navržené technické řešení za optimální a dostatečné pro zajištění funkčnosti stavebního díla.


BOSS montáže, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Provedení nového betonového základu pod vstupním schodištěm včetně zemních prací je nezbytné, ostatní práce navržené zhotovitelem je nutné také provést z důvodu bezpečného provozu. S navrženým řešením souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

S navrženým řešením souhlasím. Nebylo nalezeno jiné možné řešení.


Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením všech tří částí; TDS zodpovídá za správně a pravdivé uvedení výměr u provedených prací a porovnáním s rozpočtem.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

SO 33 - přeprava - vstupní schodiště
OZ č. 20


VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
DO VELNÝ
PŘEVÁŽENÍ

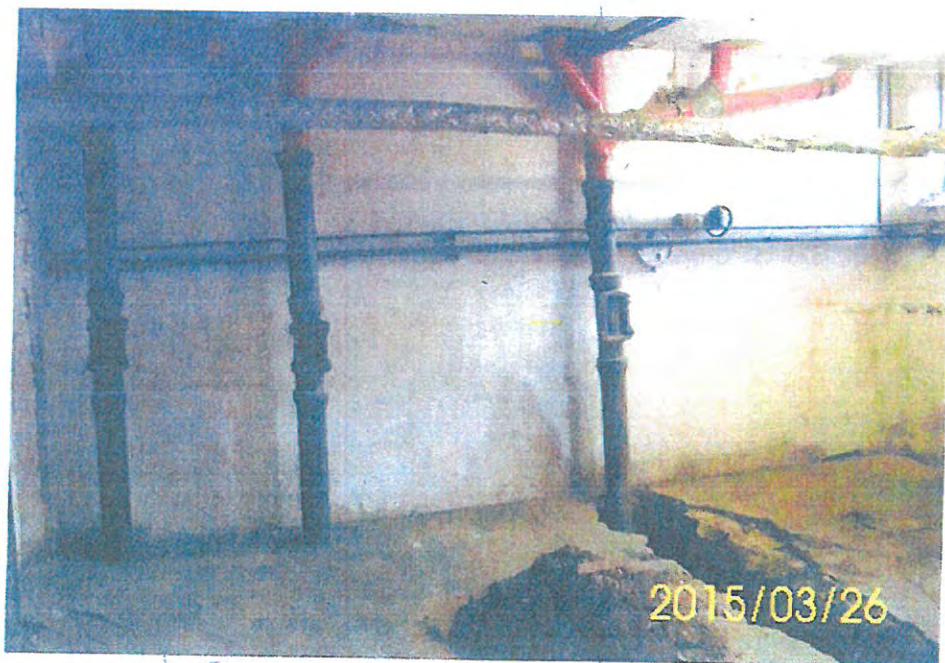

VYKOVNANÍ PODLAHY VE VELNĚ - STAVAJÍCÍ STAV - 2x




- POZPOČET $10,54 \text{ m}^2$
- SKUTEČNOST $13,54 \text{ m}^2$
- VÍCEPRAČE $3,0 \text{ m}^2$




1:50

Oznámení změny č. 20 - výkres

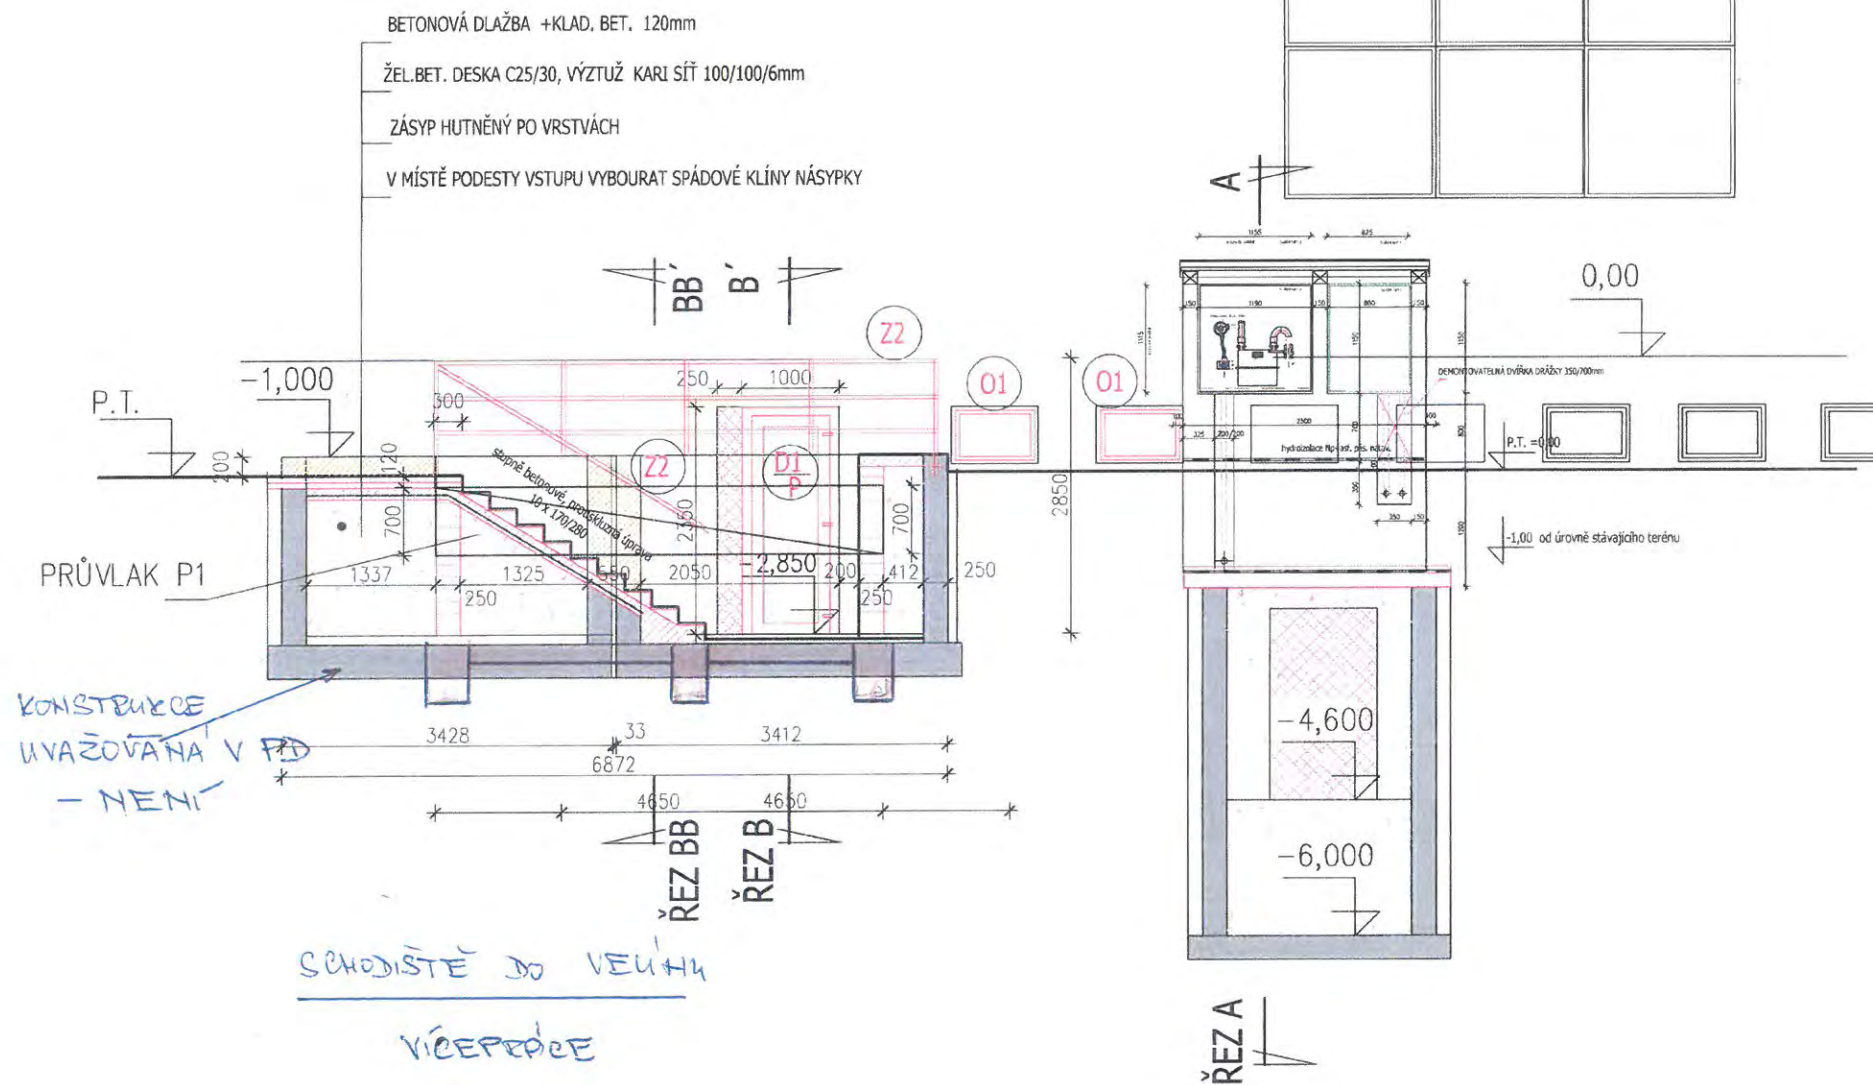

SO 033 Velitelství a kuchyně mužstva
 a.9 Fasáda-řez C - C' - stavební úpravy


1 : 50

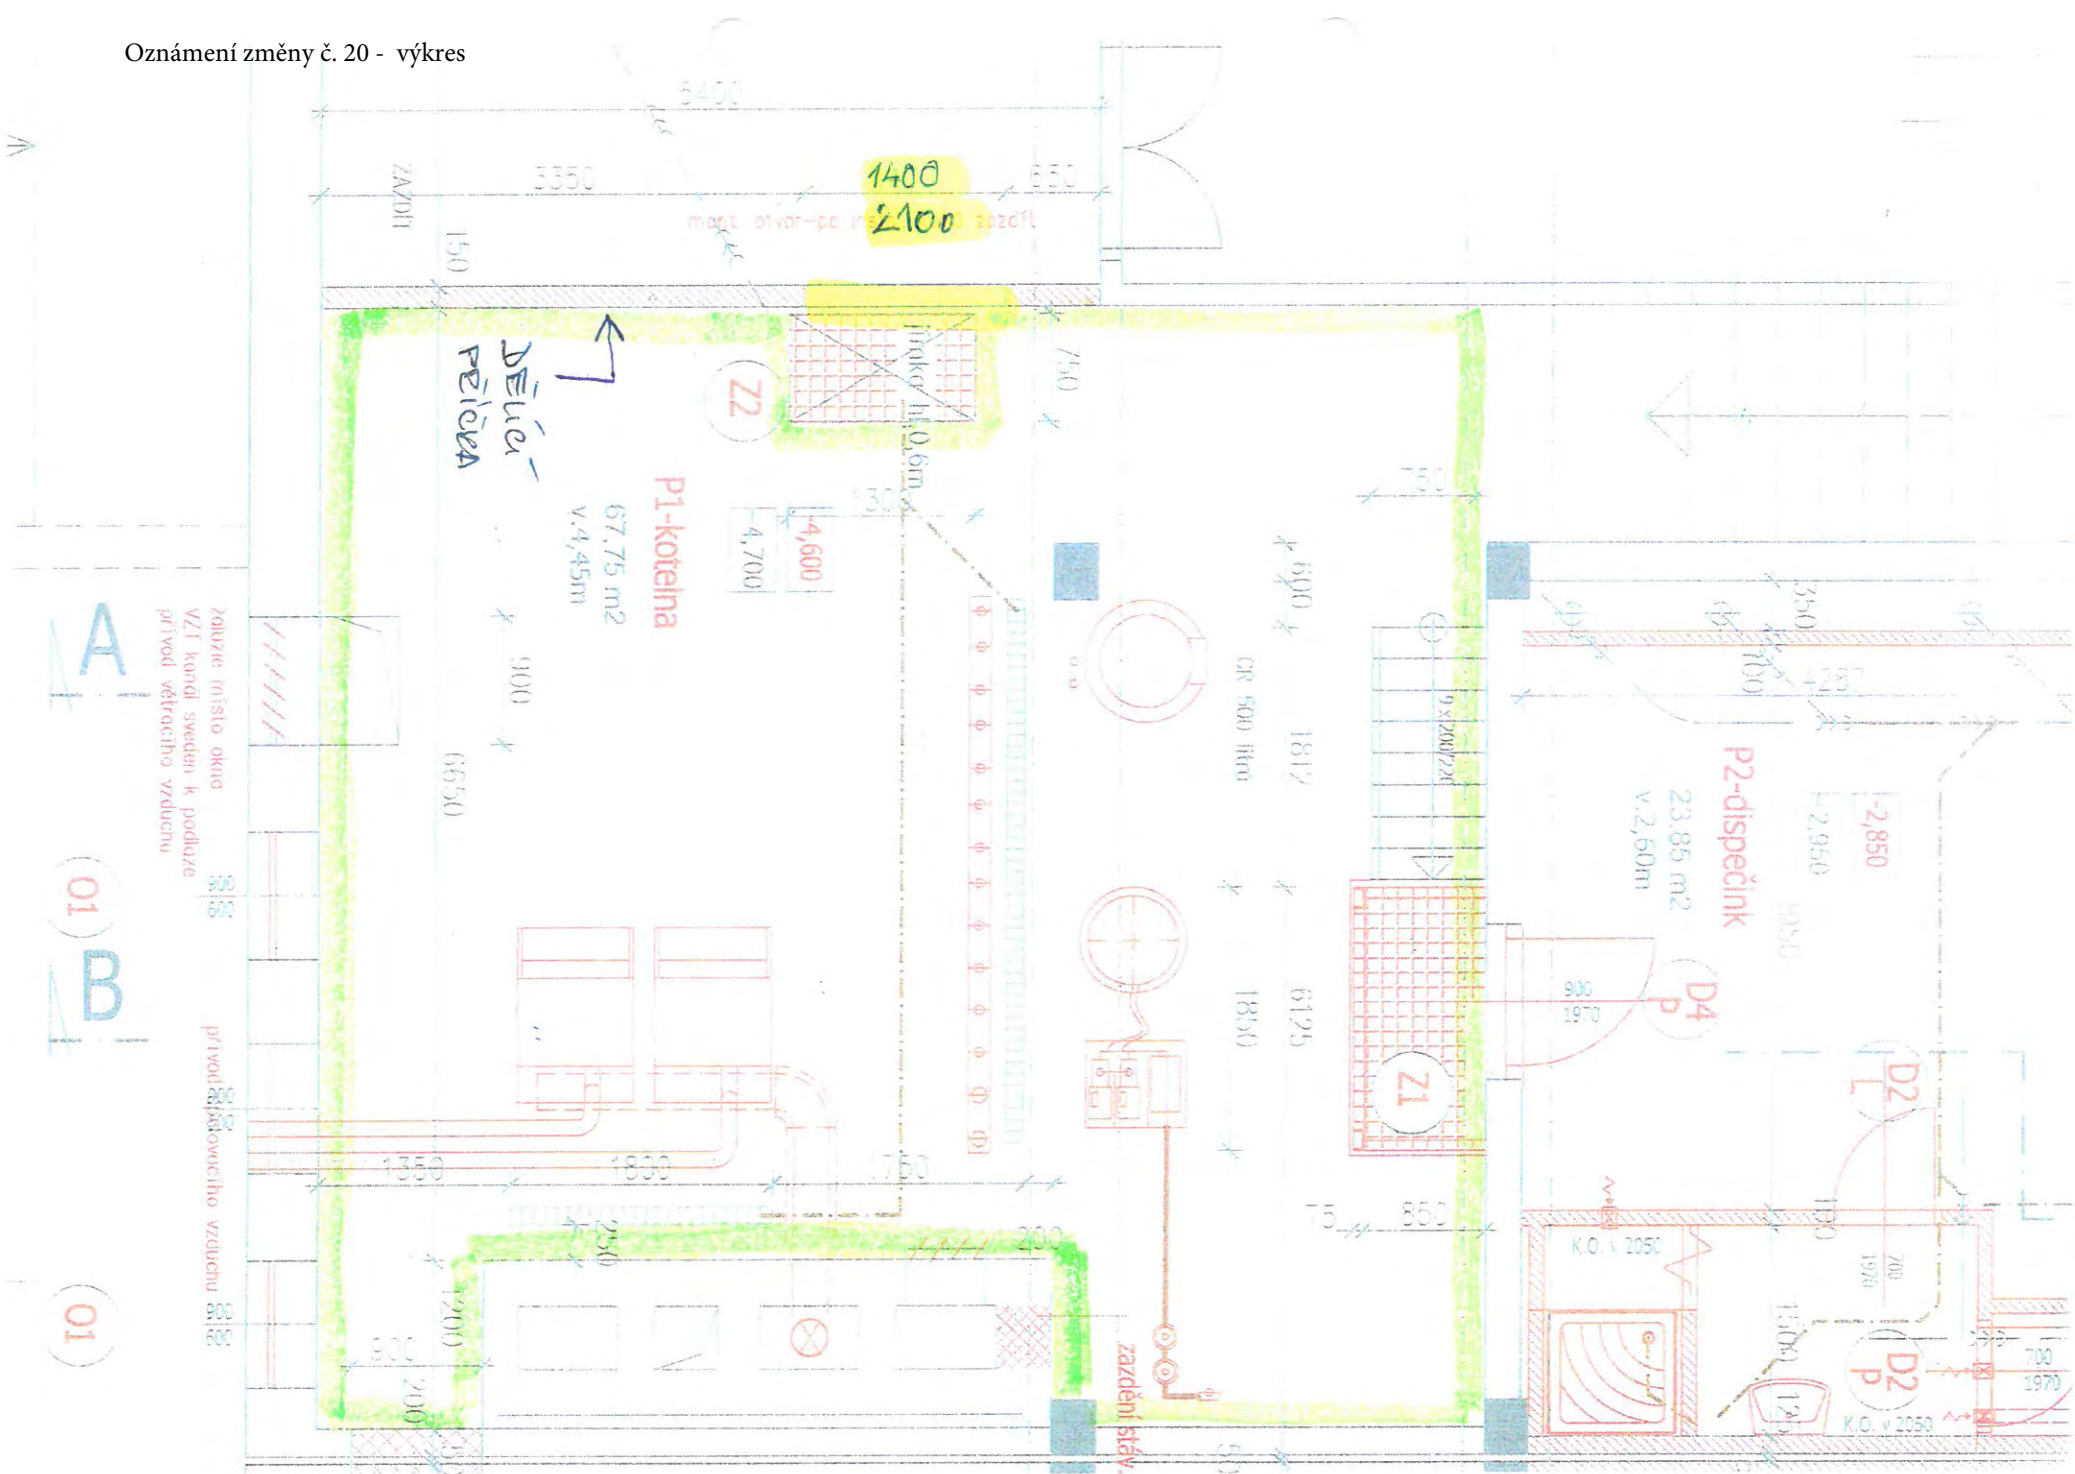

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 20	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva a) vstupní schodiště- b) dělicí příčka mezi novou PK a stávající strojovnou c) vyrovnaní podlahy ve velínu			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 20	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> a) Výměra z rozpočtu příčky tl. 15 cm (stavebně oddělující prostor dřívějšího ohřevu TUV od nově vzniklé plynové kotelny) neodpovídá skutečnosti. Rozdíl – navýšení o 3 m ² . b) Po demontáži venkovních stávajících násypek na uhlí se nevyskytoval podkladní beton uvažovaný v PD, který měl sloužit jako základ pod nově zhotovované schodiště do velínu. c) Stávající betonová podlaha v místnosti velínu a nové kotelny - z důvodu velkých nerovností stávající betonové podlahy v místnosti (velké spády), bude potřeba podlahu vyrovnat vyšší vrstvou betonu, než je uvažováno v projektu.			
<u>Projektové řešení</u> Ad a) Nová dělicí příčka je v rozpočtu v rozsahu o 3 m ² (což byl montážní prostor pro kotle) menším, než je nutná skutečnost. Pravděpodobně omyl rozpočtáře. Ad b) V průběhu zpracování PD nebyl zpracován podrobný průzkum a na základě dodaných podkladů projektant uvažoval, že pod stávajícími násypkami na uhlí je podkladní beton, což se po vybourání násypek nepotvrdilo. Ad c) Projektová dokumentace předpokládala menší nerovnosti podlahy v místnosti budoucího velínu.			
<u>Navrhované řešení</u> Ad a) dozdění příčky tl. 15 cm v ploše 3 m ² Ad b) provedení nového betonového základu pod vstupním schodištěm včetně zemních prací; provedení betonové mazaniny a potěru u vstupního schodiště. Ad c) zvýšit tloušťku bet. mazaniny v ploše podlahy velína o cca 6 m ³ .			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			

Zhotovitel


Jméno: Ing. Pavel Omelka


BOSS montáže, s.r.o.**Technický dozor stavebníka**

Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.**Autorský dozor projektanta stavby**

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**

- Fotodokumentace
- Položkový rozpočet

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce

Cena změny + 30.927,04 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 30.927,04 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015









SO 33 ZL č. 20

Změnový list č. 20 - fotodokumentace

VSTUP. SCHODIŠTĚ DO VEHY - PO REALIZACI



VÝROVNĚNÍ PODLAHY VE VELNĚ PO REALIZACI



ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 20 SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva - vstupní schodiště, dělicí příčka mezi novou plynovou kotelnou a stáv.strojovnou, vyrovnání podlahy ve velínu
<i>Objekt</i>	SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	30 393,08 Kč	91,46 Kč	- Kč	30 484,54 Kč
specifikace	- Kč	442,50 Kč	- Kč	442,50 Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	30 393,08 Kč	533,96 Kč	- Kč	30 927,04 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH		30 927,04 Kč
DPH	21% ze základu	6 494,68 Kč
Σ		37 421,71 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		ZL č. 20 SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva - vstupní schodiště, dělicí příčka mezi novou plynovou kotelnou a stáv.strojovnou, vyrovnání podlahy ve velinu					
objekt		SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva					
typ činností		HSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
1 (Zemní práce)							
1	979 09 7115 /00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	t	2,189	112,50 Kč		246,24 Kč
		1 1,368*1,6		2,189			
Σ díl 1 (Zemní práce)							246,24 Kč
13 (Hloubené vykopávky)							
2	131 20 3101 /00	Hloubení jam v soudržných horninách 3 ručně	m3	0,720	487,50 Kč		351,00 Kč
		1 1,6*0,9*0,5		0,720			
3	132 20 1101 /00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v horninách 3 do 100 m3	m3	0,648	375,00 Kč		243,00 Kč
		1 0,9*0,8*0,3*2+0,3*0,9*0,8		0,648			
Σ díl 13 (Hloubené vykopávky)							594,00 Kč
16 (Přemístění výkopku)							
4	161 10 1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m	m3	1,368	52,50 Kč		71,82 Kč
		1 0,72+0,648		1,368			
5	162 70 1105 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m	m3	1,368	195,00 Kč		266,76 Kč
6	162 70 1109 /00	Příplatek za každých dalších 1000 m z horniny 1 až 4 vodorovné přemístění	m3	15,050	15,00 Kč		225,75 Kč
Σ díl 16 (Přemístění výkopku)							564,33 Kč
27 (Základy)							
7	274 31 1611 /00	Beton základových pasů prostý C16/20(B20)	m3	0,630	1 875,00 Kč		1 181,25 Kč
		1,1*0,3*0,7 + 0,95 * 0,3*0,7*2					
Σ díl 27 (Základy)							1 181,25 Kč
34 (Stěny a příčky)							
8	342 24 8331 /00	Příčky z tvárnice SUPERTHERM Aku P+D; P8; C8/10(B10); tl.140mm	m2	3,000	487,50 Kč		1 462,50 Kč
Σ díl 34 (Stěny a příčky)							1 462,50 Kč
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							
9	631 31 1125 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20/25 tl. do 12cm	m3	0,173	2 625,00 Kč		453,60 Kč
		1 1,6*0,9*0,12		0,173			
10	631 31 1135 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20/25 tl. do 24cm	m3	6,916	1 875,00 Kč		12 967,50 Kč
		1 1,6*0,9*0,15		0,216			
		2 67*0,1		6,700			
11	631 31 9173 /00	Příplatek za srovnání povrchu před vložení výztuže mazaninou tl. do 12cm	m3	0,173	187,50 Kč		32,40 Kč
12	631 31 9175 /00	Příplatek za srovnání povrchu před vložení výztuže mazaninou tl. do 24cm	m3	6,916	187,50 Kč		1 296,75 Kč
13	631 36 2021 /00	Výztuž mazanin z betonů a lehkých betonů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,298	26 250,00 Kč		7 831,95 Kč
		1 0,025+67*1,2*3,4*0,001		0,298			
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							22 582,20 Kč
99 (Přesun hmot)							
14	998 01 1002 /Z0	Přesun hmot	t	18,444	204,00 Kč		3 762,56 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)							3 762,56 Kč
Σ							30 393,08 Kč

rekapitulace

1	Zemní práce	246,24 Kč
13	Hloubené vykopávky	594,00 Kč
16	Přemístění výkopku	564,33 Kč
27	Základy	1 181,25 Kč
34	Stěny a příčky	1 462,50 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	22 582,20 Kč
99	Přesun hmot	3 762,56 Kč
Σ		30 393,08 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)
stavba	ZL č. 20 SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva - vstupní schodiště, dělicí příčka mezi novou plynovou kotelnou a stáv.strojovnou, vyrovnání podlahy ve velinu
objekt	SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva
typ činnosti	PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)							
1	711 11 1001 /00	Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodorovná - nátěr penetrační	m2	1,440		7,50 Kč	10,80 Kč
		1 1,6*0,9		1,440			
2	711 14 1559 /00	Izolace proti zemní vlhkosti přitavená vodorovná - pásy NAIP	m2	1,440		52,50 Kč	75,60 Kč
3	111 63 0001	Asfaltový lak penetrační ALP-Penetral	t	0,001	262	500,00 Kč	262,50 Kč
4	628 32 0005	Pás asfaltovaný těžký BITAGIT V 60 S 40	m2	2,000		90,00 Kč	180,00 Kč
5	998 71 1101 /00	Přesun hmot izolací proti vodě objektu výšky do 6m	t	0,009		542,00 Kč	5,06 Kč
Σ díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)							533,96 Kč
Σ							533,96 Kč

rekapitulace

711	Izolace proti vodě a vlhkosti	533,96 Kč
Σ		533,96 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 21	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – vyrovnání betonové podlahy ve stávající uhelně za novým velínem			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
	Výkres – půdorys		
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
V prostorách stávající uhelny je propadlá, zvětralá a značně nerovná spádová betonová podlaha.			
<u>Projektové řešení</u>			
Projektová dokumentace neřeší opravy místnosti P3.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Po montáži příčky bude provedeno doplnění propadlé podlahy betonem a provedení cementového potěru.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Provedeme dle požadavku investora a provozního střediska.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Současný stav podlahy je v havarijním stavu, provedení navrhovaných prací je nutné, souhlasím s jejich provedení a rozsahem.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Finální úpravy prostor nevyužitých pro rekonstrukci zdroje tepla nebyly předmětem zadání PD.

S provedením uvedených prací souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Místnost (P3), která byla využívána jako uhelna, není vhodná v tomto stavu k předání provoznímu středisku – nerovná podlaha rozdíl +/- cca 100 mm (uvažováno od středu místnosti). Doporučuji provést betonovou mazaninu v celé ploše.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.



ZLc. 21

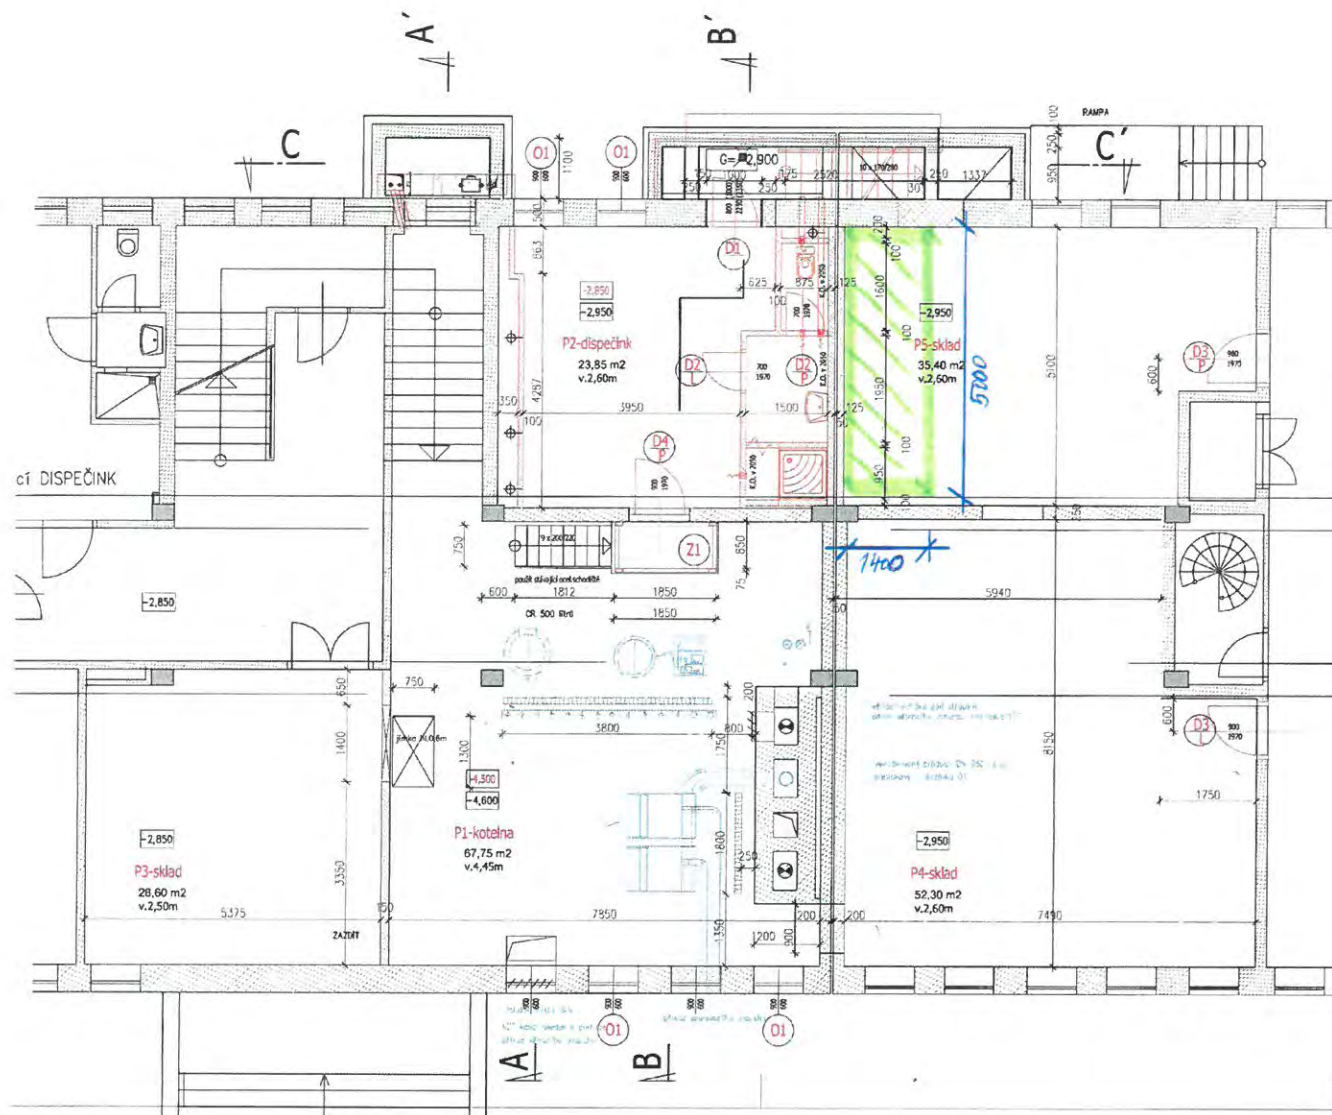

Lin.	višeut	podatka	pozov šlin	pozov orpa	plata
P1	ISTEJMA	semredni šlin, let, med let med. 1. 2018 in 2019, vsakega 1 svet. podatki vsakega svet. vsakega šlita- dan nile pa svet. svet. pa v šlin- besedeno	Biz. orpa orpa svet. šlin, orpa šlin(šlin) vsakega orpa	podatki svet. orpa	67,750
P2	DESEJMA	ISTO - Ictio P1	orpa svet. šlin, orpa šlin(šlin) vsakega svet.	podatki svet. orpa	11,800
P3	SKAO		orpa svet. šlin, orpa šlin(šlin) vsakega svet.		18,000
P4	SKAO		orpa svet. šlin, orpa šlin(šlin) vsakega svet.		52,800
P5	SKAO		orpa svet. šlin, orpa šlin(šlin) vsakega svet.		35,400

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 21	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – vyrovnaní betonové podlahy ve stávající uhelně za novým velínem			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 21	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> V prostorách stávající uhelny je propadlá, zvětralá a značně nerovná spádová betonová podlaha. <u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace neřeší opravy místnosti P3. <u>Navrhované řešení</u> Po montáži příčky bude provedeno doplnění propadlé podlahy betonem a provedení cementového potěru.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jiří Babor  Jiří Babor			

Investor:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Fotodokumentace
- Položkový rozpočet

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce

Cena změny + 3.545,57 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 3.545,57 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 09. 2015
Datum:	Datum:



ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 21 - SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva - stavební část - vyrovnaní betonové podlahy ve stávající uhele za novým velínem
<i>Objekt</i>	SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	3 545,57 Kč	- Kč	- Kč	3 545,57 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	3 545,57 Kč	- Kč	- Kč	3 545,57 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>			3 545,57 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	3 545,57 Kč	744,57 Kč
Σ			4 290,15 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		ZL č. 21 - SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva - stavební část - vyrovnání betonové podlahy ve stávající uhebně za novým velínem				
objekt		SO 033 (Velitelství, kuchyně)				
typ činnosti		HSV				
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	celkem
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						
1		Vyčištění a příprava podkladu	kompl.	1,000	400,00 Kč	400,00 Kč
2	631 31 1125 /00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20/25 tl. do 12cm	m3	0,560	2 625,00 Kč	1 470,00 Kč
	1	5*1,4*0,08		0,560		
3	631 31 9173 /00	Příplatek za srovnání povrchu před vložení výztuže mazaninou tl. do 12cm	m3	0,560	187,50 Kč	105,00 Kč
4	632 45 1054 /00	Potěr pískocementový 17 MPa připojený/litý tl. do 4cm hlazený ocelovým hladítkem	m2	7,750	151,50 Kč	1 174,13 Kč
	1	5*1,55		7,750		
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						3 149,13 Kč
99 (Přesun hmot)						
5	998 01 1002 /Z0	Přesun hmot	t	1,943	204,00 Kč	396,45 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)						396,45 Kč
Σ						3 545,57 Kč

rekapitulace


63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 149,13 Kč
99	Přesun hmot	396,45 Kč
Σ		3 545,57 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 22	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – úprava stávající kanalizace			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
	Výkres – půdorys		
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
V tomto objektu byl zjištěn havarijní stav stávající ležaté kanalizace. Ta byla po odkrytí vrchní betonové vrstvy propadlá a způsobovala únik splašků pod základy budovy v místnosti velínu.			
<u>Projektové řešení</u>			
V PD nebylo řešeno, předpokládalo se využití a napojení do stávající funkční ležaté kanalizace.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Tři stávající stoupačky kanalizace budou demontovány, provedeny nově z potrubí KG a propojeny vzájemně novým ležatým potrubím. Toto nové potrubí bude napojeno na stávající kanalizaci až u obvodového zdiva, v místech za propadlou částí stávající kanalizace.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Jedná se o vadu, která se neprojevila před realizací díla, ale až po odstranění vrchní betonové vrstvy.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Jedná se o odstranění havarijního stavu, provedení prací je nutné a s jejich rozsahem souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Skrytá závada zjištěná při rekonstrukci podlahy. Odstranění je nutné.
S provedením prací souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

V případě, že by se neřešila prasklá kanalizace (ležaté rozvody), docházelo by k průniku splašků do prostoru velínu. Doporučuji podrobně zdokumentovat a provést opravu ležaté kanalizace.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.


Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

02 č. 22



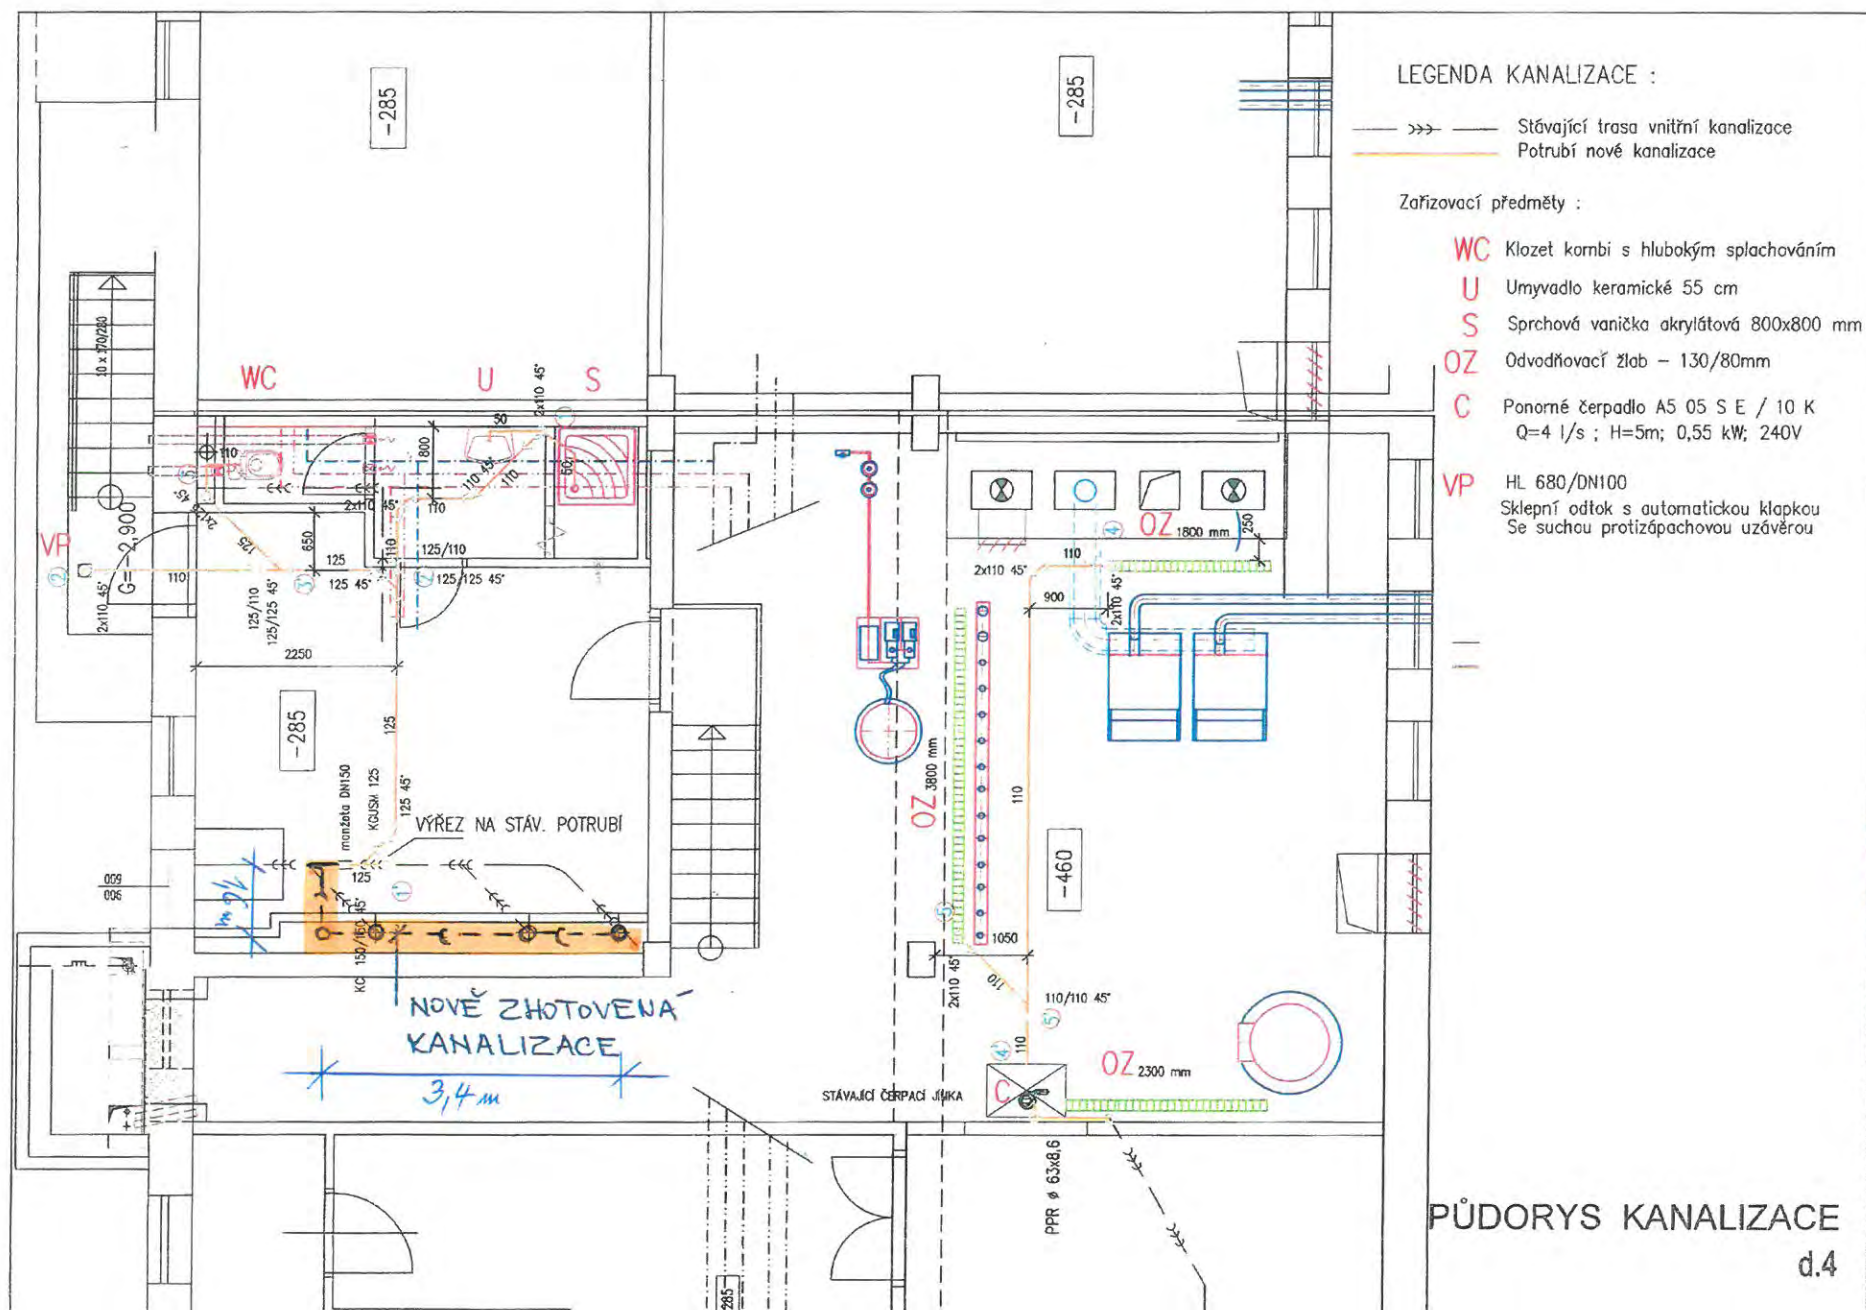

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 22
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice		
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – úprava stávající kanalizace		
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒		
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 22
		Fotodokumentace skutečného provedení
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet
<u>Popis stávajícího stavu</u> V tomto objektu byl zjištěn havarijní stav stávající ležaté kanalizace. Ta byla po odkrytí vrchní betonové vrstvy propadlá a způsobovala únik splašků pod základy budovy v místnosti velínu.		
<u>Projektové řešení</u> V PD nebylo řešeno, předpokládalo se využití a napojení do stávající funkční ležaté kanalizace.		
<u>Navrhované řešení</u> Tři stávající stoupačky kanalizace budou demontovány, provedeny nově z potrubí KG a propojeny vzájemně novým ležatým potrubím. Toto nové potrubí bude napojeno na stávající kanalizaci až u obvodového zdiva, v místech za propadlou částí stávající kanalizace.		
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.		
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.		

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor

.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa.....
Armádní Servisní, p.o.**Přílohy :**

- dle textu v úvodu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce


Cena změny + 8.767,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 8.767,00 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



30. 09. 2015

Datum:





ZL č. 22

ÚPRAVA STOUPAČKY PRO NÁPOJENÍ WC

VÝMĚRA PRO VÍCEPRÁCI 1,5 m

ZL č. 22



ÚPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE - VÝPOČET ÚMĚR

NAPOJENÍ STUPAČEK	$3 \times 0,6 = 1,8 \text{ m}$
LEŽATÁ KANAL. NA ŽDI	3,4 m
STUPAČKA NOVÁ	1,7 m
LEŽATÁ KANAL. V JEMI NOVÁ	1,6 m
Σ	<u>8,5 m</u>

VÝKAZ VÝMĚR


Stavba:
 Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice
 Objekt:
SO 33 Úprava stávajícího potrubí kanalizace
 Soupis:
 SO 33 ZTI

30.9.2015

Berčák, 777 785 689
 BOSS montáže, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

						Cena celkem	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	[CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							8 767
úprava stáv.potrubí kanalizace							6 286
1		72114-0806	demontáž stáv.potrubí litina DN 125	m	6	146	876
2		72117-3402	dodávka a montáž potrubí KG DN 125	m	8,5	332	2822
3		72114-0916	propojení na stáv.potrubí litina DN 125	sbr	1	590	590
4		72111-0962	propojení na stáv.potrubí KG DN 125	sbr	2	525	1050
5		SPC dod.materiálu	uchycení potrubí konzola 30/28/300	ks	4	192	768
6		SPC dod.materiálu	objímka prům. 125	ks	4	45	180
úprava stávající stupačky litina DN 125							2182
7		72114-0806	demontáž potrubí litina DN 125	m	1,5	146	219
8		72117-3402	dodávka a montáž potrubí KG DN 125	m	1,5	332	498
9		72114-0916	propojení na stáv.potrubí litina DN 125	sbr	1	590	590
10		SPC dod.materiálu	uchycení potrubí konzola 30/28/300	ks	1	192	192
11		SPC dod.materiálu	třímen závitový DN 125	ks	1	85	85
přesun hmot							299
12		99872-1201	přesun hmot	%	0,038	7870	299

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 23	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – zasedací místnost – úprava stěn a podlahy			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu Výkres – půdorys	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající otopná tělesa v zasedací místnosti jsou kryta dřevěným obložením, na kterém je upevněna lišta se sdělovacími kabely.			
<u>Projektové řešení</u> PD předpokládala, že stávající otopná tělesa jsou volně přístupná a budou pouze vyměněna za nová.			
<u>Navrhované řešení</u> Demontáž stávajícího obložení (zajistí uživatel), demontáž sdělovacích kabelů, výmalba a zapravení stěny, výměna pásu koberce v šířce 30 cm, zhotovení kobercové lišty na stěnu, dodávka a montáž kabelového žlabu na stěnu pod parapet a položení příp. nastavení (prodloužení) sdělovacích kabelů.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Výše uvedené práce jsou nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Navržený postup prací je nevhodnější řešení. S provedením souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V PD nebyla demontáž a zpětná montáž obložení parapetu řešena. S provedení prací souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

V rámci realizace nebyla řešena demontáž ani zpětná montáž obložení v zasedací místnosti na velitelství. Zpětným zakrytím nově instalovaných radiátorů by byl snížen jejich výkon, proto bylo na místě rozhodnuto o vyspravení omítek, výměně koberce v šířce cca 30 cm, provedení soklových lišt z koberce, dodání a montáži kabelových žlabů.

Podrobnosti viz. zápis z KD č. 13.


Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:


Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

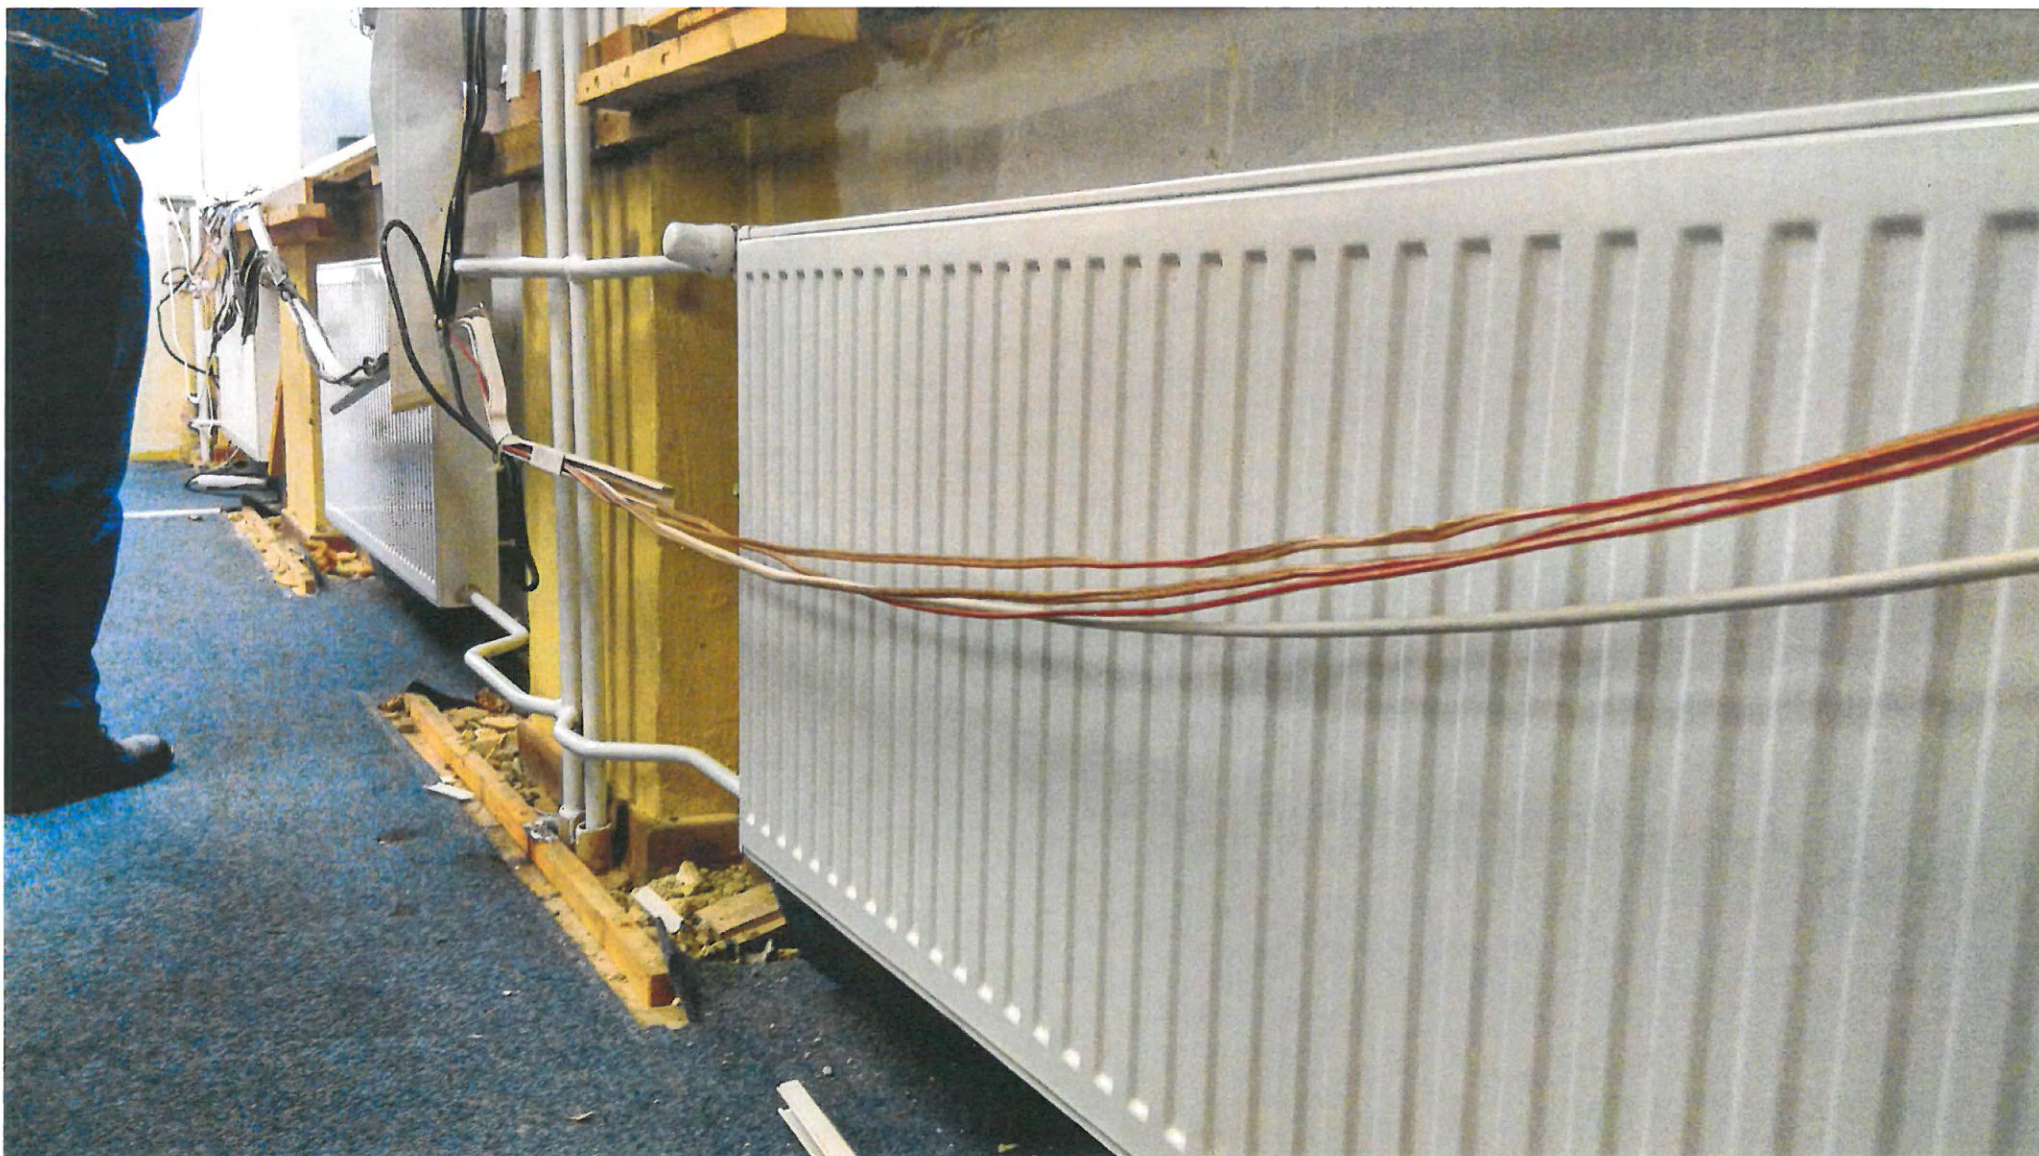

Oznámení změny č. 23 - fotodokumentace

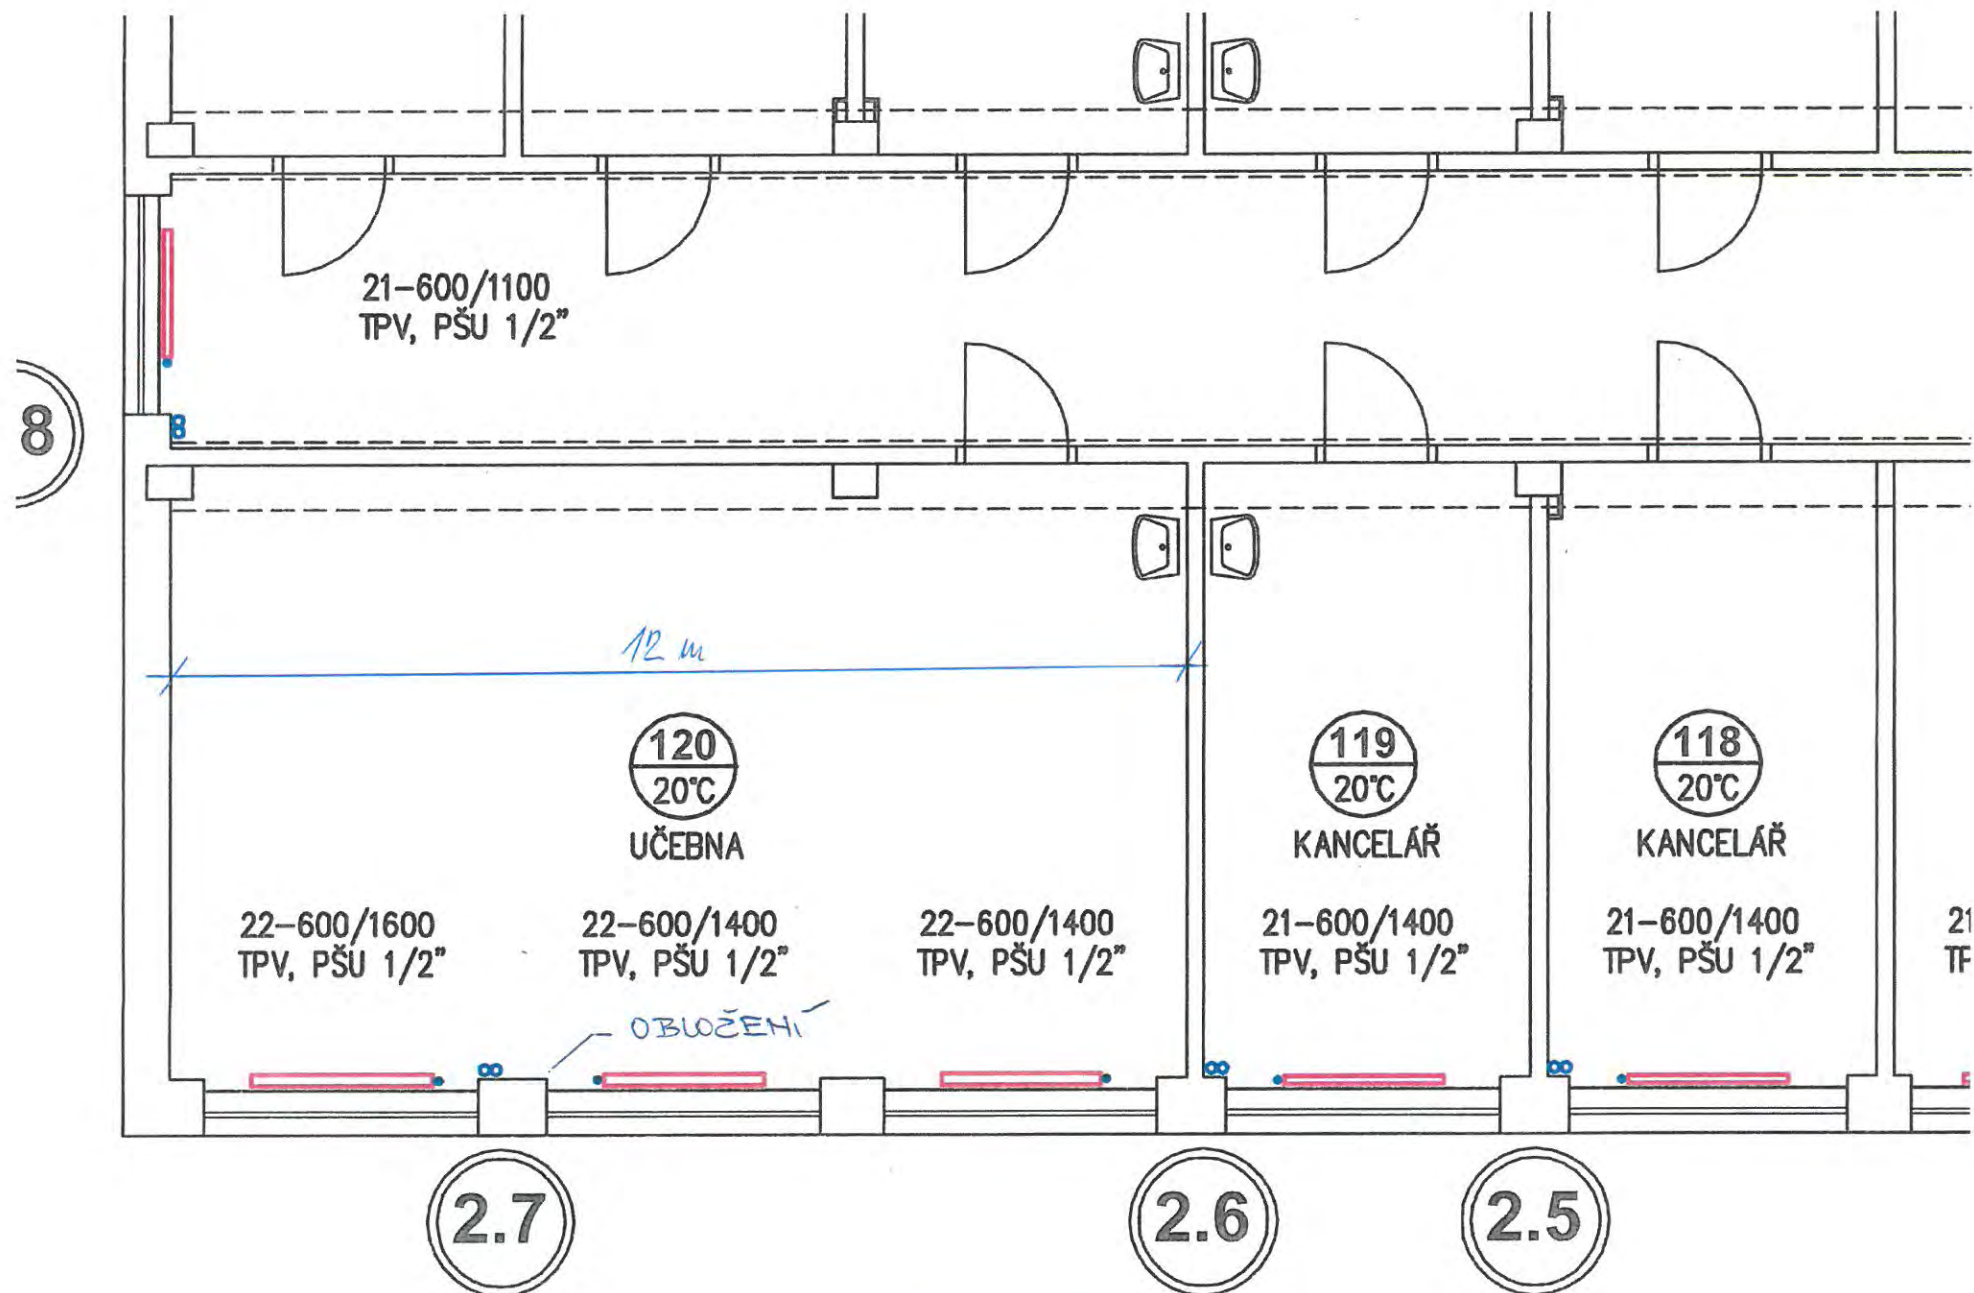

ZLč. 23-SO 033 - VEUTELSTVI I.N.P.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 23
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice		
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – zasedací místnost – úprava stěn a podlahy		
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015
Způsob odeslání / předání		
	poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 23
		Fotodokumentace skutečného provedení
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet
<u>Popis stávajícího stavu</u> Stávající otopná tělesa v zasedací místnosti jsou kryta dřevěným obložením, na kterém je upevněna lišta se sdělovacími kabely. <u>Projektové řešení</u> PD předpokládala, že stávající otopná tělesa jsou volně přístupná a budou pouze vyměněna za nová. <u>Navrhované řešení</u> Demontáž stávajícího obložení (zajistí uživatel), demontáž sdělovacích kabelů, výmalba a zapravení stěny, výměna pásu koberce v šířce cca 30 cm, zhotovení kobercové lišty na stěnu, dodávka a montáž kabelového žlabu na stěnu pod parapet a položení příp. nastavení (prodloužení) sdělovacích kabelů.		
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.		
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.		

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :


- dle textu v úvodu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce

Cena změny + 10.962,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 10.962,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015





Změnový list č. 23 - fotodokumentace

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:

30.9.2015

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt:

**Oprava stěn a podlahy v zasedací místnosti po demontáži obkladů radiátorů -
vícepráce**

Soupis:


SO 33

BOSS montáže, s.r.o.

SO 33

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							10 962
1			demontáž lišt a nosných profilů	sbr	1	700	700
2			demontáž a zpětná montáž otopných těles	ks	4	145	580
3			zednické zapravení stěn	sbr	1	860	860
4			malba stěn za otopnými tělesy	sbr	1	1150	1150
5			výměna koberce - pás š. 30 cm	sbr	1	1450	1450
6			soklová kobercová lišta	m	12	55	660
7			odvoz a likvidace stáv.dřevotřískových desek	sbr	1	980	980
8			doplnění PVC žlabů v zased.místnosti pro rozvod kabelů:				
9			kabelový žlab PVC 60 x 40 materiál + montáž	m	12	111	1332
10			kabelový žlab PVC 40 x 20 materiál + montáž	m	4	75	300
11			úprava stáv.kabelů 10 ks po 11 m	m	110	15	1650
12			podružný materiál (vruty, hmoždinky)	sbr	1	100	100
13			podružné pracovní výkony	sbr	1	650	650
14			úprava rozvaděče	ks	1	550	550
celkem bez DPH							10962

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 24	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – jídelna - omítky			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
	Výkres – půdorys		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V místnosti jídelny jsou na obvodových stěnách stávající omítky vyduté od zdiva; v současné době jsou opatřeny olejovými nátěry. Při montáži rozvodného potrubí došlo k ohoření olejových maleb i přesto, že byly zakrývány plechovými kryty. Dále při montáži otopných těles (konzol) došlo k opadávání stávajících omítek ve větších plochách.			
<u>Projektové řešení</u> PD předpokládala montáž otopných těles na stávající stěny bez úprav.			
<u>Navrhované řešení</u> Otlučení stávajících omítek a soklů. Zhotovení nových štukových omítek, výmalba primalexem, montáž nových soklů z keramických dlaždic.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Vzhledem ke špatnému stavu omítek, soudržných převážně díky olejovému nátěru, je potřeba tyto staré omítky odstranit a provést nové.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Jedná se o prostory se zvýšenými hygienickými nároky a provedením navrhovaných prací budou splněny hygienické požadavky na dané prostory. Souhlasím s provedením prací.

Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

S provedením prací souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Lokální vyspravení omítek nebylo možné provést, protože omítka opadávala už při styku s jakýmkoliv nářadím. Sokly byly částečně popraskané, některé dlaždice chyběly. Při částečných opravách na pohledových částech omítek pod parapety (v jídelně) bylo zvoleno vhodnější řešení - opravy omítek v ploše bez olejového nátěru, pouze s výmalbou. Zároveň byla sjednocena rovinnost omítek (místy se doplňovalo i 5-6 cm omítky).

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:


Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.






2015/07/08


Oznámení změny č. 24 - fotodokumentace


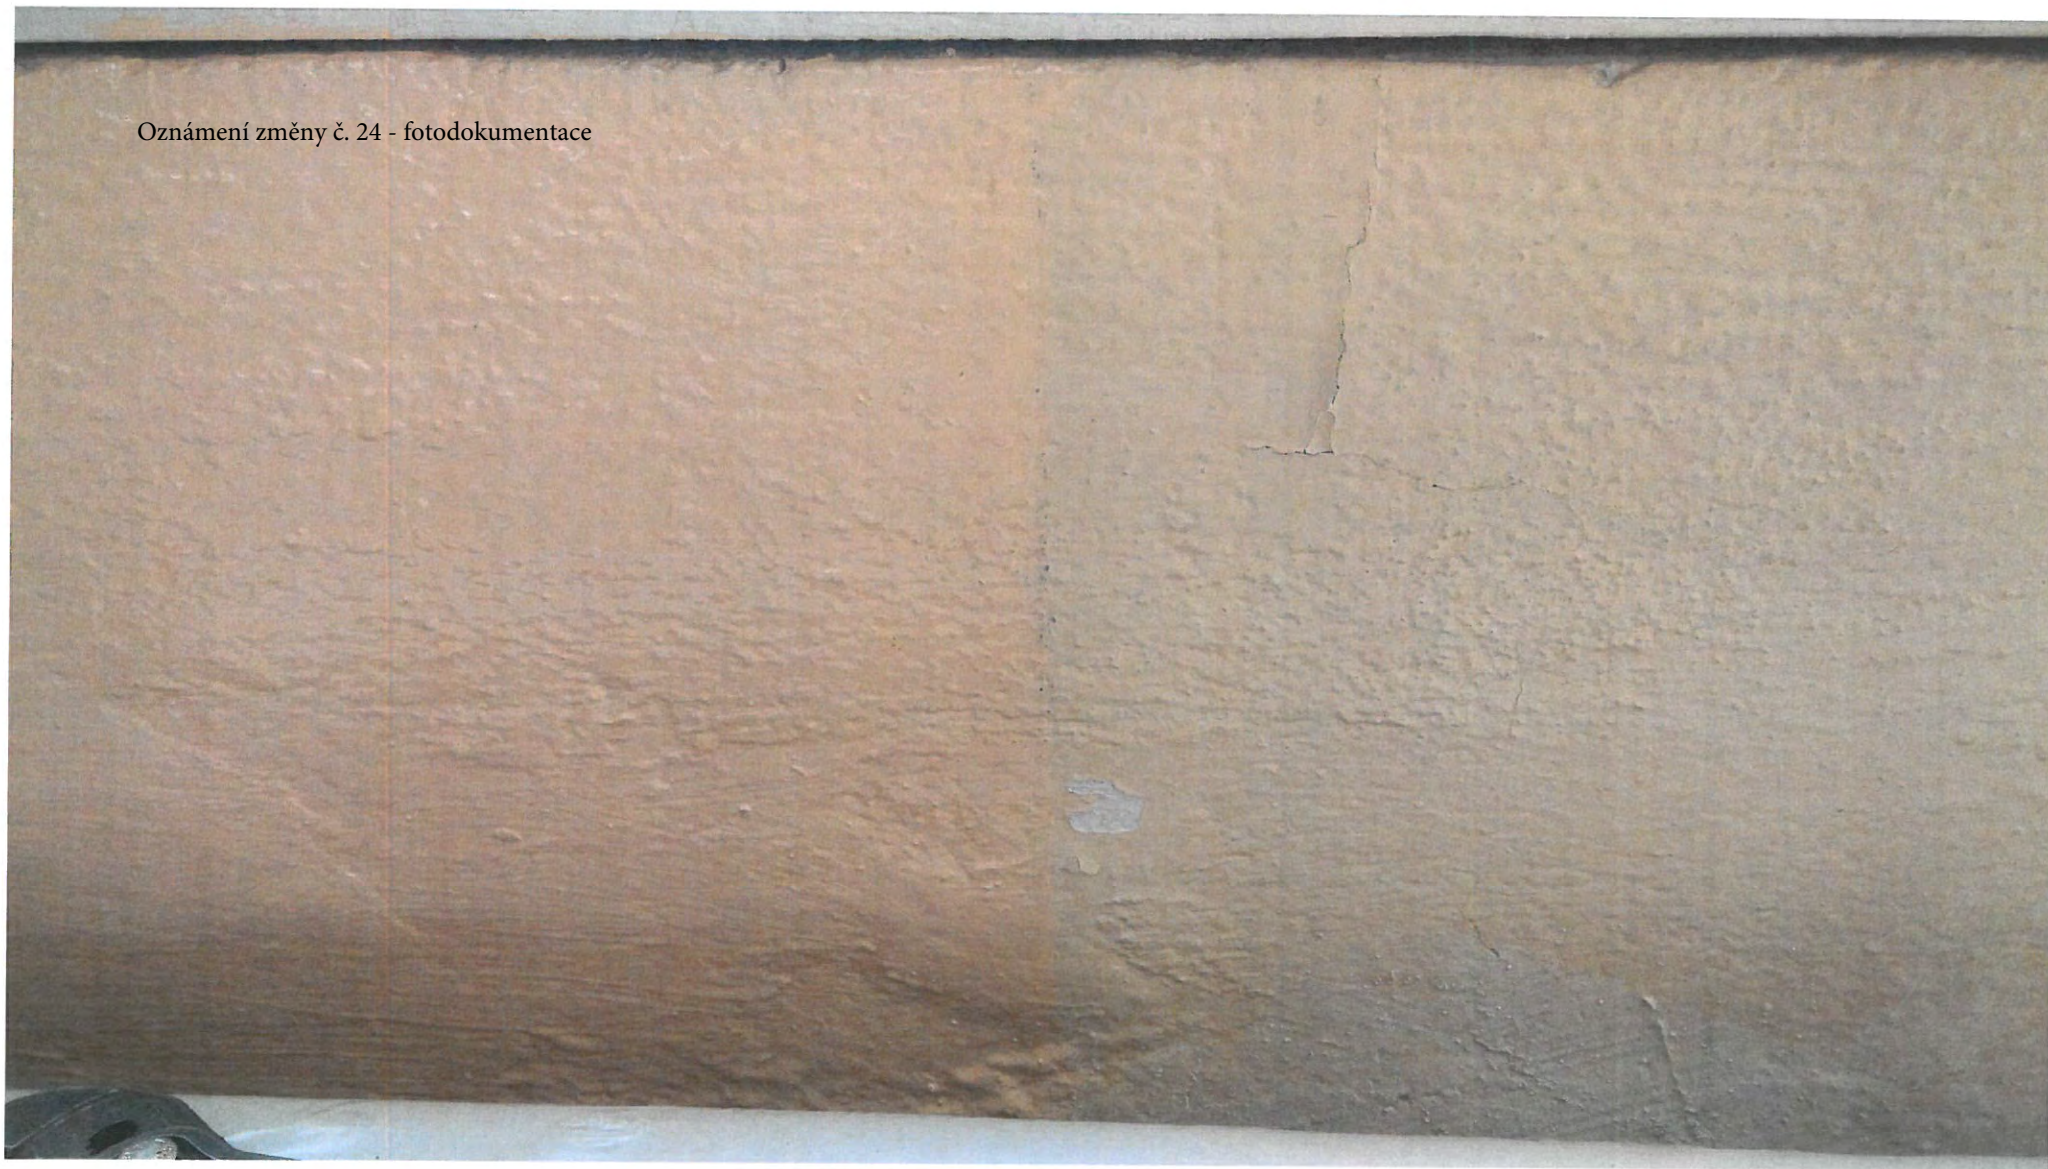


Oznámení změny č. 24 - fotodokumentace

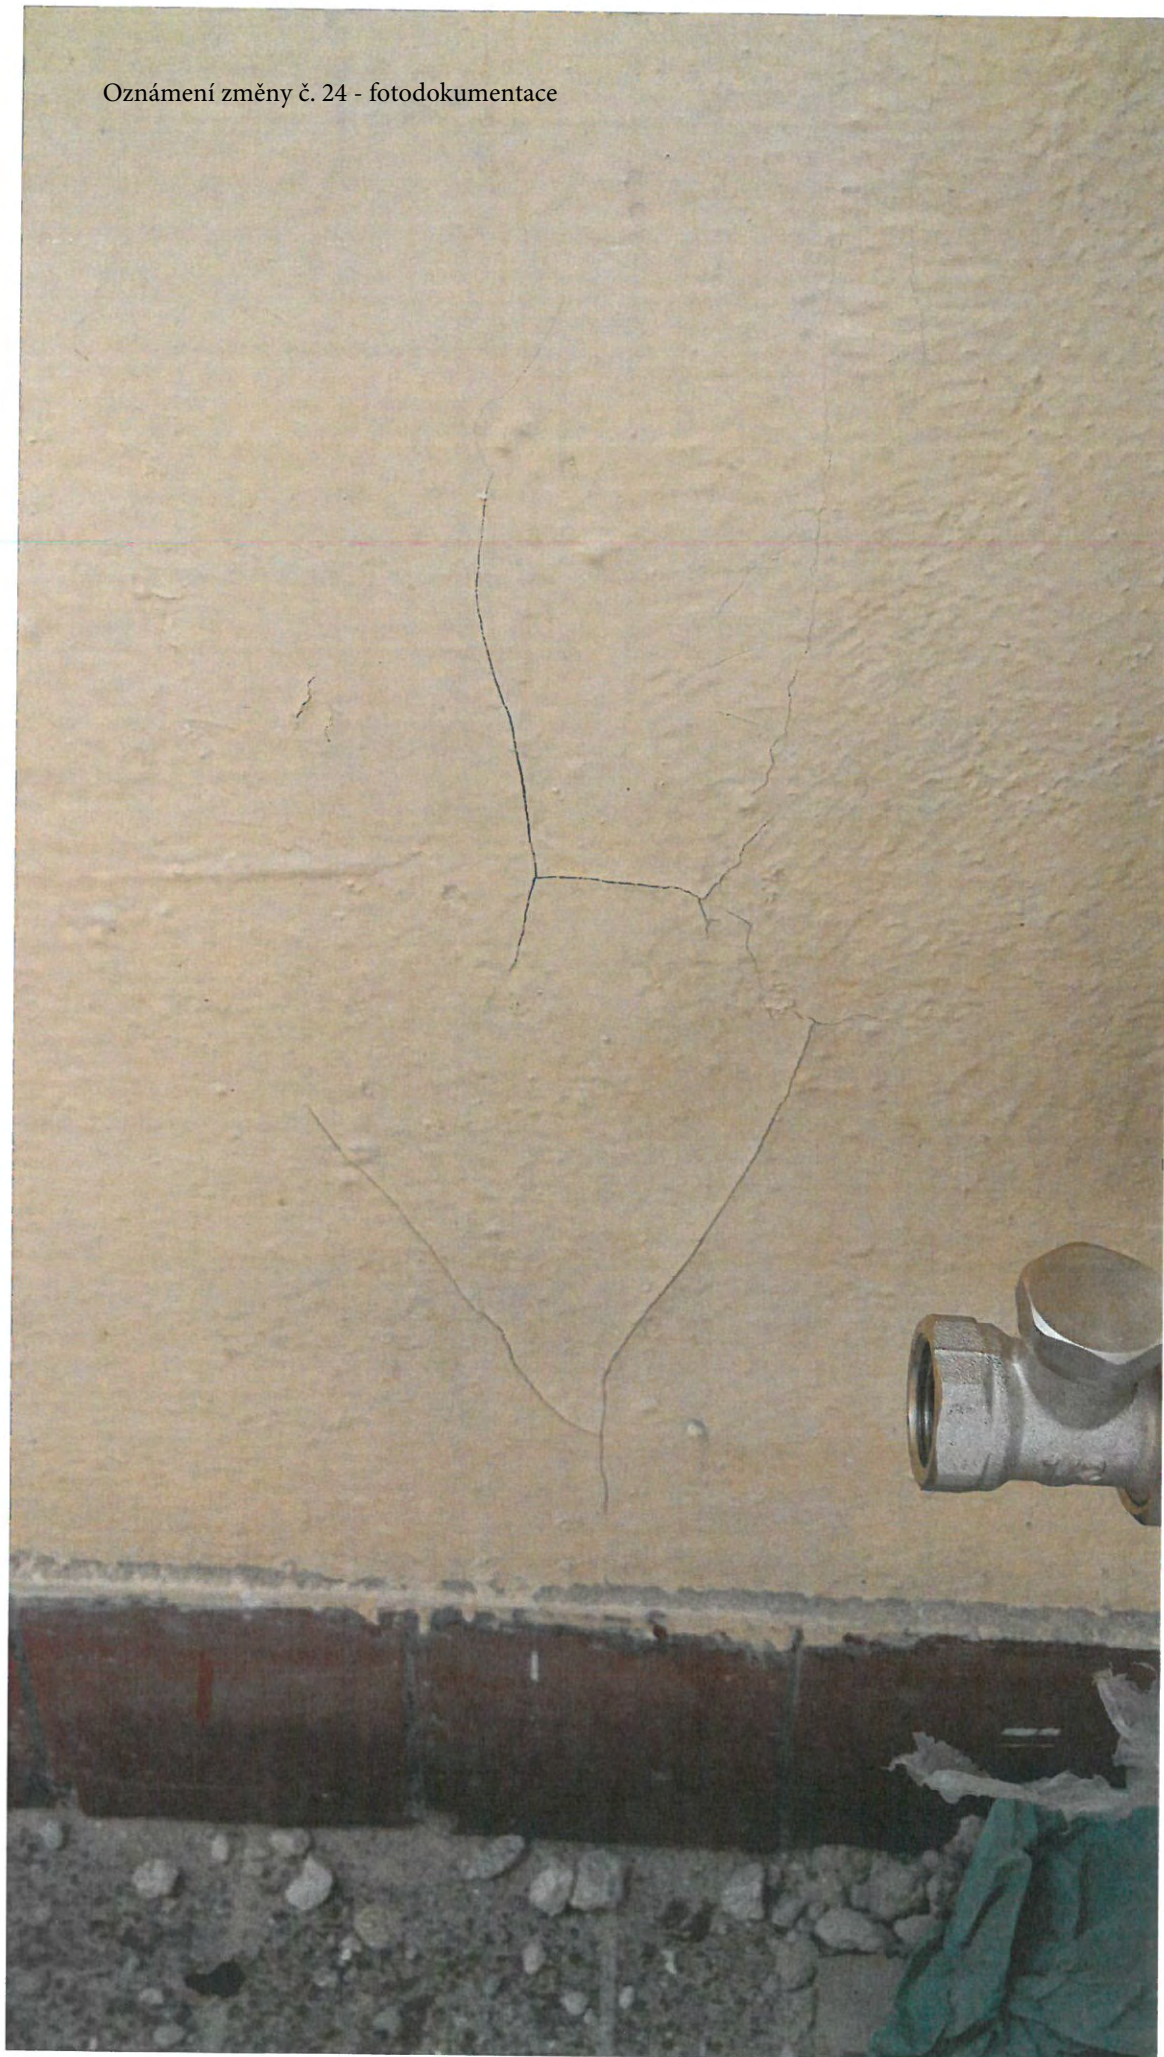


Oznámení změny č. 24 - výkres

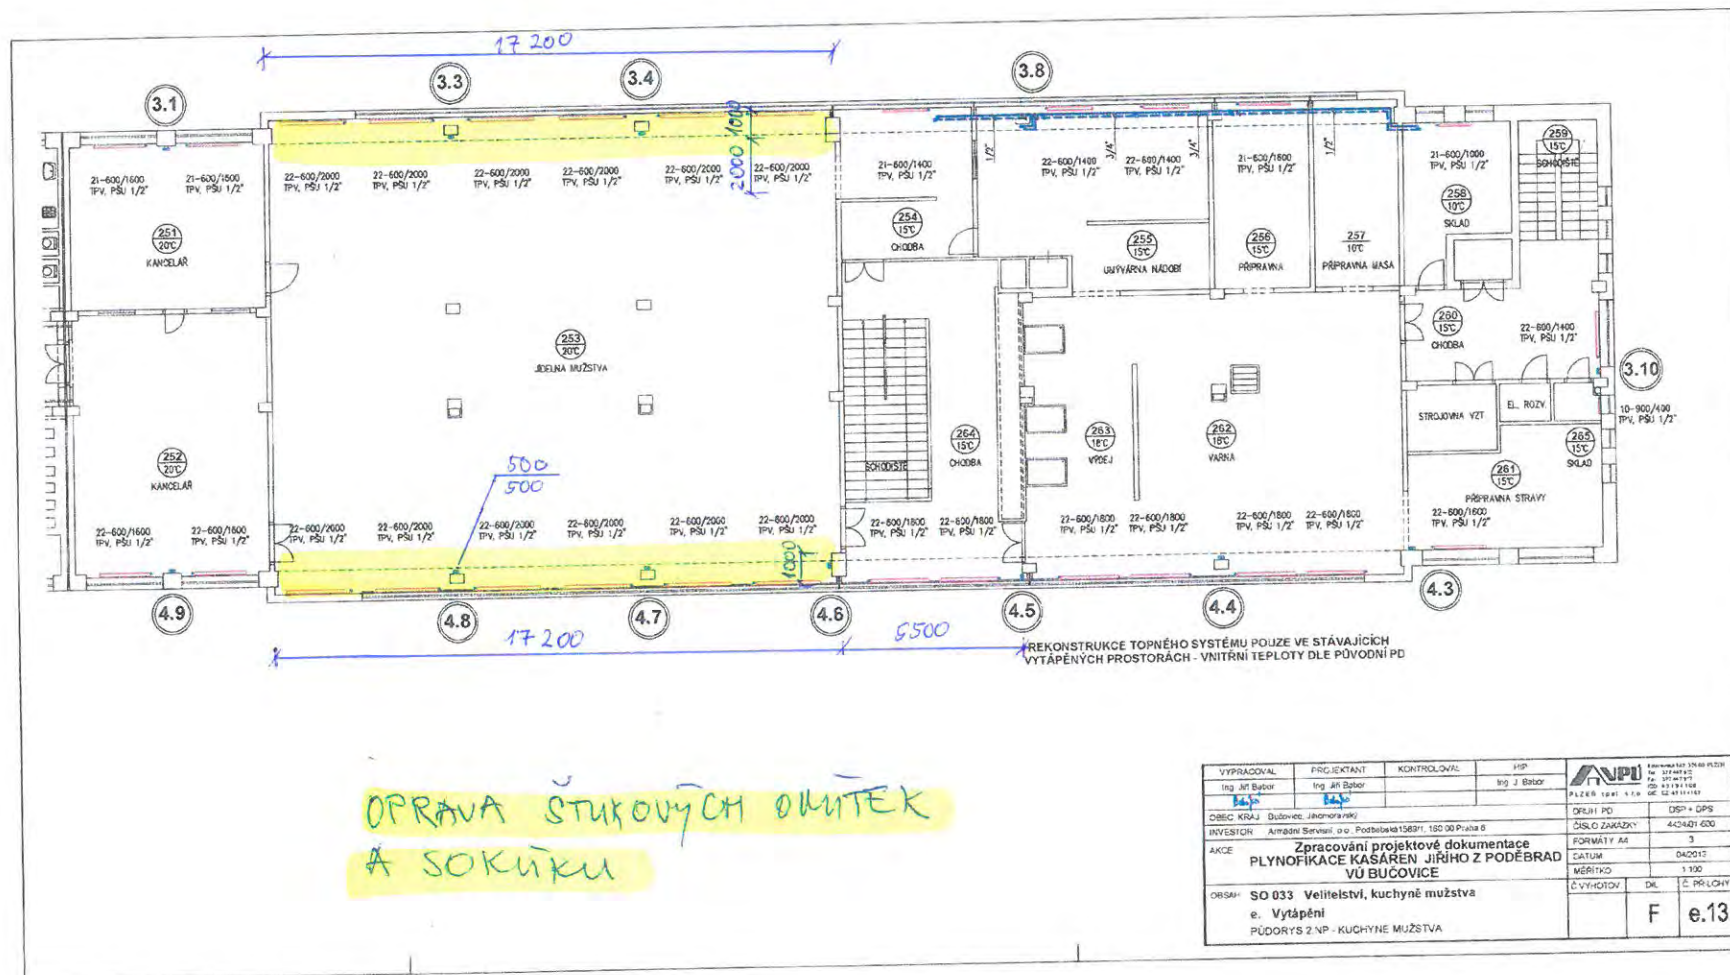


ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 24	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – jídelna – omítky				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015		
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 24		
		Fotodokumentace skutečného provedení		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V místnosti jídelny jsou na obvodových stěnách stávající omítky vyduté od zdiva; v současné době jsou opatřeny olejovými nátěry. Při montáži rozvodného potrubí došlo k ohoření olejových maleb i přesto, že byly zakrývány plechovými kryty. Dále při montáži otopných těles (konzol) došlo k opadávání stávajících omítek ve větších plochách. <u>Projektové řešení</u> PD předpokládala montáž otopných těles na stávající stěny bez úprav. <u>Navrhované řešení</u> Otlučení stávajících omítek a soklů. Zhotovení nových štukových omítek, výmalba primalexem, montáž nových soklů z keramických dlaždic.				
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.				
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.				

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- dle textu v úvodu

REKAPITULACE CENY:


Cena dle nabídky (vysoutěžená) není řešeno v nabídce

Cena změny + 42.579,39 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 42.579,39 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 11. 2015
Datum:	Datum:

07 č. 24

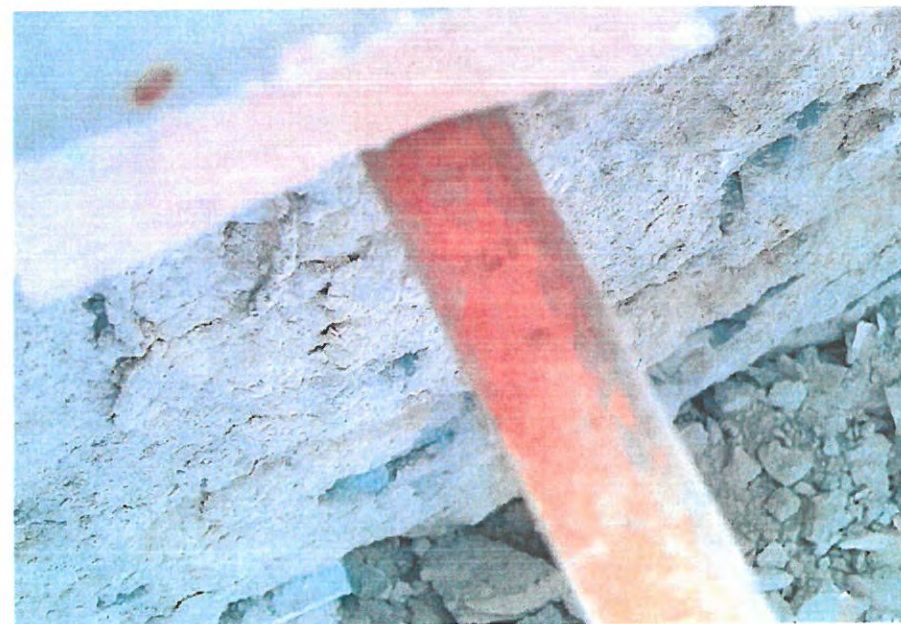



ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	
		30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 24 - SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva - jídelna - omítky
<i>Objekt</i>	SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	32 270,97 Kč	8 506,42 Kč	- Kč	40 777,40 Kč
specifikace	- Kč	1 802,00 Kč	- Kč	1 802,00 Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	32 270,97 Kč	10 308,42 Kč	- Kč	42 579,39 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		42 579,39 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	8 941,67 Kč
Σ		51 521,07 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)
stavba	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice
objekt	SO 033 (Velitelství, kuchyně)
dodatek	7 (oprava omítek jídelna skutečnost)
typ činnosti	HSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
61 (Úprava povrchů vnitřní)							
1		příplatek za tl. omítky	m2	54,319	185,00 Kč	10 049,02 Kč	
	1	((17,2+5,5+1,0)*0,85)*2*1,1		44,319			
	2	sloupy		10,000			
		0,5*0,5*1,0*4*5*2		0,000			
	3			39,900			
2	612 40 9991 /00	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah apod. po opravách	m	39,900	30,00 Kč	1 197,00 Kč	
	1	17,2+5,5+17,2		39,900			
3	612 45 6211 /00	Postřik izolaci nebo konstrukcí stěn maltou cementovou pro postřik	m2	54,319	20,00 Kč	1 086,38 Kč	
4	612 47 3182 /00	Omítka vnitřní vápenocementovou maltou ze suchých směsí zdíva štuková strojní	m2	54,319	218,50 Kč	11 868,70 Kč	
Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)							24 201,10 Kč
62 (Úprava povrchů vnější)							
5	620 47 1811 /00	Nátěr základní penetrační silikon Baumit	m2	54,319	24,50 Kč	1 330,82 Kč	
6	620 99 1121 /00	Zakrývání výplní vnějších otvorů, zábradlí, oplechování apod. z lešení	m2	39,900	26,00 Kč	1 037,40 Kč	
	1	(17,2+5,5+17,2)*1		39,900			
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)							2 368,22 Kč
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							
7	978 01 3191 /00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 100%	m2	54,319	43,00 Kč	2 335,72 Kč	
Σ díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							2 335,72 Kč
979 (Odvoz sutí)							
8	979 01 1111 /Z0	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	2,499	153,50 Kč	383,55 Kč	
9	979 01 1121 /Z0	Svislá doprava sutí za každé další podlaží	t	2,499	107,50 Kč	268,61 Kč	
10	979 08 1111 /00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	2,499	265,00 Kč	662,15 Kč	
11	979 08 1121 /00	Odvoz sutí na skládku -příplatek za každý další 1km	t	39,979	9,90 Kč	395,79 Kč	
12	979 08 2111 /Z0	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorov do 10m	t	2,499	155,00 Kč	387,29 Kč	
13	979 09 8133 /00	Poplatek za skládku (keramický materiál + příměs<10%)	t	2,499	292,50 Kč	730,86 Kč	
Σ díl 979 (Odvoz sutí)							2 828,25 Kč
99 (Přesun hmot)							
14	998 01 1002 /Z0	Přesun hmot	t	2,636	204,00 Kč	537,70 Kč	
Σ díl 99 (Přesun hmot)							537,70 Kč
Σ							32 270,97 Kč


rekapitulace

61	Úprava povrchů vnitřní	24 201,10 Kč
62	Úprava povrchů vnější	2 368,22 Kč
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot	2 335,72 Kč
979	Odvoz sutí	2 828,25 Kč
99	Přesun hmot	537,70 Kč
Σ		32 270,97 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)				
stavba		Plynofikace kasáren VÚ Bučovice				
objekt		SO 033 (Velitelství, kuchyně)				
dodatek		7 (oprava omítek jídelna skutečnost)				
typ činnosti		PSV				

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
735 (Otopná tělesa)							
1	735 14 1111 /00	Montáž těles na stěnu lamelová Koralux... výšky tělesa do 1400 mm	ks	14,000		113,00 Kč	1 582,00 Kč
2	735 15 1811 /00	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého stavební délky do 1500mm	ks	14,000		56,50 Kč	791,00 Kč
Σ díl 735 (Otopná tělesa)							2 373,00 Kč
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)							
3	771 44 1810 /00	Demontáž soklíků z obkladaček hutných rovných - kladených do malty	m	47,900		16,00 Kč	766,40 Kč
	1	17,2+5,5+17,2+4*0,5*4		47,900			
4	771 44 4113 /00	Montáž obkladu soklíků -hutný rovný lepený Superflex výšky do 120mm	m	47,900		50,50 Kč	2 418,95 Kč
	1	17,2+5,5+17,2+4*0,5*4		47,900			
5	771 59 1115 /00	Spárování dlažby silikonem	m	47,900		19,80 Kč	948,42 Kč
6	998 77 1101 /Z0	Přesun hmot podlahy z dlaždic objekt výšky do 6m	t	0,031		263,00 Kč	8,09 Kč
Σ díl 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)							4 141,86 Kč
784 (Malby)							
7	784 45 3641 /00	Malba PRIMALEX disperzní dvojnásobný s pen.nátěr, fungicidní bílé místnosti výšky do 3,8m	m2	55,000		35,50 Kč	1 952,50 Kč
8	597 63 0075	Dlaždice Taurus-Granit 77S 300x300x9	m2	5,269		342,00 Kč	1 802,00 Kč
	1	47,9*0,1*1,1		5,269			
9	998 78 6101 /Z0	Přesun hmot	t	0,125		311,50 Kč	39,07 Kč
Σ díl 784 (Malby)							3 793,56 Kč
Σ							10 308,42 Kč
rekapitulace							
	735	Otopná tělesa		2 373,00 Kč			
	771	Podlahy z dlaždic a obklady		4 141,86 Kč			
	784	Malby		3 793,56 Kč			
Σ				10 308,42 Kč			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 25	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – vytápění kanceláří 1. PP			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Výkres – půdorys		
	Požadavek Provozního střediska AHNM		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V místnostech 1. PP v části velitelství bylo vedeno potrubí otopné páry a vratného kondenzátu, které vytápělo stávající kanceláře (tepelnými ztrátami rozvodu).			
<u>Projektové řešení</u> Projektanti se v průběhu zpracování nedostali do všech místností 1. PP objektu SO 033 a dle předané dokumentace stávajícího stavu bylo uvažováno se skladovými místnostmi. Nikdo v době zpracování PD nepožadoval samostatné vytápění těchto prostor.			
<u>Navrhované řešení</u> Do místností v 1. PP budou osazena zánovní otopná tělesa, která budou demontována při rekonstrukci vytápění 1. a 2. NP velitelství. Tato otopná tělesa budou napojena na nový rozvod teplovodního vytápění. Projektant provede kontrolní přepočty dimenzí potrubí nových rozvodů.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Zhotovitel doporučuje provést instalaci zánovních otopných těles, protože řešením jako samostatná akce a zásahem do budované topné soustavy by mohlo dojít k nevyvážení současně navržené otopné soustavy, ztrátě záruk, apod.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Souhlasím s navrhovaným řešením a provedením prací.

Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V PD byla řešena pouze výměna stávajících otopných těles za nové v důsledku změny media. Výše uvedené prostory byly vytápěny tepelnými ztrátami parního rozvodu. Nová otopná soustava tepelně zaizolovaná ve smyslu Vyhlášky 193/2007 Sb. vytápění nezajistí.

S navrhovaným řešením souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Radiátory v 1. NP byly zánovní a po dohodě a se souhlasem všech zúčastněných stran (objednatel, zhotovitel, provozní středisko, TDS i projektant) bude provedeno navržené řešení.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.


Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

Oznámení změny č. 25 - výkres

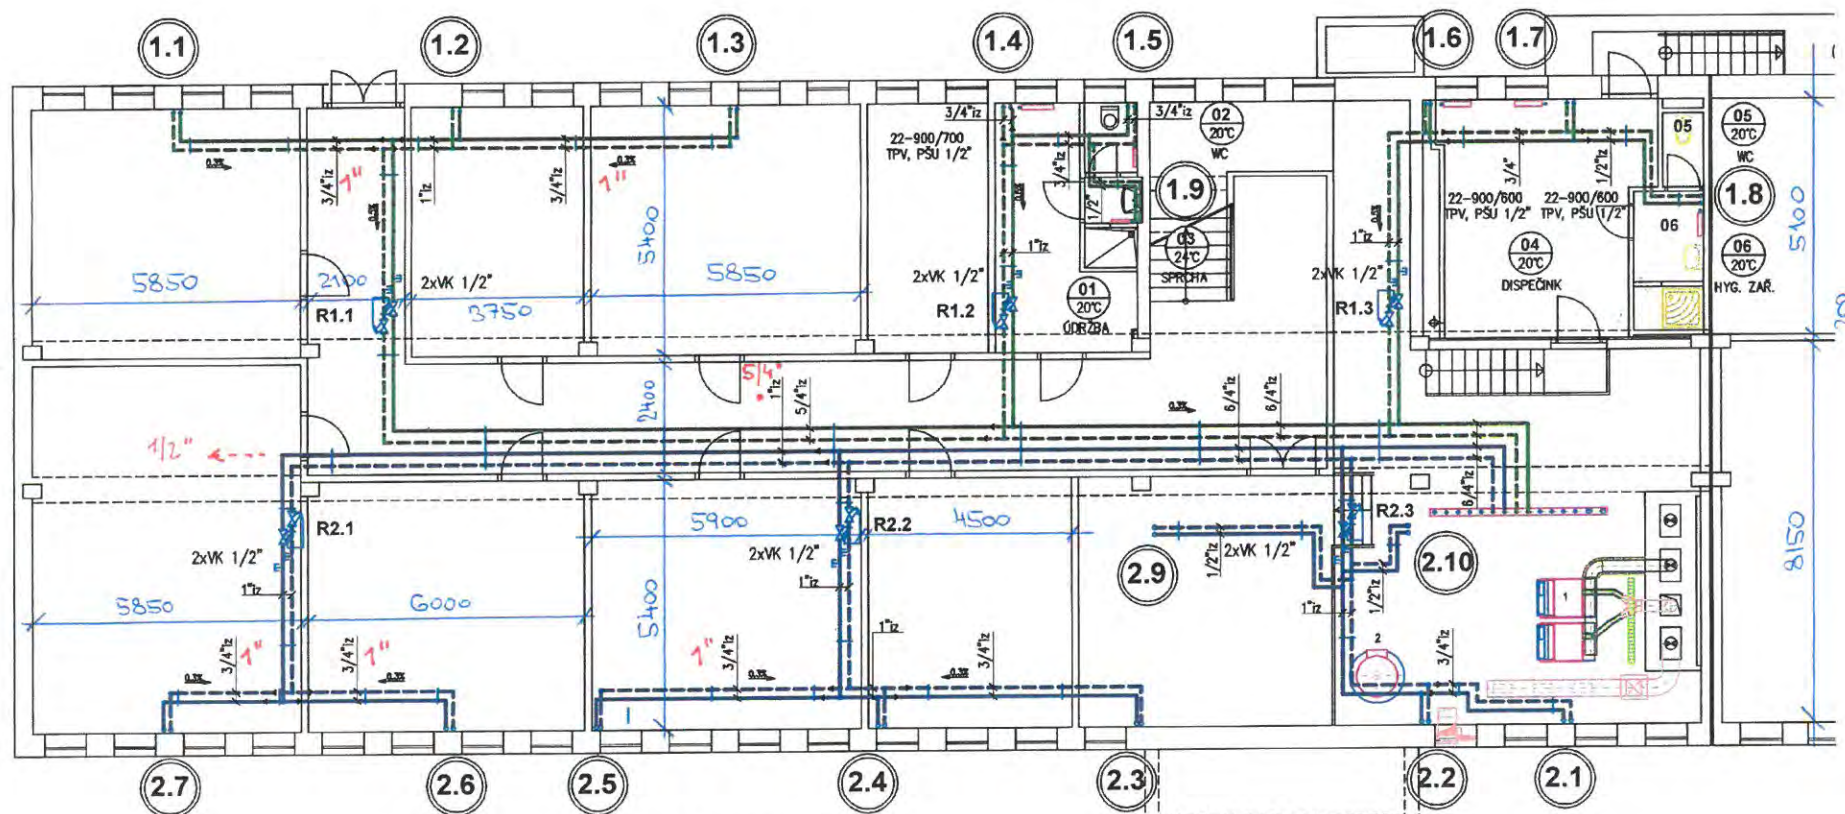

ZAPOJENÍ REGULÁTORŮ TLAKOVÉ DIFERENCE



R1.1 STAP DN 25
STAD DN 25 pol. 2.0
R1.2 STAP DN 20
STAD DN 20 pol. 2.5
R1.3 STAP DN 20
STAD DN 15 pol. 2.8

R2.1 STAP DN 20
STAD DN 20 pol. 2.7
R2.2 STAP DN 20
STAD DN 20 pol. 2.4
R2.3 STAP DN 20
STAD DN 20 pol. 2.1

VEDENO V TRASE STÁVAJÍCÍCH
DEMONTOVANÝCH ROZVODŮ
DLE POTŘEBY OSADIT ODVZDUŠŇOVACÍ
A VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY

• JEDINEČNÉ POKYBY PRO ZL. 25

VYPRACOVAL Ing. Jiří Babor	PROJEKTANT Ing. Jiří Babor	KONTROLOVAL	HIP Ing. J. Babor	ANPÚ Kosovská 162, 328 00 PLZEŇ Tel: 377 447 612 Fax: 377 447 617 IČO: 491 641 803 DIČ: CZ 491 641 803
OBEK, KRAJ: Bučovice, Jihomoravský	DRUH PD	DSP + DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY	4424/01-600
INVESTOR: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6	FORMÁTY A4	2	DATUM	04/2013
AKCE: Zpracování projektové dokumentace PLYNOFIKACE KASÁREN JIRIHO Z PODĚBRAD VÚ BUČOVICE	MĚŘÍTKO	1:100	Č. VYHOTOV.	DÍL
OBSAH: SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva e. Vytápění PŮDORYS 1.PP - VELITELSTVÍ - PŮVODNÍ PD	Č. PŘÍLOHY	F	e.9	

Provozní středisko 0624
Vyškov

V Bučovicích dne 3. června 2015
Výtisk č: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Monika Rešl Kletečková
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice

Věc: Požadavek


Na základě zápisu z kontrolního dne č. 10, předkládám žádost a požaduji na budově č. 33 v místnostech, kde je osazen registr, dodat a osadit nová topná tělesa (m. č. 13 a 4 v 1 PP - velitelství). V ostatních místnostech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (1 PP – velitelství) je nezbytné, aby projektant zajistil přepočít topné soustavy. Konvektory dodá PS 0624 Vyškov. Přepočít topné soustavy požadujeme na užívání místností jako kanceláře.

V místnostech (dle nového značení PD P5 – sklad, P4 – sklad) požadujeme provést opravu betonové podlahy včetně finálních cementových stěrek, provést opravu vnitřních omítek stěn a stropů a demontáž, dodání a osazení plastových oken – 7 ks, opravy el. instalace a výmalbu. Tyto prostory byly předány do užívání a provozování Armádní Servisní, p. o. Praha a po ukončení plynofikace bude nezbytné je předat AHNM Praha, PS 0624 Vyškov.

Vyřizuje:
Bc. Jana Dufková, DiS.
Tel. 973 454 769
Petr Diviš
Tel. 973 454 773

Vedoucí PS 0624 Vyškov
Ing. Aleš Pinkas



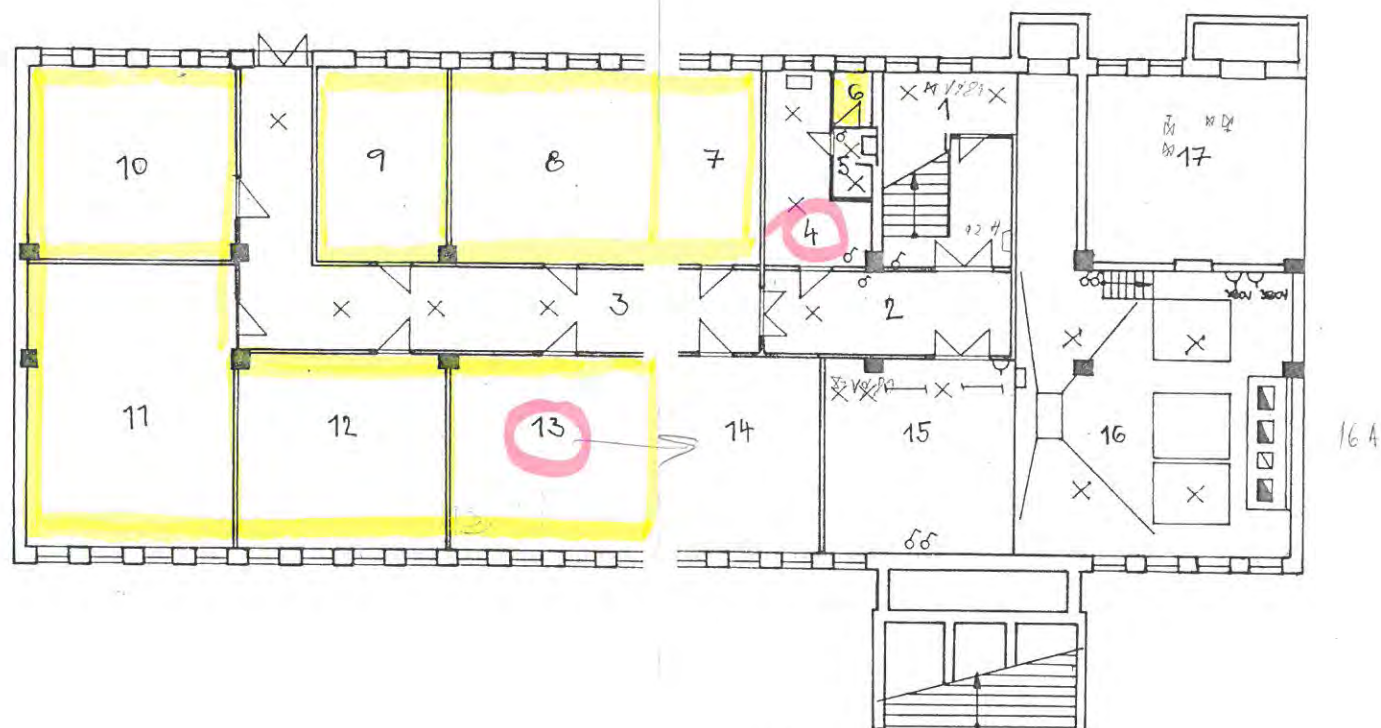

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M ²	Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M ²
1	SCHODIŠTĚ	18,60	10	SKLAD	32,00
2	CHODBA	15,90	11	SKLAD	46,30
3	CHODBA	46,70	12	KANCELAR	33,00
4	ŠATNA - KOTELNA	12,60	13	KANCELAR	32,50
5	SOC. ZAŘÍZENÍ	2,20	14	KANCELAR	24,50
6	WC	1,60	15	KOTELNA	29,40
7	KANCELAR	14,50	16	KOTELNA	23,40
8	KANCELAR	32,50	17	UHELNA	32,20
9	SKLAD	20,80	16	RESURČNÍ	61,01

 NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
 PŘEPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 25
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice		
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – vytápění kanceláří 1. PP		
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015
Způsob odeslání / předání		
	poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 25
		Fotodokumentace skutečného provedení
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet
		Výkres skutečného stavu
<u>Popis stávajícího stavu</u> V místnostech 1. PP v části velitelství bylo vedeno potrubí otopné páry a vratného kondenzátu, které vytápělo stávající kanceláře (tepelnými ztrátami rozvodu). <u>Projektové řešení</u> Projektanti se v průběhu zpracování nedostali do všech místností 1. PP objektu SO 033 a dle předané dokumentace stávajícího stavu bylo uvažováno se skladovými místnostmi. Nikdo v době zpracování PD nepožadoval samostatné vytápění těchto prostor. <u>Navrhované řešení</u> Do místností v 1. PP budou osazena zánovní otopná tělesa, která budou demontována při rekonstrukci vytápění 1. a 2. NP velitelství. Tato otopná tělesa budou napojena na nový rozvod teplovodního vytápění. Projektant provede kontrolní přepočty dimenzí potrubí nových rozvodů.		
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.		
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.		

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :


- dle textu v úvodu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) - 11.400,00 Kč

Cena změny + 63.189,32 Kč


(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+ 51.789,32 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015

SO 33 - 1.PP

ZL č. 25

Změnový list č. 25 - fotodokumentace

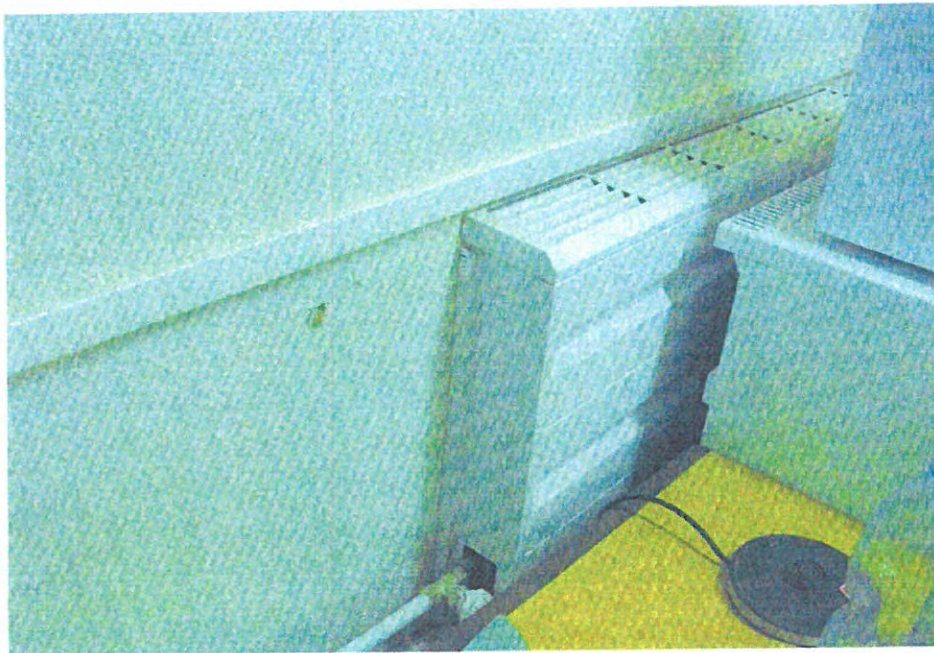

SO_033: vytápění kanceláří v 1.PP – ASPO

0,00

SO_033: vytápění kanceláří v 1.PP – AHNM

713: Izolace tepelné

15.	H	713-102	Pol. 8	D. PIPO ALS fezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 27/40 - potrubí 3/4"	m	- 50,0	-	- 50,0	72,00	-3 600,00
-----	---	---------	--------	--	---	--------	---	--------	-------	-----------

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

107.	SP	564lh2040-006	733111104	Potrubi z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 20	m	- 40,0	-	- 40,0	195,00	-7 800,00
------	----	---------------	-----------	---	---	--------	---	--------	--------	-----------

celkem méněpráce bez DPH

- 11 400,00

30.9.2015

BOSS montáže, s.r.o.

ZL č. 25 - SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva - vytápění kanceláří 1. PP

Poř. Typ Kód	Alter. kód	Popis	MJ	měra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena		
SO_033: vytápění kanceláří v 1.PP – ASPO								8 215,50		
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								2 177,31		
5.	SP	564Az0030-002	998733201	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	%	3,19	—	3,19	21,10	67,31
7.	SP	564Ih2040-004	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 15	m	10,0	—	10,0	175,00	1 750,00
14.	SP	564Ih2160-004	733113113	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15	kus	4,0	—	4,0	70,00	280,00
16.	SP	564Iw4010-002	733190107	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 40	m	10,0	—	10,0	8,00	80,00
734: Ústřední vytápění - armatury								1 332,59		
19.	SP	565Az0030-002	998734201	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m	%	0,27	—	0,27	13,29	3,59
20.	SP	565Xh0284-004	734222812	Ventily regulační závitové termostatické V-exakt - přímé G 1/2"	kus	2,0	—	2,0	225,00	450,00
22.	SP	565Xh0324-004	734261233	Šroubení uzavírací, regulační s vypouštěním Regulux - přímé, G 1/2	kus	2,0	—	2,0	162,00	324,00
24.	SP	565Xh0362-004	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí - PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini), G 1/2	kus	1,0	—	1,0	105,00	105,00
25.	K		734291123	Hlavice termostatická kapalinová	kus	2,0		2,0	225,00	450,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								4 325,60		
26.	SP	566Az0030-002	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 6 m	%	2,26	—	2,26	42,30	95,60
28.	SP	566Xh0050-058	735151493	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik, typ 21 - výška tělesa 900 mm, délka 600 mm	kus	1,0	—	1,0	1 730,00	1 730,00
29.	SP	566Xh0060-134	735151597	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik, typ 22 - výška tělesa 900 mm, délka 1000 mm	kus	1,0	—	1,0	2 500,00	2 500,00
783: Nátěry								380,00		
31.	SP	539Vv4030-012	783425422	Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA,) - DN 15 povrch polomatný, 1× antikorozní, 1× základní a 2× email	m	10,0	—	10,0	38,00	380,00
SO_033: vytápění kanceláří v 1.PP – AHNM								54 973,83		
713: Izolace tepelné								4 668,59		
1.	SP	219Az0030-002	998713201	Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 6 m	%	1,77	—	1,77	10,50	18,59
3.	H	713-103		D PIPO ALS řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL fólií 34/50 - potrubí 1"	m	25,0	—	25,0	85,00	2 125,00
4.	H	713-104		D PIPO ALS řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL fólií 42/60 - potrubí 5/4"	m	25,0	—	25,0	101,00	2 525,00
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								31 910,34		
6.	SP	564Az0030-002	998733201	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	%	3,19	—	3,19	233,65	745,34
8.	SP	564Ih2040-004	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 15	m	80,0	—	80,0	175,00	14 000,00
10.	SP									
11.	SP									
12.	SP	564Ih2040-008	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 25	m	25,0	—	25,0	245,00	6 125,00
13.	SP	564Ih2040-010	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 32	m	25,0	—	25,0	340,00	8 500,00
15.	SP	564Ih2160-004	733113113	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15	kus	26,0	—	26,0	70,00	1 820,00
17.	SP	564Iw4010-002	733190107	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 40	m	90,0	—	90,0	8,00	720,00
734: Ústřední vytápění - armatury								8 819,75		
19.	SP	565Az0030-002	998734201	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m	%	0,27	—	0,27	87,96	23,75
21.	SP	565Xh0284-004	734222812	Ventily regulační závitové termostatické V-exakt - přímé G 1/2"	kus	13,0	—	13,0	225,00	2 925,00
23.	SP	565Xh0324-004	734261233	Šroubení uzavírací, regulační s vypouštěním Regulux - přímé, G 1/2	kus	13,0	—	13,0	162,00	2 106,00
25.	SP	565Xh0362-004	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí - PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini), G 1/2	kus	8,0	—	8,0	105,00	840,00
26.	K		734221683	Hlavice termostatická kapalinová	kus	13,0		13,0	225,00	2 925,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								6 115,15		
27.	SP	566Az0030-002	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 6 m	%	2,26	—	2,26	59,80	135,15
30.	SP	566Xh0180-006	735419125	Montáž konvektorů - s osazením na konzoly, stavební délka 1000 mm	kus	13,0	—	13,0	460,00	5 980,00
783: Nátěry								3 460,00		
32.	SP	539Vv4030-012	783425422	Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA,) - DN 15 povrch polomatný, 1× antikorozní, 1× základní a 2× email	m	80,0	—	80,0	38,00	3 040,00
33.	SP			Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÜFA,) - DN 20 povrch polomatný, 1× antikorozní, 1× základní a 2× email	m	10,0	—	10,0	42,00	420,00


celkem méněpráce bez DPH

63 189,32


30.9.2015

BOSS montáže, s.r.o.

Změnový list č. 25 - výkres skutečného provedení

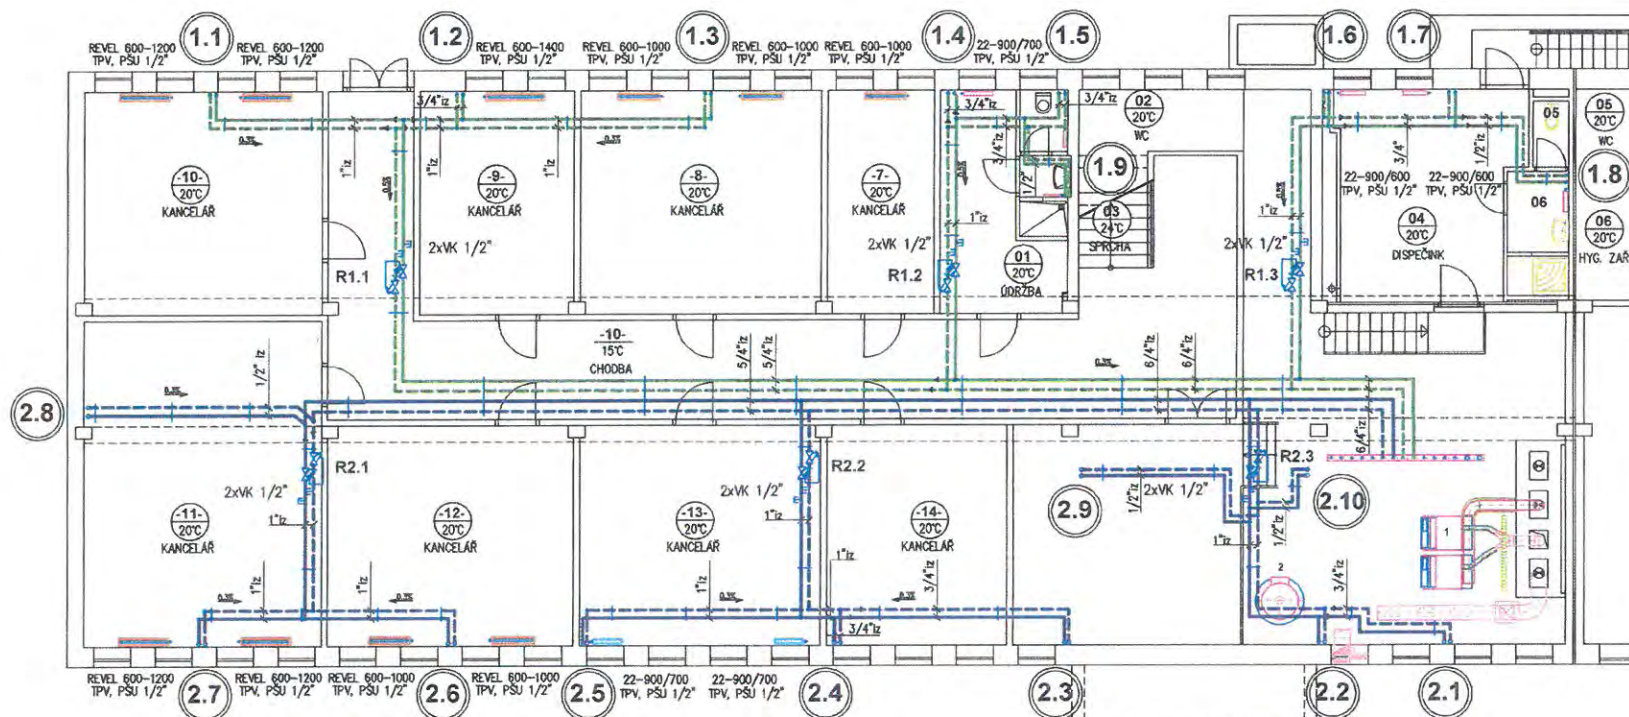


ZAPOJENÍ REGULÁTORŮ TLAKOVÉ DIFERENCE



R1.1	STAP DN 25	R2.1	STAP DN 20
R1.2	STAD DN 20	R2.2	STAD DN 20
R1.3	STAD DN 20	R2.3	STAD DN 20
	STAD DN 15 pol. 2,8		STAD DN 20 pol. 2,1

VEDENO V TRASE STÁVAJÍCÍCH
DEMONTOVANÝCH ROZVODŮ
DLE POTŘEBY OSADIT ODVZDUŠŇOVACÍ
A VYPUSŤECÍ ARMATURY

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP		
Ing. J. Babor	Ing. J. Babor		Ing. J. Babor		
OBEK, KRAJ: Bušovice, Jihomoravský				DRUH PD	změna stavby před dokončením
INVESTOR: Armádní Servisní, p. o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6				FORMÁT A4	Z
AKCE: Zpracování projektové dokumentace PLYNOFIKACE KASÁREN JIŘÍHO Z PODĚBRAD VŮ BUČOVICE				DATUM	05. 2015
				MĚŘITKO	1 : 100
OBSAH: SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva e. Vytápění				Č. VÝHOTOV.	DIL
PŮDORYS 1.PP - VELITELSTVÍ					Č. PŘÍLOH
NOVÝ STAV				F	e.9

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 26	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – stavební úpravy – místnost P3, P4, P5			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Fotodokumentace stávajícího stavu		
	Požadavek Provozního střediska AHNM		
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Prostory po demontáži výměníkové stanice a stávající místnosti ohřevu TUV a uhelný jsou ve špatném technickém stavu. Vnitřní omítky jsou narušené, zvětralé a převážně opadané. U nosných průvlaků stropů jsou betony opadané a místy je viditelná obnažená nosná výztuž průvlaku. Stávající podlahy jsou vyspádované do vpusť a jsou narušené a zvětralé. Stávající ocelová okna v těchto místnostech jsou zrezivělá natolik, že není možná repase, dále chybí křídla oken a část skel.			
<u>Projektové řešení</u>			
V PD je řešena pouze nejnutnější oprava omítek po zazdění otvoru stávajících dveří a podlah po demontážích technologie.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Provozní středisko požaduje provedení opravy stávajících omítek stropů, stěn, sanaci nosných průvlaků stropu a betonáž podlah. Nad rámec řešený v PD – budou provedeny kompletní úpravy povrchů a výměny stávajících oken za nová plastová. Dále bude proveden zásyp tepelného kanálu u schodiště do kuchyně a provedení betonové venkovní mazaniny a okapového chodníku, bourací práce, odvoz sutí, repase stávajících poklopů revizní šachty.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Požadavek provozovatele, souhlasím s provedením prací.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Finální úpravy prostor nevyužitých pro rekonstrukci zdroje tepla nebyly předmětem zadání PD. Jedná se o požadavek uživatele, proti navrženému řešení nemám námitek.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Jedná se o požadavek provozního střediska. Je potřeba doložit veškerými výkresy, fotodokumentací a rozpočty, aby nedošlo k duplicitní fakturaci. Dále je nutné odsouhlasit PS AHNM.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska AHNM:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS




Ing. Aleš PINKAS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Poznámky:

Jedná se o práce požadované AHNM a jsou to práce nad rámec díla. Kvůli dodržení záruky však bylo dohodnuto, že je provede firma, která provádí akci Plynofikace...

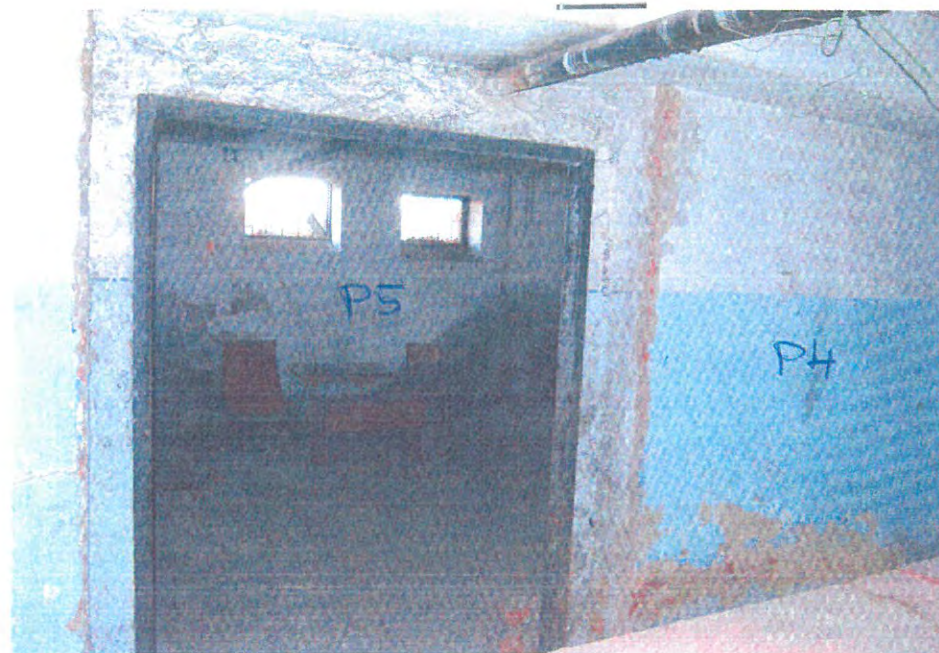

Původní okna
budou vyměněna

STÁVAJÍCÍ STAV POVRCHŮ

OZ č. 26

SO 33

sklady P3, P4, P5

OZ č. 26



OBNAŽENÁ VÝZTUŽ
STROP. PRŮVLAKU
P4



POUZE HRUBÉ OMÍTKY ZDIVA



DEGRADOVANÉ OMÍTKY ZDIVA

Oz č. 26



Stávající stav tepelného sanace
před demontáží keramických
desek.

Tepelný sanace bude rozšířen.

(pobíha č. 1)

(42) 6. 374/27/48/2014-6440-0689

Provozní středisko 0624
Vyškov

V Bučovicích dne 3. června 2015

Výtisk č: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Monika Rešl Kletečková
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice

Věc: Požadavek


Na základě zápisu z kontrolního dne č. 10, předkládám žádost a požaduji na budově č. 33 v místnostech, kde je osazen registr, dodat a osadit nová topná tělesa (m. č. 13 a 4 v 1 PP - velitelství). V ostatních místnostech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 (1 PP - velitelství) je nezbytné, aby projektant zajistil přepočít topné soustavy. Konvektory dodá PS 0624 Vyškov. Přepočít topné soustavy požadujeme na užívání místností jako kanceláře.

V místnostech (dle nového značení PD P5 - sklad, P4 - sklad) požadujeme provést opravu betonové podlahy včetně finálních cementových stěrek, provést opravu vnitřních omítek stěn a stropů a demontáž, dodání a osazení plastových oken - 7 ks, opravy el. instalace a výmalbu. Tyto prostory byly předány do užívání a provozování Armádní Servisní, p. o. Praha a po ukončení plynofikace bude nezbytné je předat AHNM Praha, PS 0624 Vyškov.

Vyřizuje:
Bc. Jana Dufková, DiS.
Tel. 973 454 769
Petr Diviš
Tel. 973 454 773

Vedoucí PS 0624, Vyškov
Ing. Aleš Pinkas



14. 6. 2015
převzala ING. REŠL KLETEČKOVÁ


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 26	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – stavební úpravy – místnost P3, P4, P5			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 26	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
		Výkres skutečného stavu	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Prostory po demontáži výměníkové stanice a stávající místnosti ohřevu TUV a uhelny jsou ve špatném technickém stavu. Vnitřní omítky jsou narušené, zvětralé a převážně opadané. U nosných průvlaků stropů jsou betony opadané a místy je viditelná obnažená nosná výztuž průvlaku. Stávající podlahy jsou vyspádované do vpustí a jsou narušené a zvětralé. Stávající ocelová okna v těchto místnostech jsou zrezivělá natolik, že není možná repase, dále chybí křídla oken a část skel. <u>Projektové řešení</u> V PD je řešena pouze nejnutnější oprava omítek po zazdění otvoru stávajících dveří a podlah po demontážích technologie. <u>Navrhované řešení</u> Provozní středisko požaduje provedení opravy stávajících omítek stropů, stěn, sanaci nosných průvlaků stropu a betonáž podlah. Nad rámec řešený v PD – budou provedeny kompletní úpravy povrchů a výměny stávajících oken za nová plastová. Dále bude proveden zásyp tepelného kanálu u schodiště do kuchyně a provedení betonové venkovní mazaniny a okapového chodníku, bourací práce, odvoz sutí, repase stávajících poklopů revizní šachty.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			

Technický dozor stavebníka


Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor




Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



Ing. Aleš PINKAS

AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Přílohy :

- dle textu v úvodu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) -----

Cena změny + 212.421,07 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


+ 212.421,07 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



30. 11. 2015

Datum:



Změnový list č. 26 - fotodokumentace

ZL č. 26

Skutečně provedeno!



SO 33


Změnový list č. 26 - fotodokumentace

ZL č. 26

VYMĚNĚNA OKNA - P4



NOVÉ ODÍTKY P5

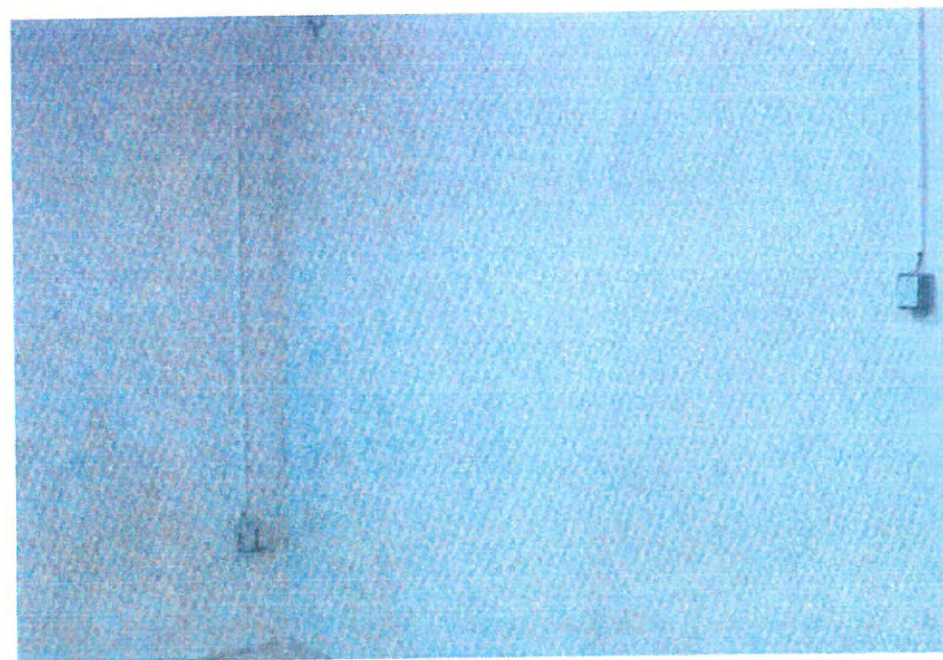

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 26 - SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva - stavební úpravy - místnost P3, P4, P5
<i>Objekt</i>	SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	155 868,96 Kč	25 144,11 Kč	- Kč	181 013,07 Kč
<i>specifikace</i>	2 308,00 Kč	29 100,00 Kč	- Kč	31 408,00 Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	158 176,96 Kč	54 244,11 Kč	- Kč	212 421,07 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		212 421,07 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	44 608,42 Kč
Σ		257 029,49 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka		297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)					
stavba		ZL č. 26 - SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva - stavební úpravy - místnost P3, P4, P5					
objekt		SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva					
typ činnosti		PSV					
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
766 (Konstrukce truhlářské)							
1		montáž plastových oken	m2	4,320		375,00 Kč	1 620,00 Kč
	1	8*0,9*0,6		4,320			
2		okno plastové 900x600	ks	8,000		3 637,50 Kč	29 100,00 Kč
Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské)							30 720,00 Kč
767 (Kovové doplňkové konstrukce)							
3		D + M kovové mříže 136x198 cm	kg	41,570		93,00 Kč	3 866,01 Kč
4		D +M poklop s rámem 93x93cm	ks	1,000		4 045,00 Kč	4 045,00 Kč
5		D +M rám k poklopu 96x67	ks	1,000		1 240,00 Kč	1 240,00 Kč
6	767 64 4120 /00	Montáž mříže - dokování otevíravých dvoukřídlových do ocel. kce	ks	1,000		514,50 Kč	514,50 Kč
7	998 76 7101 /Z0	Přesun hmot kov doplň kci v objektu výšky do 6m	t	0,000		548,00 Kč	0,15 Kč
Σ díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)							9 665,66 Kč
781 (Obklady keramické)							
8	781 73 3911 /00	Oprava -obklad cihelný lepený do 50ks/m2	ks	210,000		30,50 Kč	6 405,00 Kč
	1	10*12+8+46+2*6+3*8		210,000			
Σ díl 781 (Obklady keramické)							6 405,00 Kč
783 (Nátěry)							
9	783 20 1811 /00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukce oškrábáním	m2	1,665		14,30 Kč	23,81 Kč
	1	(1,45+2,05+2,05)*0,3		1,665			
10	783 22 4900_/00	Nátěry syntetické, kovových doplňkových kci jednonásobný+jednonásobný email 800-783 CO1	m2	1,665		179,50 Kč	298,87 Kč
11	783 22 5400_/00	Nátěr syntetický, kov dopl konst dvojnásobný jednonásobný email jednonásobný tmelení k 800-783 AO1	m2	1,880		106,00 Kč	199,28 Kč
12	783 90 4811 /00	Odřezivění kovových konstrukcí	m2	1,665		9,00 Kč	14,99 Kč
13	998 78 6101 /Z0	Přesun hmot výška-6	t	0,001		311,50 Kč	0,20 Kč
Σ díl 783 (Nátěry)							537,14 Kč
784 (Malby)							
14	784 41 2301_/00	Pačokování vápnem dvojnásobný s obroušením a sádrováním místnosti výšky do 3,8m	m2	307,990		3,76 Kč	1 158,04 Kč
	1	116,3+133,28+47,16+7,5*0,25*2*3		307,990			
15	784 45 3641_/00	Malba PRIMALEX disperzní dvojnásobný s pen.nátěr. fungicidní bílé místnosti výšky do 3,8m	m2	307,990		18,50 Kč	5 697,82 Kč
16	998 78 6101 /Z0	Přesun hmot výška-6	t	0,194		311,50 Kč	60,44 Kč
Σ díl 784 (Malby)							6 916,30 Kč
Σ							54 244,11 Kč

rekapitulace

766	Konstrukce truhlářské	30 720,00 Kč
767	Kovové doplňkové konstrukce	9 665,66 Kč
781	Obklady keramické	6 405,00 Kč
783	Nátěry	537,14 Kč
784	Malby	6 916,30 Kč
Σ		54 244,11 Kč

Změnový list č. 26 - rozpočet /str.4/

979 (Odvoz suti)

36 979 08 2111 /00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10m	t	43,200	155,00 Kč	6 696,00 Kč
1	24*1,8		43,200		
37 979 08 2121 /00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná -příplatek za každých dalších 5m	t	259,000	17,20 Kč	4 454,80 Kč
38 979 01 1111 /Z0	Svislá doprava suti za jedno podlaží	t	12,913	153,50 Kč	1 982,17 Kč
39 979 01 1121 /Z0	Svislá doprava suti za každé další podlaží	t	12,913	107,50 Kč	1 388,16 Kč
40 979 08 1111 /00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	12,913	265,00 Kč	3 421,98 Kč
41 979 08 1121 /00	Odvoz suti na skládku -příplatek za každý další 1km	t	206,610	9,90 Kč	2 045,44 Kč
42 979 08 2111 /Z0	Vnitrostaveništní doprava suti vodorov do 10m	t	12,913	155,00 Kč	2 001,54 Kč
43 979 09 8133 /00	Poplatek za skládku (keramický materiál + příměs<10%)	t	12,913	292,50 Kč	3 777,09 Kč
Σ díl 979 (Odvoz suti)					25 767,18 Kč

99 (Přesun hmot)

44 998 01 1001 /00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 6 m	t	19,680	152,00 Kč	2 991,36 Kč
45 998 01 1002 /Z0	Přesun hmot budov s nosnou kci zděnou/kovovou výšky 12 m	t	24,297	204,00 Kč	4 956,53 Kč
Σ díl 99 (Přesun hmot)					7 947,89 Kč


Σ

158 176,96 Kč

rekapitulace

17	Konstrukce ze zemín	7 740,00 Kč
31	Zdi podpěrné a volné	1 213,38 Kč
61	Úprava povrchů vnitřní	64 715,10 Kč
62	Úprava povrchů vnější	2 368,98 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	31 050,64 Kč
9	Ostatní	1 125,00 Kč
94	Lešení a stavební výtahy	171,00 Kč
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	4 324,85 Kč
96	Bourání a demontáž konstrukcí	8 207,23 Kč
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot	3 545,72 Kč
979	Odvoz suti	25 767,18 Kč
99	Přesun hmot	7 947,89 Kč
Σ		158 176,96 Kč

Změnový list č. 26 - výkres

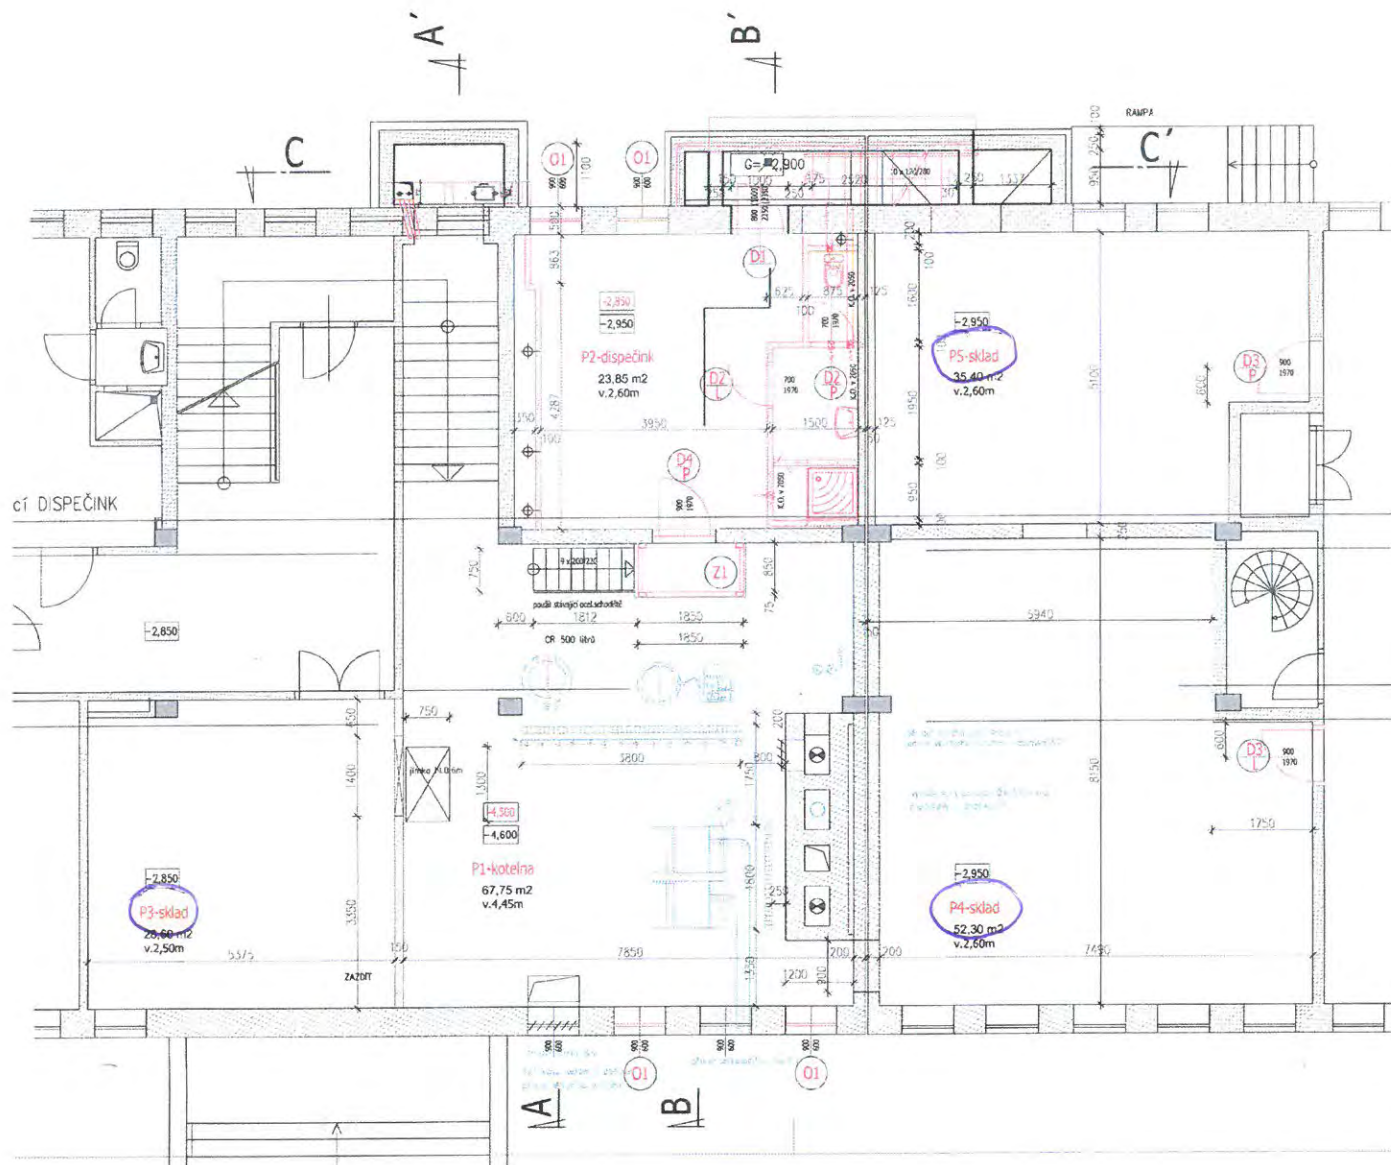

legenda: műtőnői-SC 033 -SUTERÉN

číslo	název	podoba	počet strán	počet slovo	platba
P1	KOTELNA	vyhodnotení střeš. nádr. bez tlak. 6 30 000 na základě vzájemné dohody podatel - majitelka, viz výtisk přelom - obdrženo pro účely cenové a základní dokumentace	základ, analýza rozděly analýza základ, správa základních výpočtů analýz	rozděly analýza - správa	57,7000
P2	DISKONTOVÁNÍ	OTTO - jednání PI	analýza rovnice základ, správa základních výpočtů analýz	rozděly analýza - správa	13,8400
P3	SKLAD				28,6900
P4	SKLAD		analýza rovnice základ, správa základních výpočtů analýz		52,3600
P5	SKLAD		analýza rovnice základ, správa základních výpočtů analýz		35,4000

legenda materiálů- SO 033 - SUTERÉN

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
	DOUHLÁVÉ KONSTRUKCE
	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE - NOSNÉ I NEPOSNÉ ÚJELO
	NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ZDVOU OBKLEKÉ
	OBVYS - NOVÝ STAV
	NAVÁZÁNÍ POD KOTVU ŽALAZ SPECIFIKACE VIZ: PRŮBĚH ŽAL, OSADENÍ VIZ DETAIL
	NOSNÉ VĚTRNÉ VĚTRNÉ, DO POTŘEBY POD STŘECHOU
	VĚTRNÉ, MĚŘENÁ 300/100 U PODLAHY - VE STĚNĚ NEOD DĚRŮCH
	NAVÁZÁNÍ ÚDÍKŮV PODLAHY - STŘEBELPŘÍK
	STAVAJÍCÍ ÚDÍKŮV PODLAHY

SO 033 Velitelství a kuchyně mužstva
a.4 Půdorys suterénu - nový stav

1 : 50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 27	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – protipožární dveře P4-P5 + mříž			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Výkres – půdorys		
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Místnosti P4 a P5 sloužily před zahájením plynofikace jako uhelna a strojovna páry. Po realizaci plynofikace kasáren se předpokládá, že budou využity jako sklady pro kuchyň.			
<u>Projektové řešení</u>			
V PD je uvedena dodávka a montáž 2 ks protipožárních dveří, vstup samostatně do každé místnosti (P4 a P5), mezi místnostmi navržen pouze zmenšený průchod.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Na základě požadavku vojenského útvaru a z provozních důvodů (využití místností) budou prostory P4 a P5, přístupné pouze z místnosti P4. Místnost P5 bude propojena s místností P4 pouze stávajícím průchodem, osazeným mříží se specifikací dle požadavku Provozního střediska AHNM. Stávající ocelová zárubně, která bude očištěna a natřena. Protipožární dveře pro vstup do místnosti P4 budou provedeny dle PD se změnou umístění dle možnosti umístění (posunu ve stěně).			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Akceptujeme požadované změny na neprovedení 1 ks požárních dveří a změnu propojení budoucího skladu P4 a P5 ocelovou mříží dle specifikace PS..			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Požadavek provozovatele, s provedením prací souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

S provedením prací souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s požadavkem VÚ a provozního střediska. Úprava otvoru mezi místnostmi P4 a P5 nebude provedena, místo toho se do stávající zárubně (ta se očistí a nově natře) osadí ocelová mříž. Jedny protipožární dveře nebudou provedeny ani vyúčtovány. Pořízení mříže je řešeno ve Změnovém listu č. 26.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.



číslo	název	podlaží	počet stěn	počet stropů	plocha
P1	KOTELNA	střešní kotelna s vrtací se- veroučelou tepelná čerpadla, čerp. výpomoc, střeš- ní teplovodní pro měřiče teploty, a sloupčiny tepelné izolace	dvě, z toho, do v. 1,2m okrajový nádr	podlaží ohraničený v.3,30m	12,00m ²
P2	DISPENZÉR				
P3	SKLAD				

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVŘÍZENÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE, NOSNÉ I NENOSNÉ ZDIVO
	NAVŘÍZENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO CIHELNÉ
	ZASTŘEŠENÍ PROKLUBENÉ INERTNÍM HUTNĚLÝM MATERIÁLEM (LUPEK, ŠTEKLA PODL.) ZMŮŤNĚNÍ A PŘEBETONOVÁNÍ PODKL. BETONEM
	ROZSAH BOURÁNÍ PODKLAD. BET. A VÝKOP PRO PRONĚTÍMÍ NAVŘÍZENÉ LEŽÁTE KANALIZACE
	OBRYŠ - NOVÝ STAV
	STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY KANÁLŮ (s. nř. střechem) demontovat včetně klenby, ušlechdit
	BOURÁNÍ ZÁKLADŮ ZHRUBČENÍ V.S.
	NAVŘÍZENÝ PODLAHOVÝ ŽLAB, SPECIFIKACE VIZ. PROJEKT ZTI, OSAZENÍ VIZ. DETAIL
	NAVŘÍZENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA M.C 50
	NAVŘÍZENÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z BET. CIHLICÍ TVRŠNÉ TL. 250mm, PROLITÍ BET. C20/25
	NUCENÉ VĚTRÁNÍ - VENT. DO POTRUBÍ POD STROPEM
	VĚTR. MŘÍŽKA 300x100 U PODLAHY - VE STĚNĚ NEBO DVEŘÍCH

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 27	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – protipožární dveře P4-P5 + mříž			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 27	
		Fotodokumentace	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Místnosti P4 a P5 sloužily před zahájením plynofikace jako uhelna a strojovna páry. Po realizaci plynofikace kasáren se předpokládá, že budou využity jako sklady pro kuchyň. <u>Projektové řešení</u> V PD je uvedena dodávka a montáž 2 ks protipožárních dveří, vstup samostatně do každé místnosti (P4 a P5), mezi místnostmi navržen pouze zmenšený průchod. <u>Navrhované řešení</u> Na základě požadavku vojenského útvaru a z provozních důvodů (využití místností) budou prostory P4 a P5, přístupné pouze z místnosti P4. Místnost P5 bude propojena s místností P4 pouze stávajícím průchodem, osazeným mříží se specifikací dle požadavku Provozního střediska AHNM. Stávající ocelová zárubně, která bude očištěna a natřena. Protipožární dveře pro vstup do místnosti P4 budou provedeny dle PD se změnou umístění dle možnosti umístění (posunu ve stěně).			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- dle textu v úvodu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) - 6.000,00 Kč

Cena změny ----

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	- 6 000,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015





S033

Interiér

protipožární
dveře

ZL č. 27

skutečný stav



Rozpracovaný — stav

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 27 - SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva - protipožární dveře P4-P5
<i>Objekt</i>	SO 033 (Velitelství, kuchyně) vícepráce sklady 103,104 , 105 dveře

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	-6 000,00	- Kč	-6 000,00
Σ	- Kč	-6 000,00	- Kč	-6 000,00

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		-6 000,00
<i>DPH</i>	0,21 ze základu	-151,95
Σ		-6 151,95

VÝKAZ VÝMĚR

<i>zakázka</i>	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)
<i>stavba</i>	ZL č. 27 - SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva - protipožární dveře P4-P5
<i>objekt</i>	SO 033 (Velitelství, kuchyně) vícepráce sklady 103,104 , 105 dveře
<i>typ činnosti</i>	PSV

<i>pořadí</i>	<i>číslo</i>	<i>popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena</i>	<i>celkem</i>
149	76666022	montáž vnitřních dveří protipožárních do ocelové zárubně přes 800 mm	ks	-1		375	-375,00
150	553411830	dveře plné ocelové protipožární EW 15DP1-C se samozavíračem 900/1970 (D3)	ks	-1		5625	-5 625,00
Σ		součet					-6 000,00

Celkem méněpráce bez DPH

-6 000,00

30.9.2015

BOSS montáže, s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 28	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – doplnění elektroinstalace suterén			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:		Popis	
		Fotodokumentace stávajícího stavu	
		Výkres – půdorys – návrh rozvodů	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Po demontáži parních rozvodů a technologie se uvolnily nově prostory, ve kterých není řešena elektroinstalace. Vypínač pro místnost P4 nevyhovuje svým osazením (u nově zazděného vstupu z P1); místnost P5 byla osvětlena vypínačem ve stávající místnosti P2. <u>Projektové řešení</u> Elektroinstalace v prostoru uhelny a sousední místnosti (nově sklad P4 a P5) nebyla součástí řešení v rámci realizace díla. <u>Navrhované řešení</u> Do stávajícího rozvaděče budou doplněny jistící prvky pro zásuvkové a světelné rozvody. V jednotlivých místnostech budou osazena zářivková svítidla IP 65 a zásuvky. Veškeré rozvody budou provedeny v lištách na povrchu.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Provedeme dle požadavku.  BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Požadavek provozovatele je vzhledem k budoucímu využití místnosti oprávněný, s provedením prací souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Finální úpravy prostor nevyužitých pro rekonstrukci zdroje tepla nebyly předmětem zadání PD.

Jedná se o požadavek uživatele, s provedením prací souhlasím.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Ze strany objednatele je požadavek akceptovatelný pouze v rozsahu osazení vypínačů vedle vstupních dveří u P4 a P5 a osvětlení každého prostoru. Zásuvkové obvody nebudou pro uvedené skladové prostory řešeny touto zakázkou.

Objednatel předá uživateli místnosti tak, aby byly schopné užívání – s opravenými omítkami a podlahami, se zajištěním ovládání osvětlení u vstupu. Další vybavení si zajistí uživatel (zářivky, zásuvkové rozvody atd.)

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska AHNM:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



Ing. Aleš PINKAS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov


Poznámky:

Jedná se o vícepráce zpracované na základě požadavku AHNM (souvisí se ZL č. 26).




Oznámení změny č. 28 - fotodokumentace

Oznámení změny č. 28 - fotodokumentace

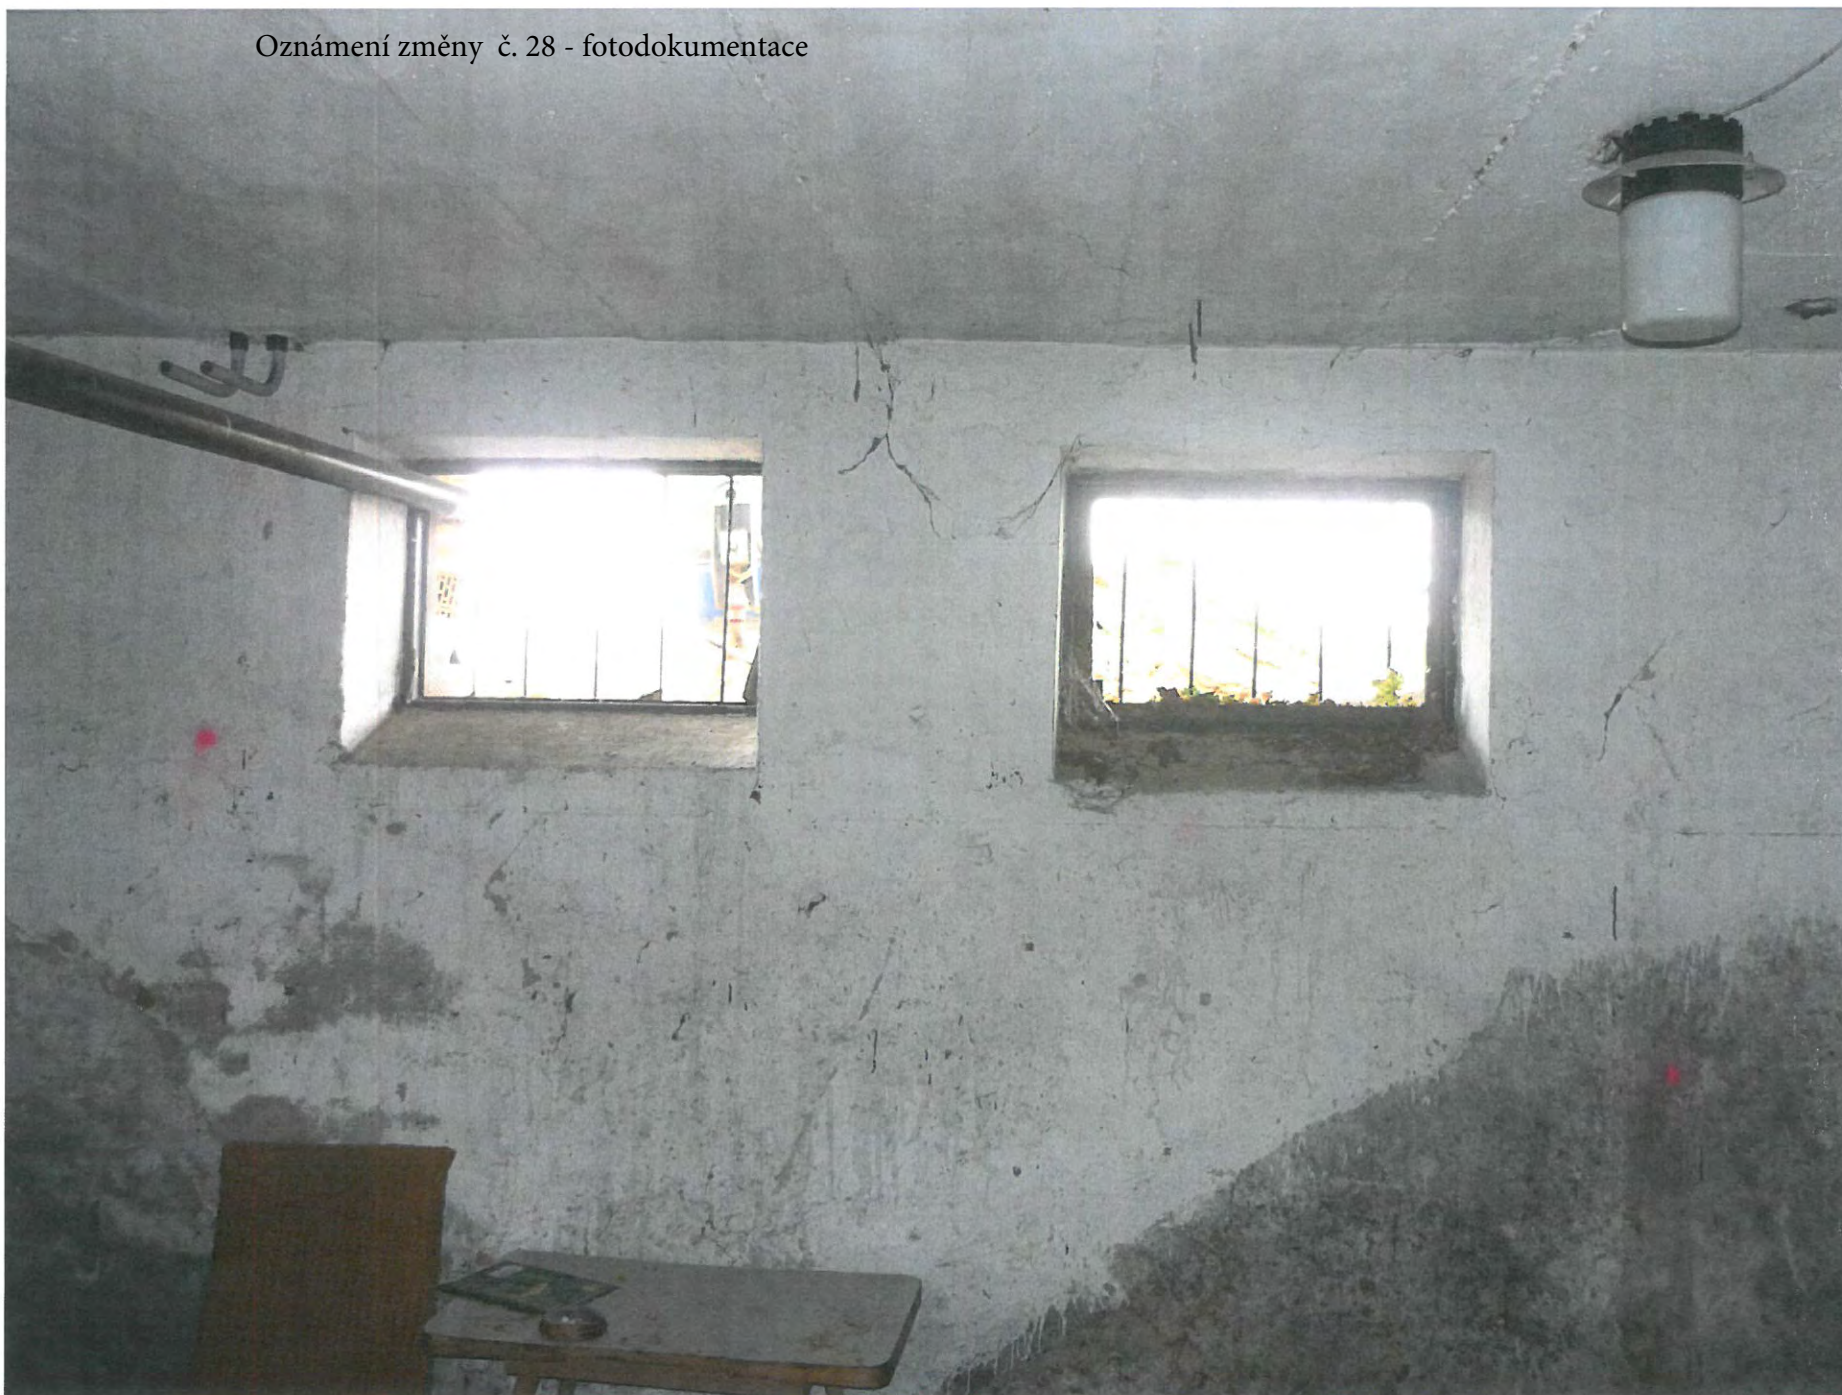

ASPO

A H N M

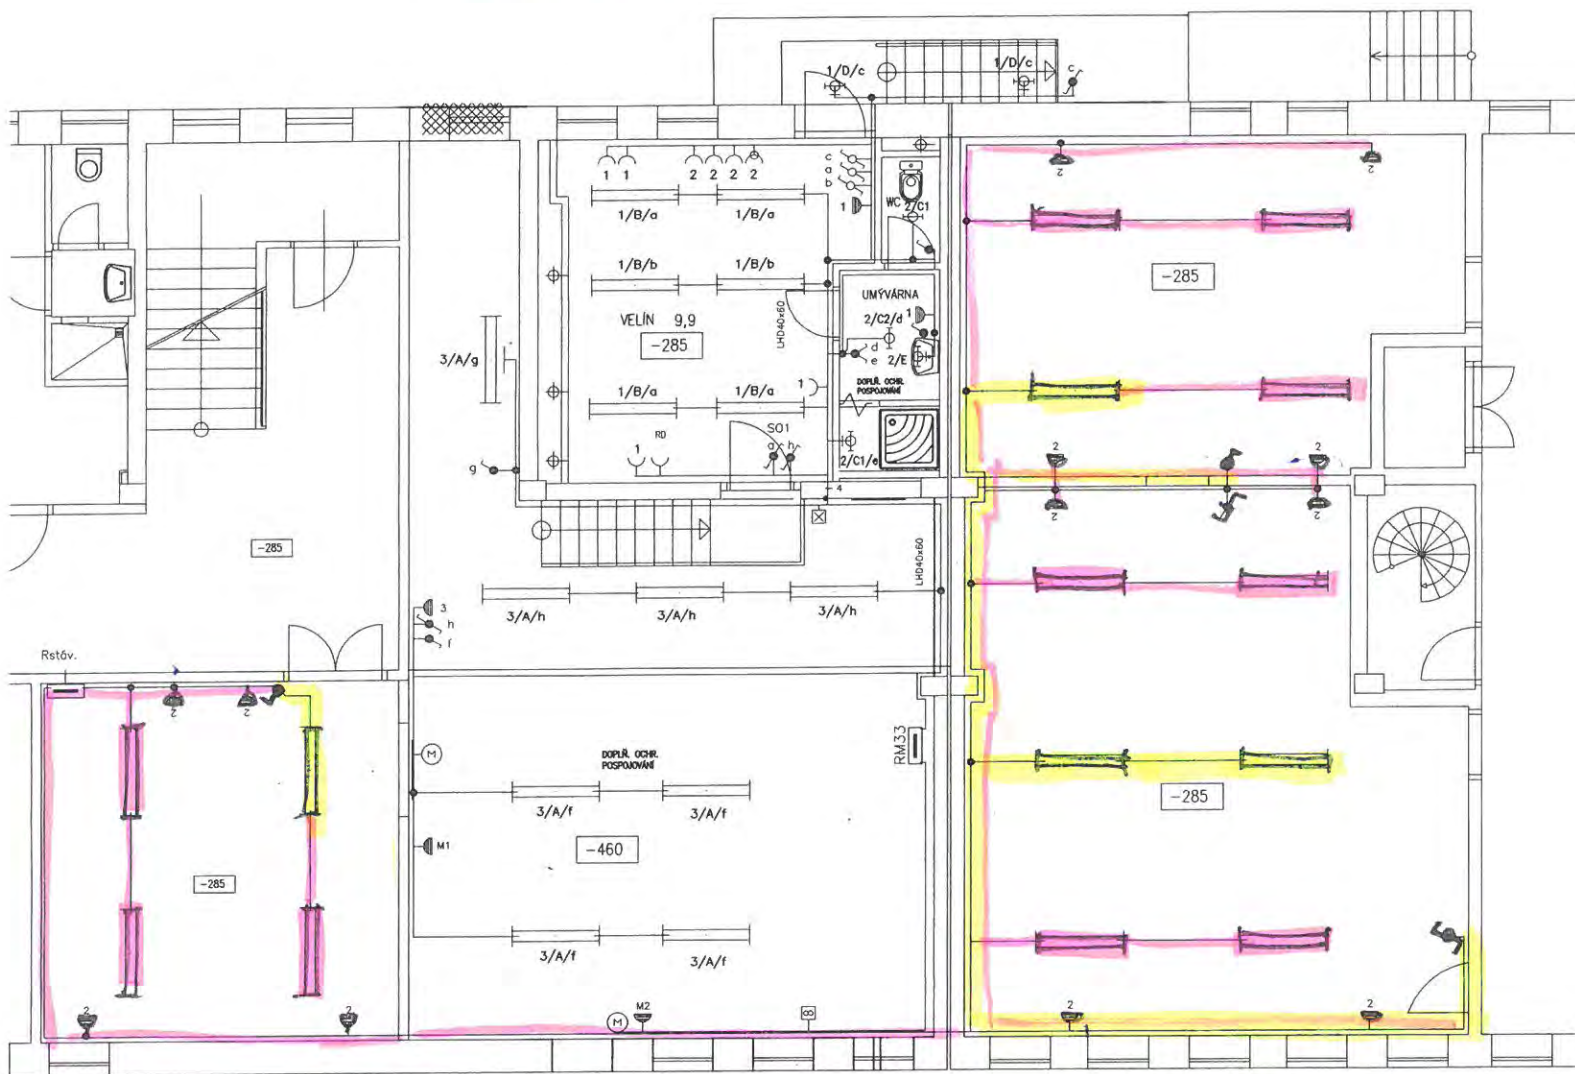

LEGENDA

-  Nástěnné oceloplechové rozvodnice – OČEP/P
-  Zářivkové svídlo TREVOS Prima 2x36W, IP66
-  Svídlo s kompaktní zářivkou přisazené, IP44
-  Spínač jednopólový, ABB Praktik IP44
-  Přepínač střídavý, ABB Praktik IP44
-  Spínač jednopólový, ABB Clasic IP20
-  Zástrčka jednonóboá s ochranným kolíkem a víčkem
-  STOP tlačítka v prosklené skřínce
-  Ventilátor 230V
-  Rozbočná instalační krabice se svarkovnicí a víčkem

ROZVODNÁ SOUSTAVA

EL INSTALACE: 1 N PE AC, 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDU – DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:

- ochrana normální : automatickým odpojením od zdroje

— ochrana doplňková : proudové chrániče, doplňující pospojování


ODPOJENÍ EL. INSTALACE – rozváděč RM33

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ – viz. Protokol

WYPMACZAL	CO, SROU, PROFESOR	KONTROLAŁ	CO, PROJ, STAWIŁ	Igor KYJKA elektrykoprojektant Bratysława 45, Kyjivhor tel.: 604 914 364
Igor Kyjka	Roman Sedláč			
OKRES: Jilgomszaw		ODEC: Bučowice		
INWESTOR: Armádní Serwis, s.p., Podobałab 1569/1, Praha				
PLYNOFIKACJE KASÁREN JIRIHO Z PODEBRAD				FORMAT 2 A4 DATUM 23.08.2015 STUPEŃ DPS MERTWIO 1.05
VŮ BUČOWICE				ARCHIWNE CISŁO 32/15 C.VYKRESU 503
SO 033 Veilteilství a kuchyně mužstva-elektroinstal.				

ASPO
AHNM

02 č. 28

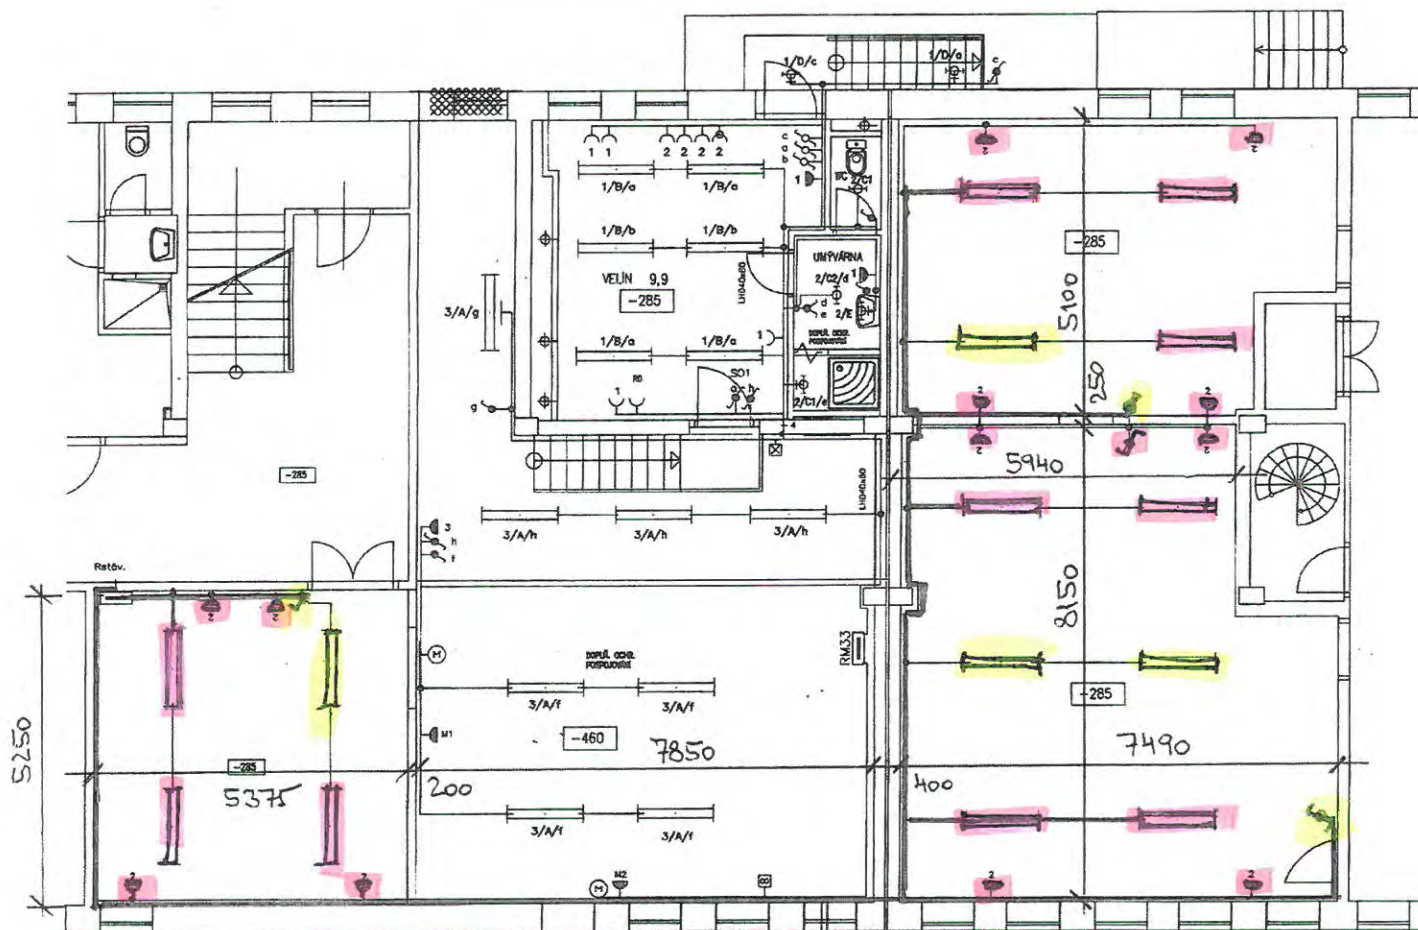

LEGENDA

- Místnost elektrického rozvodu - OCPEP/P
- Základní svítidlo TRIVOS Prima 2x36W, IP44
- Svítidlo s kompaktní zářivkou přezemě. IP44
- Spínač jednoboký, ABB Praxik IP44
- Přepínač střídavý, ABB Praxik IP44
- Spínač jednoboký, ABB Praxik IP20
- Základní jednotka s ochranným košem a výškov.
- STDP tlačítko v prosklené skřínce
- Ventilátor 230V
- Rozvaděč instalován v kotelně s ochranným košem

ROZVODNÁ SOUSTAVA

ELINSTALACE: 1 N PE AC, SOH2, 230V, TN-S
 OCHRANA PŘED PŘÍČINOU EL.PROUDU - DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
 - ochrana normální: automatickým odpojením od zdroje
 - ochrana depiková: proudová chránka, doplňující bezpečnost
 OPOJENÍ ELINSTALACE - rozváděč RM33
 URČENÍ VNĚJŠÍCH VÝVŮ - viz. Protokol


VÝKRESNÍK	OBJEDVATEL	KONTROLNÍK	DEKONTROLNÍK	LEPŠÍ KONTROLNÍK
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba
Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba	Starý dleba

Oznámení změny č. 28 - výkres - návrh

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 28	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 33 Velitelství, kuchyně mužstva – doplnění elektroinstalace suterén				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015		
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 28		
		Fotodokumentace		
	na rozpočtové podklady:	Výkres – půdorys s rozměry		
		Rozpočet AHNM x ASPO		
<u>Popis stávajícího stavu</u>				
Po demontáži parních rozvodů a technologie se uvolnily nově prostory, ve kterých není řešena elektroinstalace. Vypínač pro místnost P4 nevyhovuje svým osazením (u nově zazděného vstupu z P1); místnost P5 byla osvětlena vypínačem ve stávající místnosti P2.				
<u>Projektové řešení</u>				
Elektroinstalace v prostoru uhelny a sousední místnosti (nově sklad P4 a P5) nebyla součástí řešení v rámci realizace díla.				
<u>Navrhované řešení</u>				
Do stávajícího rozvaděče budou doplněny jistící prvky pro zásuvkové a světelné rozvody. V jednotlivých místnostech budou osazena zářivková svítidla IP 65 a zásuvky. Veškeré rozvody budou provedeny v lištách na povrchu				
Důvod změny:				
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Zhotovitel				
Jméno: Ing. Pavel Omelka				
 BOSS montáže, s.r.o.				
Technický dozor stavebníka				
Jméno: Ing. Karel Hróz				
 SAFETY PRO, s.r.o.				

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor


.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
.....
Armádní Servisní, p.o.**Zástupce uživatele:**

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS


Ing. Aleš PINKAS
.....
AHNM Praha, PS 0624 Vyškov**Přílohy :**

- dle textu v úvodu


REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená) -----

Cena změny podíl ASPO+ 5 205,00 Kč

AHNM.....+ 31.310,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	<i>Celkem 36.515,- Kč</i> ASPO 5.205,- Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele:  30. 11. 2015
Datum:	Datum:




Změnový list č. 28 - fotodokumentace - skutečné provedení elektroinstalace

ZLč. 28

Skutečné provedení
elektroinstalace



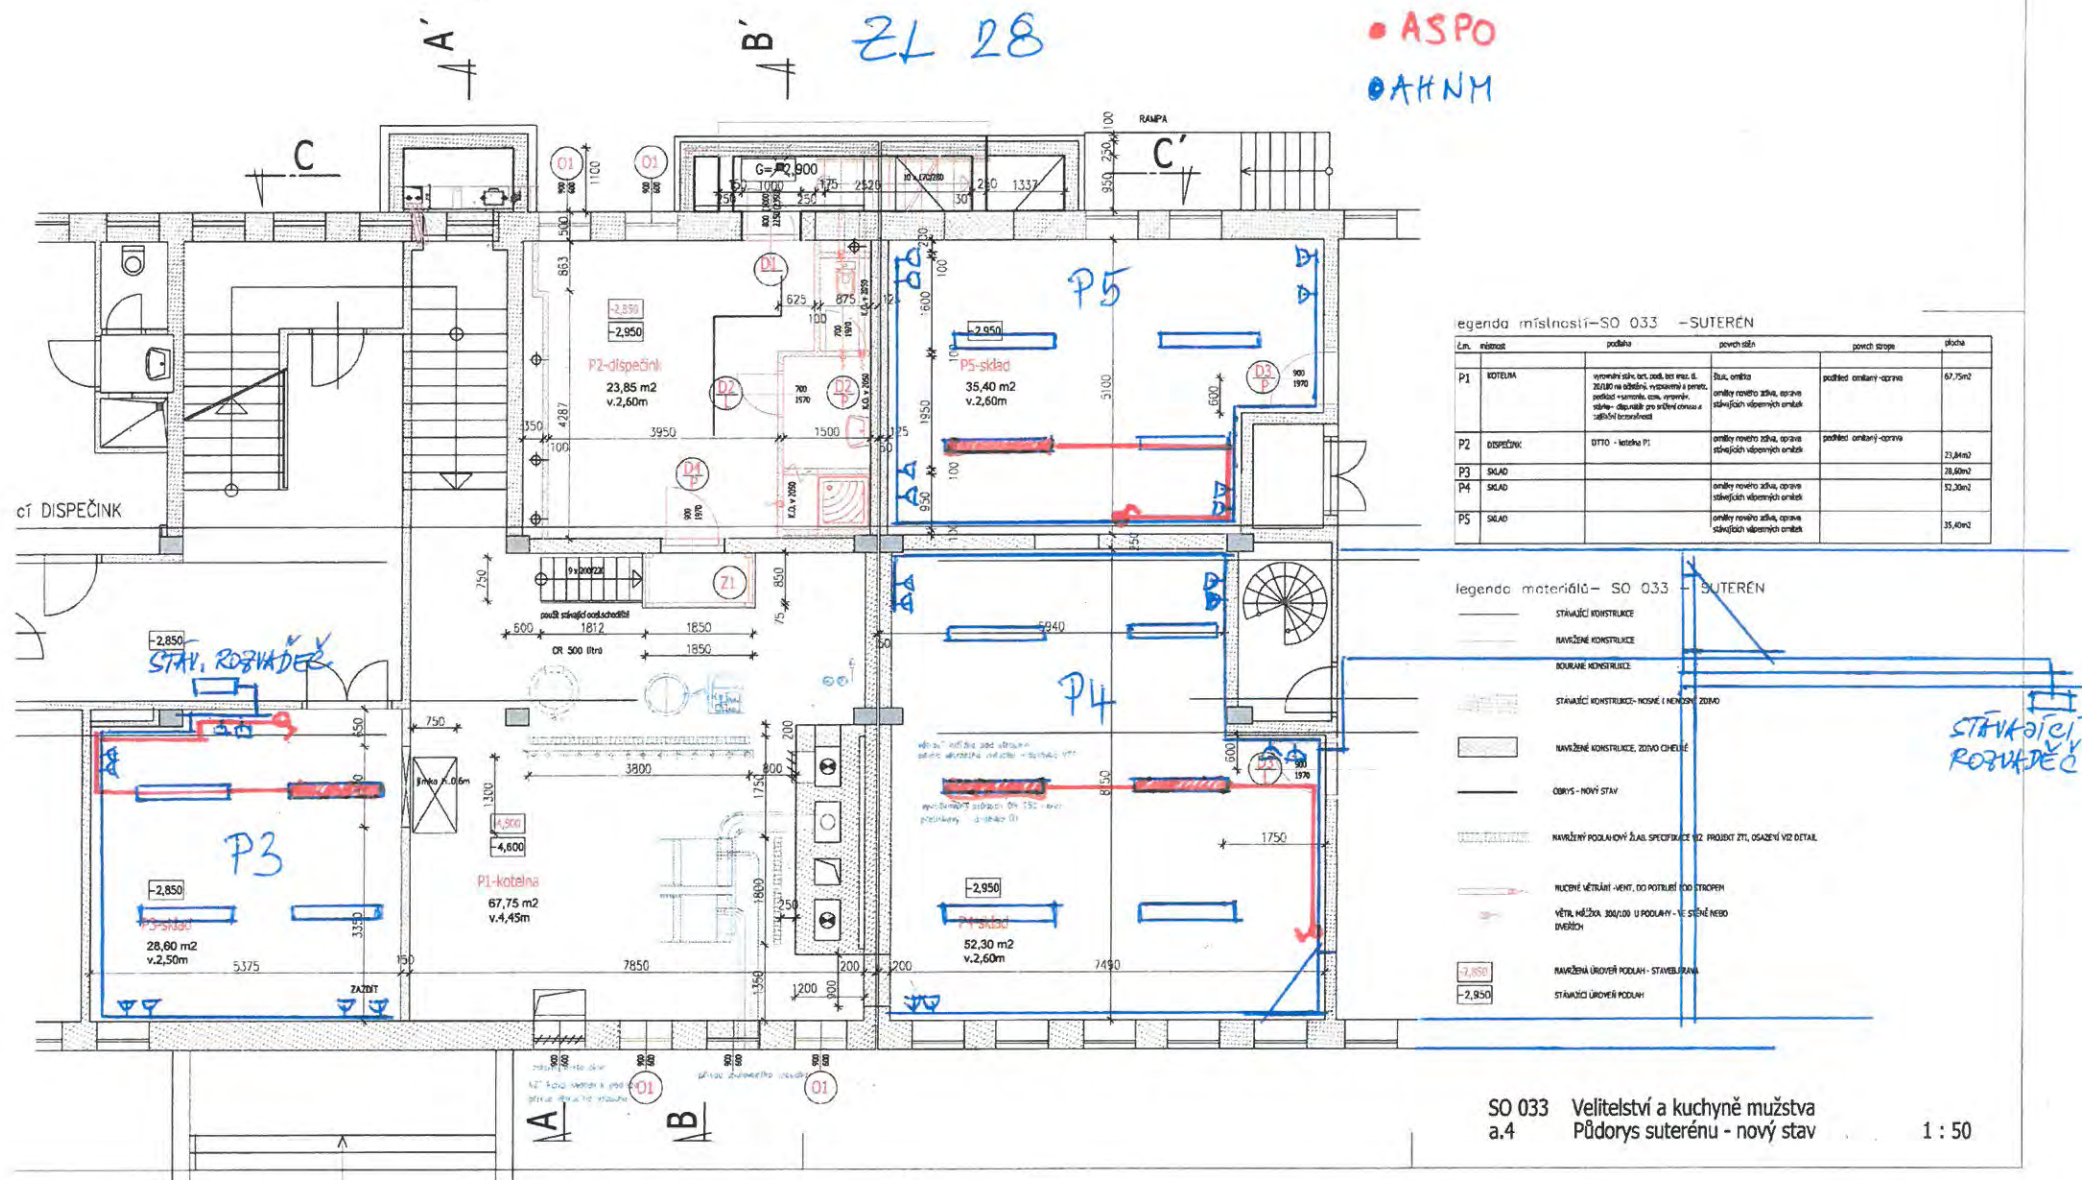

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad, VÚ Bučovice


ZL č. 28 - SO 033 Velitelství, kuchyně mužstva - doplnění elektroinstalace suterén

ASPO

Výkaz výměr

Položka	mj	Počet	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem
přípevnění stávajících kabelů pod stropem	ks	0	10	0	120	0
sklady P3, P4, P5						
svítidlo zářivkové 2 x 36 W IP 66	ks	4	490	1960	135	540
trubice 840 36 W	ks	8	38	304	0	0
lišta vkladací LV 17 x 17	m	19	10	190	40	760
(4+1+2) P3						
(3+4) P4						
(1+1,5+2,5) P5						
lišta vkladací LV 40 x 40	m	6	34	204	60	360
(2+2+2) P3, P4, P5						
lišta vkladací LV 25 x 20	m	0	14	0	50	0
lišta vkladací LV 40 x 20	m	0	17	0	58	0
CYKY 3J x 1,5	m	24	9	216	8	192
CYKY 3O x 1,5	m	8	9	72	8	64
CYKY 3J x 2,5	m	0	14	0	8	0
vypínač č. 1 VDT šedý	ks	2	74	148	39	78
vypínač č. 6 VDT šedý	ks	1	77	77	40	40
dvozásuvka 230 V VDT průběžná	ks	0	147	0	89	0
krabice acidur 64-55-11	ks	0	70	0	86	0
jistič 10B/1 LTN	ks	0	100	0	0	0
jistič 16B/1 LTN	ks	0	92	0	0	0
úprava stávajícího rozvaděče	hod	0	0	0	350	0
součet				3171		2034
materiál			3171			
montáž			2034			
Součet			5205			
Celkem vícepráce bez DPH			5205			
30.11.2015				Vajda, BOSS montáže, s.r.o.		


Položka	mj	Počet	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem
přípevnění stávajících kabelů pod stropem	ks	30	10	300	120	3600
sklady P3, P4, P5						
svítidlo zářivkové 2 x 36 W IP 66	ks	10	490	4900	135	1350
trubice 840 36 W	ks	20	38	760	0	0
lišta vkladací LV 17 x 17 (8+2+4+8+2+4+8+2+4+4+3)	m	49	10	490	40	1960
lišta vkladací LV 40 x 40 (4+6+2+3+2+3+2+2)	m	24	34	816	60	1440
lišta vkladací LV 25 x 20 (5+2+3+5+5+3+2+5)	m	30	14	420	50	1500
lišta vkladací LV 40 x 20 (3+2+4+4+3+4+3+2+5)	m	30	17	510	58	1740
CYKY 3J x 1,5	m	121	9	1089	8	968
CYKY 3O x 1,5	m	22	9	198	8	176
CYKY 3J x 2,5	m	131	14	1834	8	1048
vypínač č. 1 VDT šedý	ks	0	74	0	39	0
vypínač č. 6 VDT šedý	ks	1	77	77	40	40
dvojbídná 230 V VDT průběžná	ks	12	147	1764	89	1068
krabice acidur 64-55-11	ks	6	70	420	86	516
jistič 10B/1 LTN	ks	3	100	300	0	0
jistič 16B/1 LTN	ks	3	92	276	0	0
úprava stávajícího rozvaděče	hod	5	0	0	350	1750
součet				14154		17156
materiál			14154			
montáž			17156			
součet			31310			
Celkem vícepráce bez DPH			31310			
30.11.2015			Vajda, BOSS montáže, s.r.o.			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 29	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 41 TOP, TOV - změna barvy okna			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31.7.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:		Popis	
<u>Popis stávajícího stavu</u> V atriu objektu SO 41 je navrženo osazení okna do nově budované kotelny. V rozpočtu je barva okna bílá. Ostatní stávající okna i nově osazené dveře jsou barvy šedé. <u>Projektové řešení</u> V rámci minimalizace ceny byl požadavek investora okno v barvě bílé. <u>Navrhované řešení</u> Před objednáním a dodávkou okna upozorňuje zhotovitel, že v rozpočtu SO 41 je uvedena barva okna bílá. Vzhledem k tomu, že všechny ostatní vyskytující se výplně jsou v barvě šedé, předkládá zhotovitel prosbu provozního střediska, zda by mohla být zachována barevná škála a mohlo být dodáno okno šedé barvy. Cenový rozdíl při dané velikosti okna 600 x 2400 je do 1500,- Kč.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Osadit šedé plastové okno, odsouhlaseno viz. Zápis z KD č. 8.  BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Doporučuji vyhovět žádosti provozního střediska a dodat okno v šedé barvě.


Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V rámci architektonického řešení doporučuji sladit okenní prvky (i vzhledem k šedé barvě nově osazených dveří do kotelny).


Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:


Souhlasím s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková


Armádní Servisní, p.o.


Stanovisko provozního střediska AHNM:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS

souhlasím.

AHNM Praha, PS 0624 Vyškov


Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 29	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 41 TOP, TOV - změna barvy okna				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015		
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:	Oznámení změny č. 29			
	Fotodokumentace skutečného provedení			
	Nabídka dodavatele oken			
	Rozpočet			
<u>Popis stávajícího stavu</u> V atriu objektu SO 41 je navrženo osazení okna vedle nově budované kotelny. V rozpočtu je barva okna bílá. Ostatní stávající okna i nově osazené dveře jsou barvy šedé. <u>Projektové řešení</u> V rámci minimalizace ceny byl požadavek investora okno v barvě bílé. <u>Navrhované řešení</u> Před objednáním a dodávkou okna upozorňuje zhotovitel, že v rozpočtu SO 41 je uvedena barva okna bílá. Vzhledem k tomu, že všechny ostatní vyskytující se výplně jsou v barvě šedé, předkládá zhotovitel prosbu provozního střediska, zda by mohla být zachována barevná škála a mohlo být dodáno okno šedé barvy. Cenový rozdíl při dané velikosti okna 600 x 2400 je do 1500,- Kč.				
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.				
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.				

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Přílohy :

- Nabídka dodavatele oken
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)

Cena změny + 1.387,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 1.387,00 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:


30. 09. 2015

ZL č. 29

SO 041 - výprave
- okno v šedé barvě



Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks		8 676,00 Kč	8 676,00 Kč

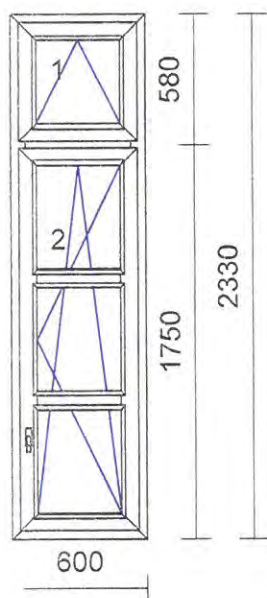

Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: Bílá/REN 7155
 Těsnění: Šedé/Šedé
 Kování: Maco Multi MATIC KS (Standard)
 kř. profil klika
 1 D078 Pákový ovladač vlevo
 2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
 pole výplň
 1.1 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.2 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.3 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Příčky: 2 * příčka 83mm / 70mm
 Zaskl.lišty: standard
 Odvodnění: dopředu
Ozn. SO 041-01
G.S.O. šířka 620mm
 Rozměr: 600 x 2330 mm

1 x 1 ks

Pákový ovladač 3m+bovden BILY

4 737,00 4 737,00

2

Odpočet původní položka

- 12 026,00 Kč

Přehled:

Obvod	5,860 m
Počet oken	1 ks
Počet skel	4 ks
Obvod bez spojů	5,860 m
Plocha oken	1,40 m ²

Suma položek	1 387,00 Kč
Sleva	
Suma netto	

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

ZAKÁZKA

<i>Označení</i>	297	
<i>Popis</i>	Plynofikace kasáren VÚ Bučovice	30.9.2015

STAVBA, OBJEKT

<i>Stavba</i>	ZL č. 29 SO 41 TOP, TOV - změna barvy okna
<i>Objekt</i>	SO 41 TOP, TOV

DODAVATEL

BOSS montáže, s.r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice

ODBĚRATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	<i>HSV</i>	<i>PSV</i>	<i>Montáže</i>	Σ
<i>stavební práce</i>	- Kč	1 387,00 Kč	- Kč	1 387,00 Kč
<i>specifikace</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>stroje</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>HZS</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
<i>ostatní</i>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	- Kč	1 387,00 Kč	- Kč	1 387,00 Kč

CENA OBJEKTU

<i>cena bez DPH</i>		1 387,00 Kč
<i>DPH</i>	21% ze základu	291,27 Kč
Σ		1 678,27 Kč


VÝKAZ VÝMĚR

<i>zakázka</i>	297 (Plynofikace kasáren VÚ Bučovice)
<i>stavba</i>	ZL č. 29 SO 41 TOP, TOV - změna barvy okna
<i>objekt</i>	SO 41 TOP, TOV
<i>typ činností</i>	PSV

<i>pořadí</i>	<i>číslo</i>	<i>popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i> <i>jednotka</i>	<i>celkem</i>
769 (Otvorové prvky z plastu)						
1		rozdíl v ceně výrobku plastového okna 600x2330 v barvě šedé	ks	1,000	1 387,00 Kč	1 387,00 Kč
Σ díl 769 (Otvorové prvky z plastu)						1 387,00 Kč
Σ						1 387,00 Kč

rekapitulace

769	Otvorové prvky z plastu	1 387,00 Kč
Σ		1 387,00 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 30	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 100 Rozvody STL plynu v areálu – úprava trasy			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	Popis		
	Výkresová dokumentace		
	Požadavek PS		
<u>Popis stávajícího stavu</u> Trasa nového plynovodu za objektem SO 12 je v kolizi s novým plánem výstavby v areálu VU Bučovice, který v tomto prostoru počítá s výstavbou nového objektu skladu.			
<u>Projektové řešení</u> Trasa plynovodu je vedena v zeleném pásu za objektem SO 12, v době zpracování PD nebyla informace o výstavbě skladu projektantovi známa.			
<u>Navrhované řešení</u> Trasa plynovodu „řad 1“ bude vedena ve zpevněné ploše před budovou SO 12. Přípojky pro objekt SO 12 a SO 33 budou napojeny na „řad 1“.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel Po vytýčení inženýrských sítí před SO 12 bude proveden výkop rýhy pro montáž plynovodu a „řad 1“ bude vybudován dle požadavku správy budov.  BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Jedná se o požadavek uživatele. Nemám námitek a s úpravou trasy souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Bez připomínek.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

V rámci plánovaného umístění muničního skladu), kdy je v rámci velikosti areálu omezena lokalita, kam lze sklad umístit, by došlo ke kolizi s plynovodním řádem. Proto Objednatel souhlasí s navrženou změnou trasy.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková




Armádní Servisní, p.o.

Stanovisko provozního střediska AHNM:

Na základě přípravy plánované výstavby muničního skladu v areálu požadujeme změnu trasy vedení a to u objektu SO 12, kdy navržená trasa bude místo za objektem v zeleném pásu vedena před objektem v asfaltové komunikaci.

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS


souhlasí



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změna rozsahu položky / změna řešení.

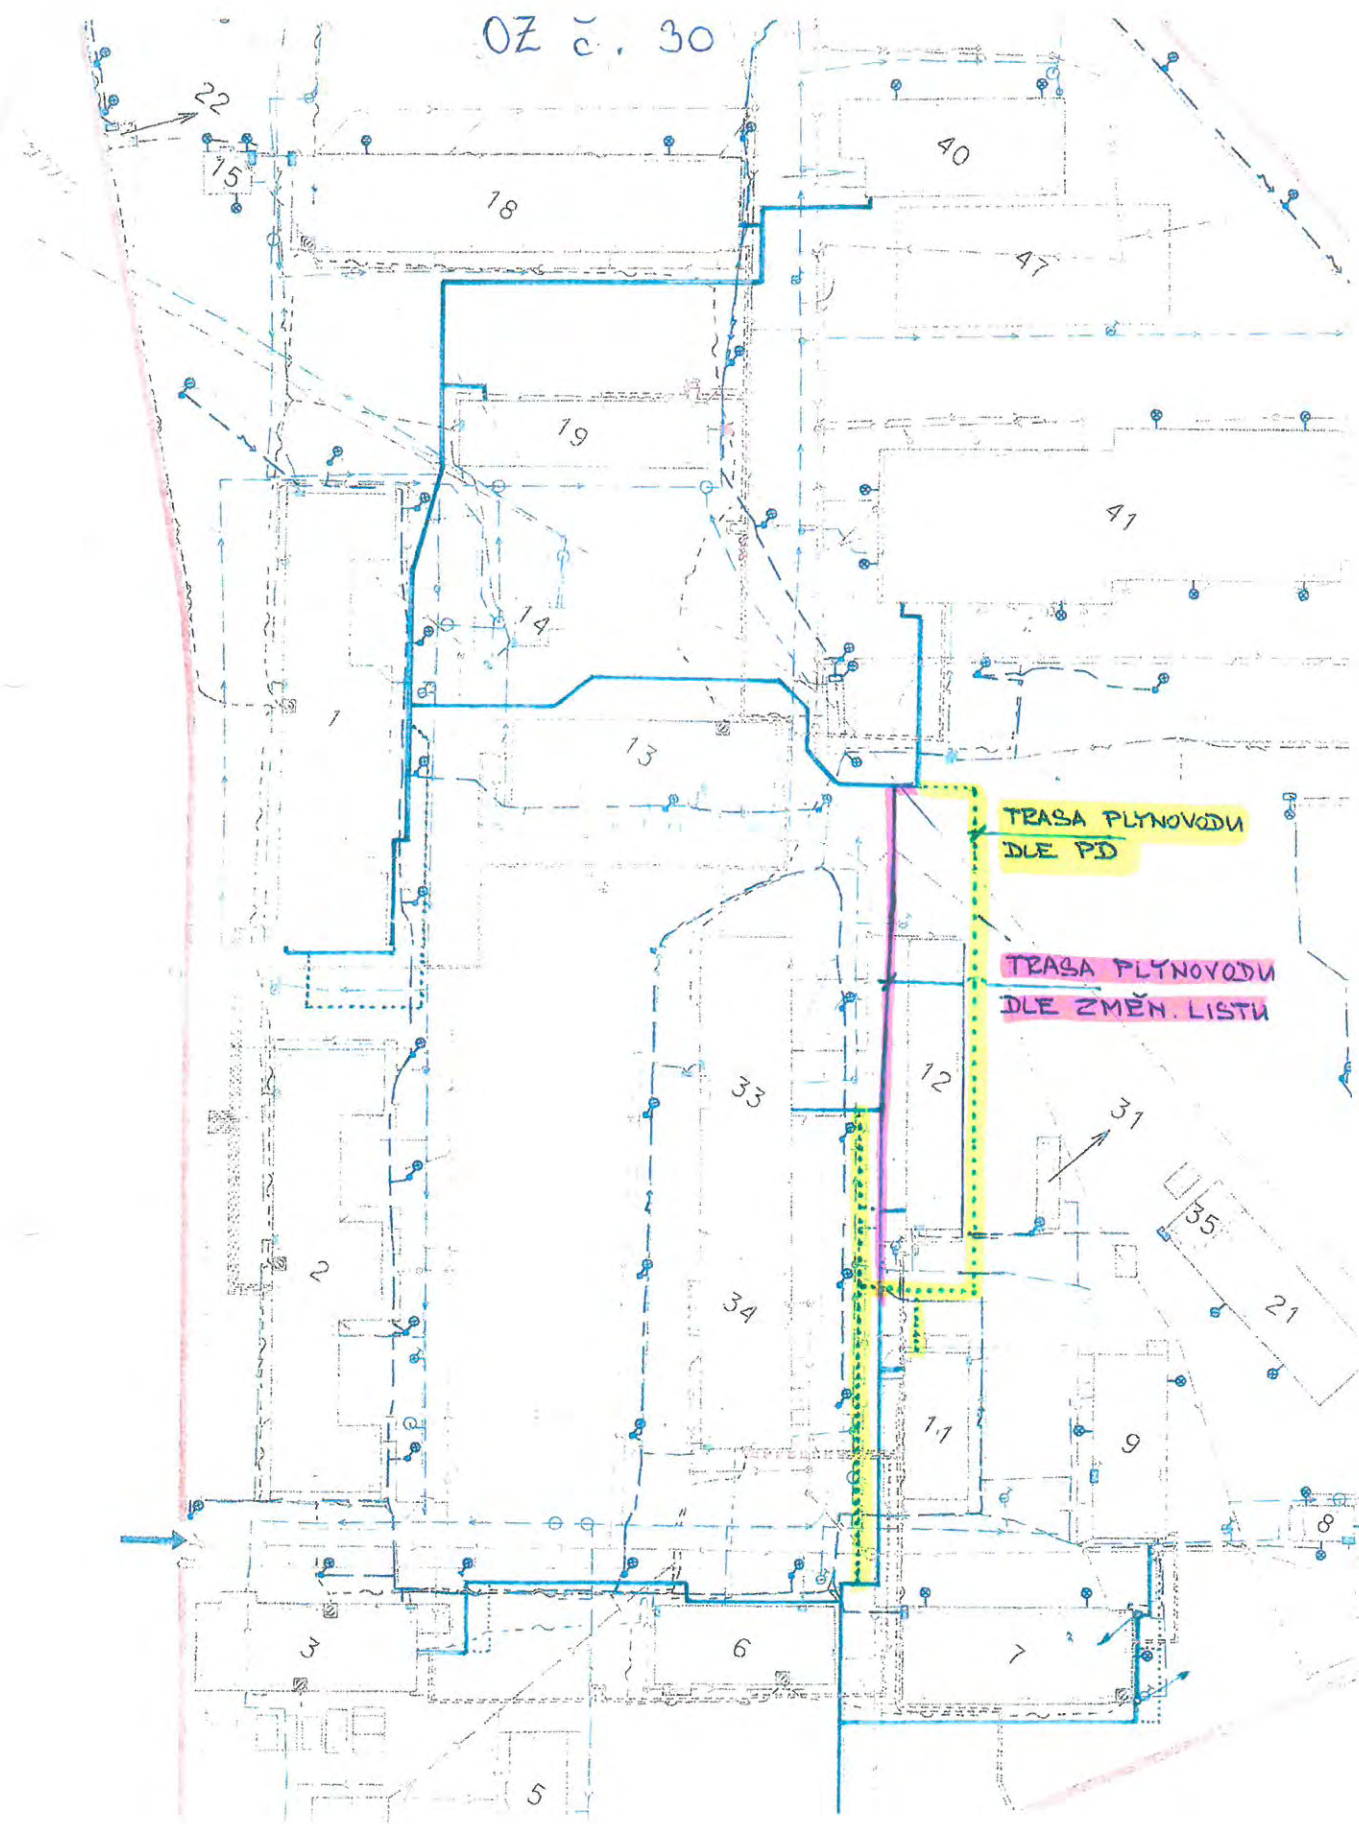

Provozní středisko 0624
Vyškov

EA 317/22/48-8 /2015-6440-0624

V Bučovicích dne 11. února 2015

Výtisk č: 1

Počet listů: 1

Přílohy:


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice


Věc: Žádost

Žádáme o provedení změny trasy rozvodu plynu, která je navržena za budovou č. 12 v areálu Kasáren Jiřího z Poděbrad. Z důvodu plánované výstavby zbrojního skladu požadujeme rozvod plynu realizovat před budovou a to v živičné ploše.

Vyřizuje:
Jana Dufková
Tel. 454 769

Vedoucí PS 0624 Vyškov
Ing. Aleš Pinkas




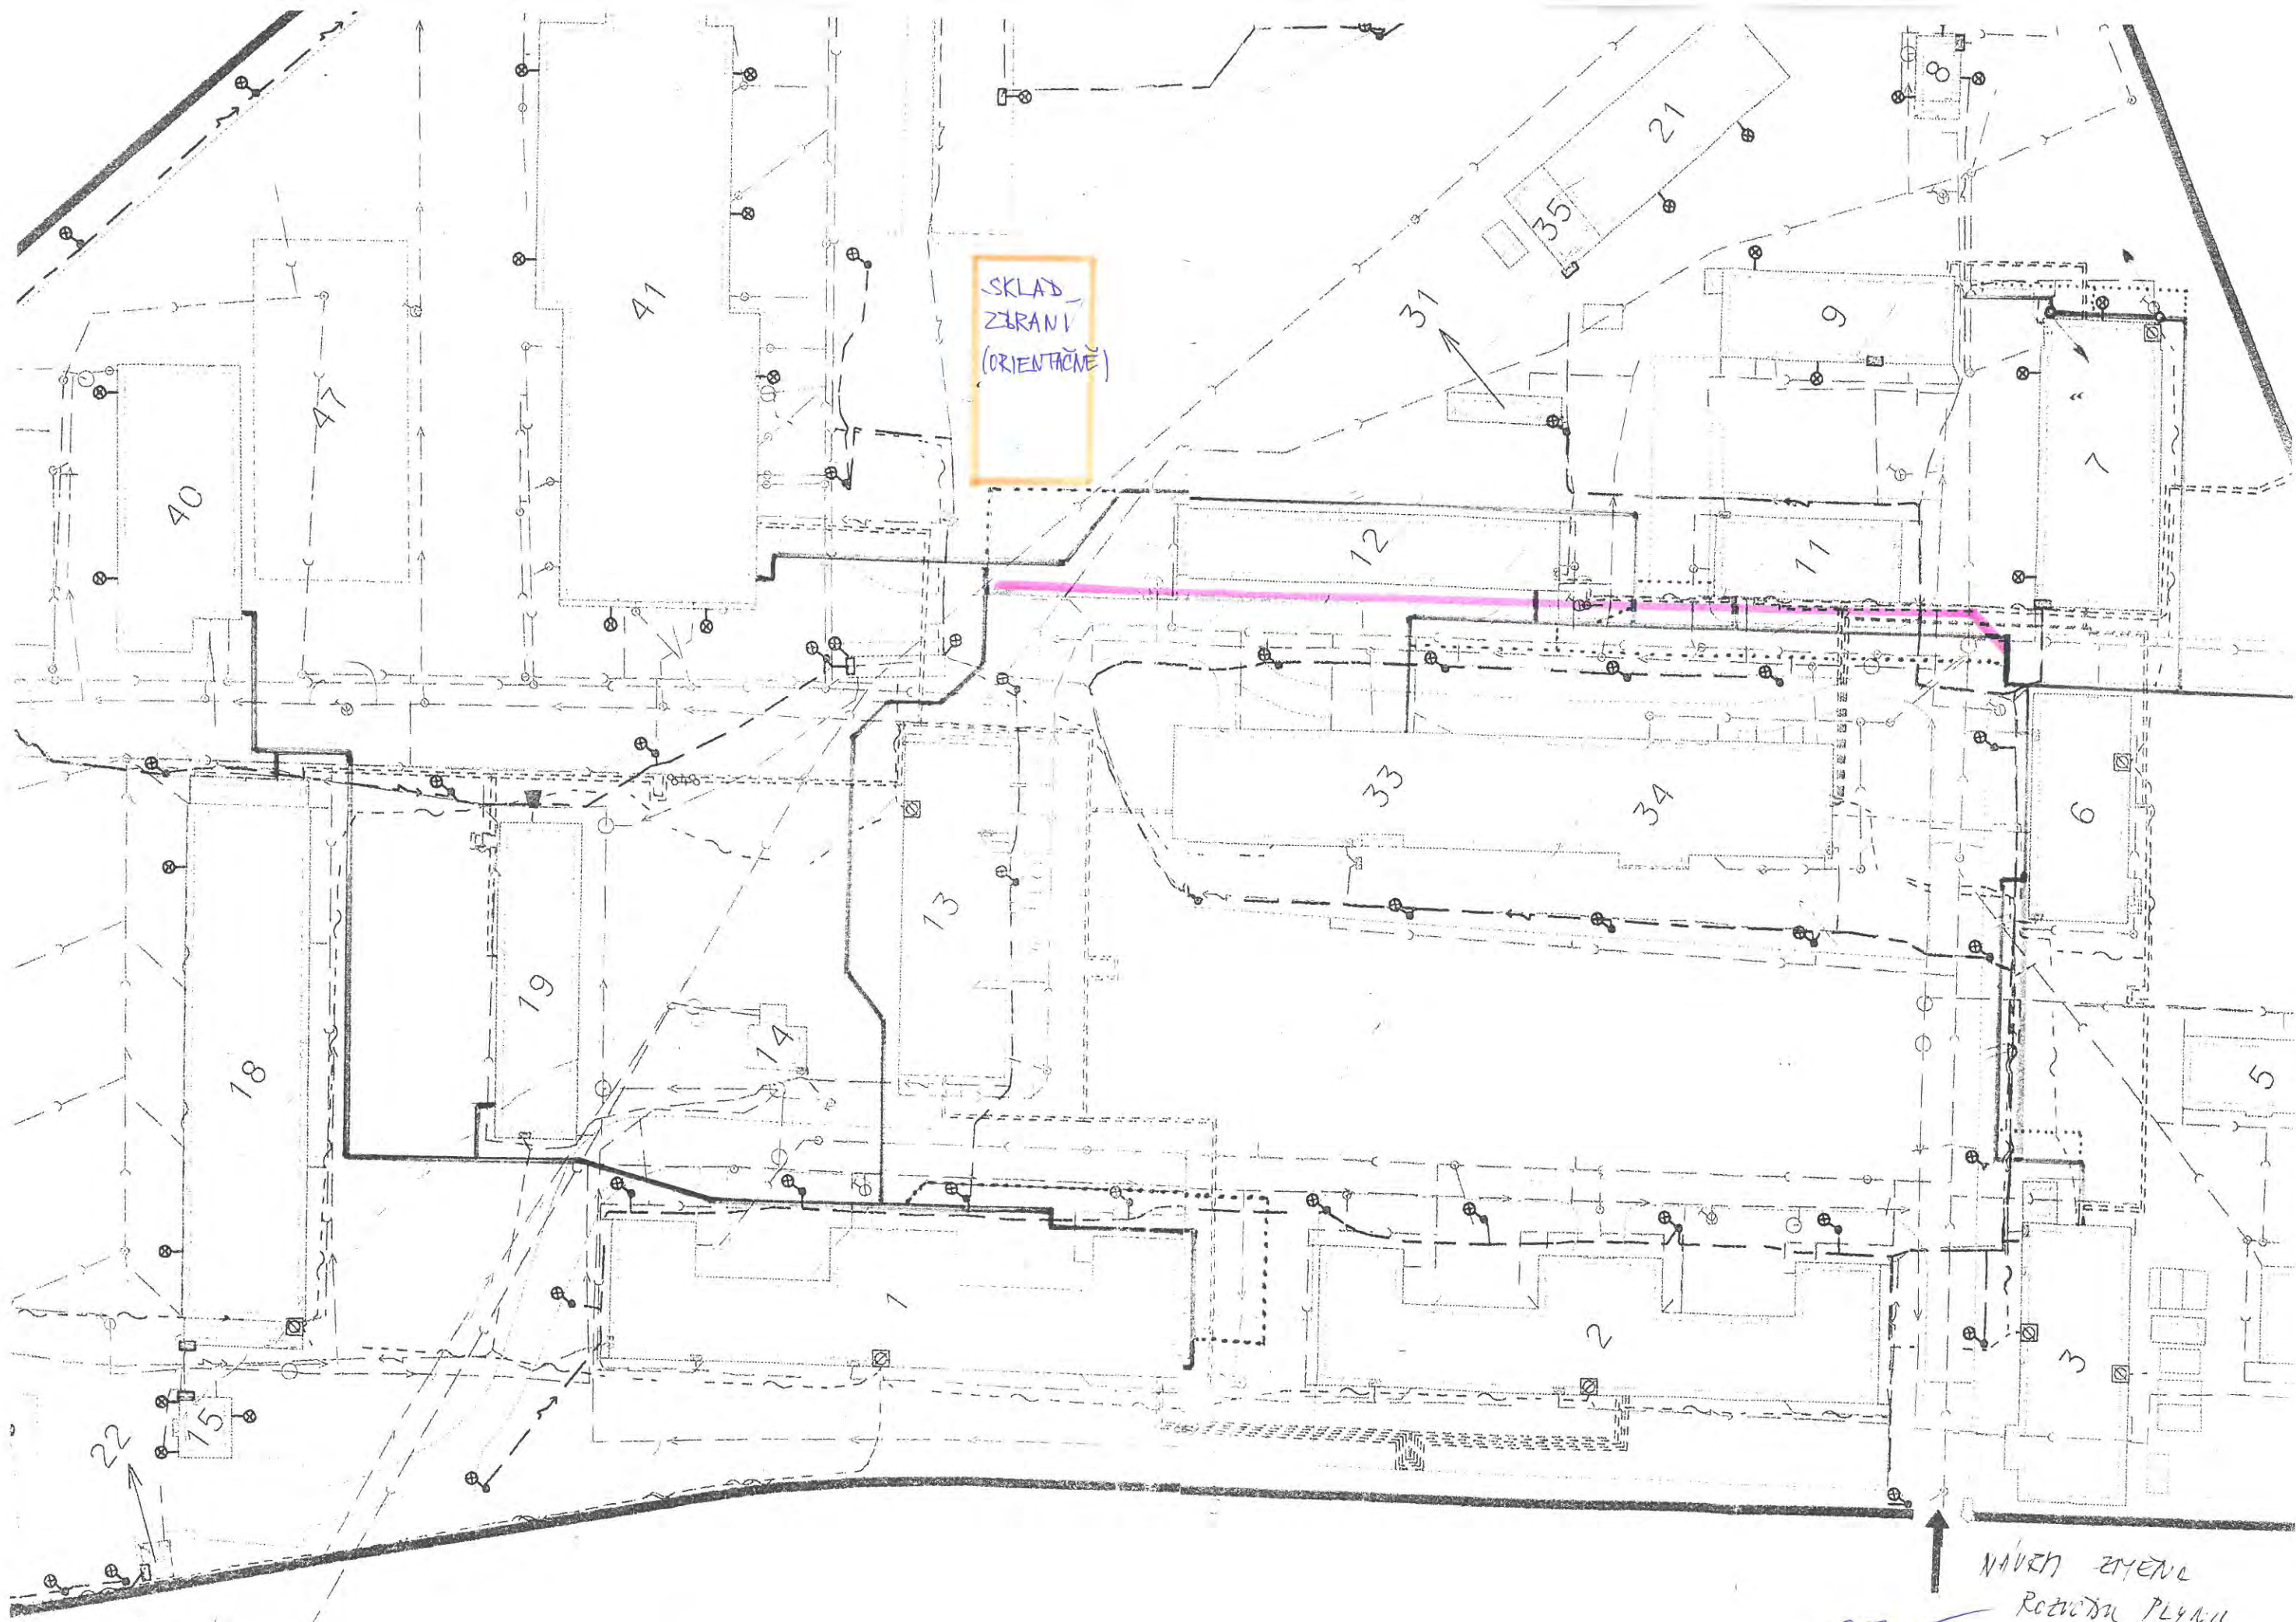

SKLAD
ZBRANI
(ORIENTACNE)


NAVEN ZMENU
ROZVEDU PLYNU

8.7.15
[Signature]

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 30	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 100 Rozvody STL plynu v areálu – úprava trasy			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 30	
		Fotodokumentace skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Trasa nového plynovodu za objektem SO 12 je v kolizi s novým plánem výstavby v areálu VU Bučovice, který v tomto prostoru počítá s výstavbou nového objektu skladu.			
<u>Projektové řešení</u> Trasa plynovodu je vedena v zeleném pásu za objektem SO 12, v době zpracování PD nebyla informace o výstavbě skladu projektantovi známa.			
<u>Navrhované řešení</u> Trasa plynovodu „řad 1“ bude vedena ve zpevněné ploše před budovou SO 12. Přípojky pro objekt SO 12 a SO 33 budou napojeny na „řad 1“.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Pavel Omelka		 BOSS montáže, s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Karel Hróz		 SAFETY PRO, s.r.o.	

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Investor:Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa

Armádní Servisní, p.o.

Zástupce uživatele:

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Přílohy :

- dle textu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... - 43.277,60 Kč

Cena změny + 68.156,15 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 24.878,55 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:




Datum:

30. 09. 2015







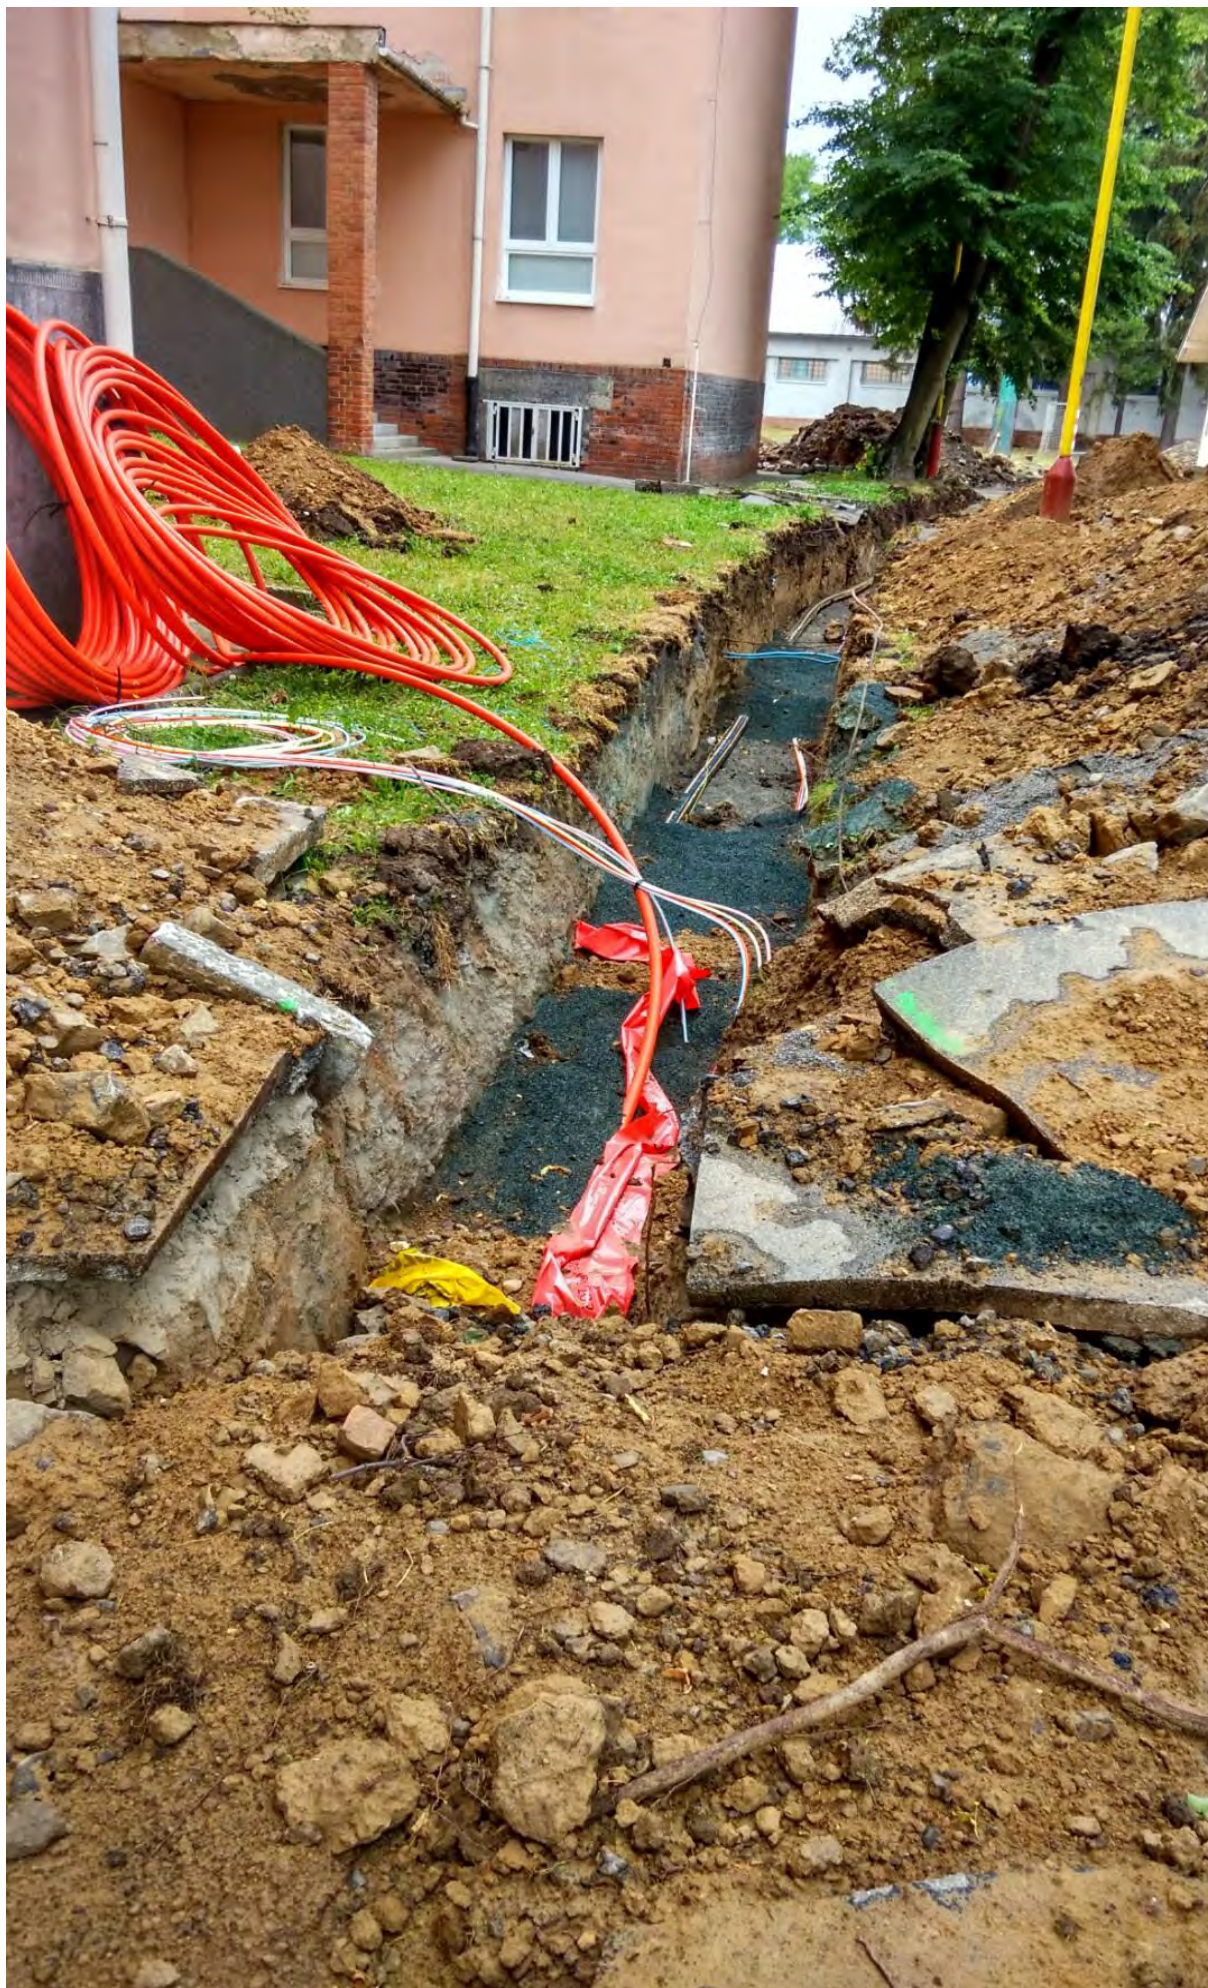

Stavba: **Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice**
Objekt:

Místo:		Datum:	30.9.2015
Zadavatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Projekt:	VPÚ Plzeň s.r.o.
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o.		

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Objekt: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice
ZL č. 30 - SO 100 Rozvody STL plynu v areálu - úprava trasy - méněpráce

Místo:		Datum:
Zadavatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Projekt: VPÚ Plzeň s.r.o.
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o.	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem bez DPH							[[CZK]]
D	D2	001: Zemní práce					-24 628,60
4 K	Pol229	Skládkovné - zemina (53 x 0,545 x 0,9) x 1,35	t	-35,00	42,5	-1 487,50	
18 K	132301202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3 (53,0 x 1,3 x 0,9)	m3	-49,12	225	-11 051,75	
19 K	132301209	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepidlost horniny - hornina 4 (53,0 x 1,3 x 0,9)	m3	-62,00	24	-1 488,00	
20 K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložené, hloubka do 2 m	m2	-62,00	42,5	-2 635,00	
22 K	161101101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-62,00	35	-2 170,00	
23 K	162201601	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu - hornina 1až 4, vzdálenost do 20 m	m3	-62,00	15	-930,00	
24 K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m (53,0 x 0,545 x 0,9)	m3	-25,90	132,5	-3 431,75	
26 K	171201201	Uložení sypaniny - na skládku (53,0 x 0,545 x 0,9)	m3	-25,90	8	-207,20	
27 K	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se ztuhnutím (53,0 x 0,755 x 0,9)	m3	-36,10	34	-1 227,40	
D	D3	004: Vodorovné konstrukce				-10 360,00	
31 K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm (53,0 x 0,545 x 0,9)	m3	-25,90	400	-10 360,00	
D	D5	008: Trubní vedení				-7 209,00	
42 K	Pol234	Elektrovarovky - elektrokoleno 90 st. - d 90	kus	-3,00	620	-1 860,00	
59 K	Pol251	Trubka polyetylenová plynová - PE 100, SDR 11, PN 16, DN 40, tl. stěny 3,7 mm	m	-15,00	28	-420,00	
63 K	Pol255	Trubka polyetylenová - plynová , DN 90, tl. stěny 5,2 mm	m	-12,00	90	-1 080,00	
80 K	871241121	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - tlakové trubky polyetylenové, vnější průměr 90 mm	m	-12,00	52	-624,00	
77 K	871171121	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - tlakové trubky polyetylenové, vnější průměr 40 mm	m	-15,00	28	-420,00	
87 K	877241121	Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - vnější průměr 90 mm	kus	-3,00	215	-645,00	
D	D7	021: Silnoproud				-432,00	
105 K	Pol275	Vodič CY 6 volně uložený	m	-27,00	4	-108,00	
106 K	Pol276	Vodič CY 6mm	m	-27,00	12	-324,00	
D	D9	046: Zemní práce pro montážní práce				-648,00	
111 K	Pol281	Zakrytí - folie PVC 33 cm	m	-27,00	24	-648,00	
		Součet				-43 277,60	
		Celkem méněpráce bez DPH				-43 277,60	

Změnový list č. 30 - rozpočet /str.2/

Stavba:

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt:

ZL č. 30 - SO 100 Rozvody STL plynu v areálu - úprava trasy - vícepráce

Místo:

Datum: 30.9.2015

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projekt: VPÚ Plzeň s.r.o.


Zhotovitel:

BOSS montáže, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C]:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem bez DPH							[CZK]
D	D2	001: Zemní práce					68 156,15
3 K	Pol71	Skládkovné - živice (28 x 0,17) x 2,3	t	10,92	75		24 129,75
4 K	Pol229	Skládkovné - zemina (18,9 x 1,8)	t	34,00	42,5		819,00
5 K	Pol230	Skládkovné - suť (28 x 0,35 x 2,5)	t	24,60	75		1 445,00
7 K	113107113	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivě do 200 m2 - z kameniva	m2	28,00	75		1 845,00
10 K	113107146	těženého, tloušťka vrstvy přes 200 do 300 mm (30 x 0,93)	m2	28,00	270		2 100,00
12 K	113201112	Odstanění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm (30 x 0,93)	m	2,00	52,5		7 560,00
15 K	119001422	Vytrhání obrub - silniční ležaté, s vybouráním lože	m	12,00	137,5		105,00
18 K	132301202	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet přes 3 do 6 kabelů	m3	18,90	225		1 650,00
19 K	132301209	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3 (16,15 x 1,3 x 0,9)	m3	18,90	225		4 252,50
22 K	161101101	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 4	m3	18,90	24		453,60
23 K	162201601	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,90	35		661,50
24 K	162701105	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu - hornina 1až 4, vzdálenost do 20 m	m3	18,90	15		283,50
26 K	171201201	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,90	132,5		2 504,25
27 K	174101101	Uložení sypaniny - na skládku	m3	18,90	8		151,20
D	D3	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním (30 x 0,325 x 0,9)	m3	8,80	34		299,20
31 K	451572111	004: Vodorovné konstrukce					3 780,00
D	D4	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm (30 x 0,35 x 0,9)	m3	9,45	400		9 314,00
32 K	566903111	Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním - kamenivo hrubé drcené (30 x 0,9 x 0,3) x 1,8	t	14,60	260		3 796,00
33 K	566904111	Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním - živichá směs - kamenivem obalovaným asfaltem (30 x 0,9 x 0,05) x 2,3	t	3,10	660		2 046,00
35 K	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překozech pro inženýrské sítě - asfaltový beton, tloušťka po zhutnění přes 50 do 70 mm (30 x 0,93)	m2	28,00	124		3 472,00
D	D6	009: Ostatní konstrukce a práce					30 932,40
91 K	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou a lože z betonu	m	2,00	211		422,00
94 K	919731123	prostého tř. C 12/15	m	56,00	48		2 688,00
95 K	919735116	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichého - tloušťka přes 100 do 200 mm (2 x 28)	m	56,00	278		15 568,00
101 K	979082212	Rezáni stávajícího živichého krytu nebo podkladu - hloubka přes 250 do 300 mm (2 x 28)	t	35,52	165		5 860,80
102 K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu - s naložením a se složením, do 50 m	t	35,52	40		1 420,80
103 K	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu - bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, do 1 km	t	497,28	10		4 972,80
		Příplatek k ceně vodorovná doprava suti po suchu - za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		součet					68 156,15
		Celkem vícepráce bez DPH					68 156,15

OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 31	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 100 Rozvody STL plynu v areálu – směrové značení plynovodu			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.6.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:		Popis	
		Orientační schéma osazení sloupků a tabulek	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Nový plynovod SO 100 je veden v areálu VU Bučovice v zemní rýze dle schválené PD. Trasa plynovodu není nijak značena.			
<u>Projektové řešení</u>			
Projektová dokumentace neřeší nadzemní značení lomových bodů a odboček na plynovodním podzemním vedení.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Dle požadavku MO SOD budou lomové body a odbočky na podzemním plynovodu značeny štítky, které budou umístěny na fasádách okolních budov. Při volném vedení plynovodu v terénu budou nad plynovodem osazeny směrové sloupky.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Celkem bude osazeno 9 tabulek na sloupky a 31 tabulek na fasády objektů.			
 BOSS montáže, s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Dle požadavku MO SOD se jedná o nezbytně nutné opatření. S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: Ing. Karel Hróz




SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Bez připomínek.

Jméno: Ing. Jiří Babor




Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s požadavkem státního odborného dozoru.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Jedná se o vícepráce / méněpráce / změna rozsahu položky / změna řešení.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 31	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice			
Předmět změny: SO 100 Rozvody STL plynu v areálu			
– směrové značení plynovodu			
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 31	
		Ilustrační fotodokumentace	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Nový plynovod SO 100 je veden v areálu VU Bučovice v zemní rýze dle schválené PD. <u>Projektové řešení</u> Projektová dokumentace neřeší nadzemní značení lomových bodů a odboček na plynovodním podzemním vedení. <u>Navrhované řešení</u> Dle požadavku SOTD budou lomové body a odbočky na podzemním plynovodu značeny přednostně štítky, které budou umístěny na fasádách okolních budov. Při volném vedení plynovodu v terénu budou nad plynovodem osazeny směrové sloupky.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Karel Hróz  SAFETY PRO, s.r.o.			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jiří Babor

.....
Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa.....
Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :


- dle textu

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená)..... -----

Cena změny 21.287,00 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	21.287,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 09. 2015



ZL č. 31



Změnový list č. 31- fotodokumentace

VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Stavba:

30.9.2015

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice

Objekt:

Směrové značení plynovodu VÚ Bučovie

Příloha ZL č. 31 - SO 100

BOSS montáže, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	
						J.cena [CZK]	[CZK]
1			ocelový sloupek s betovou patkou 2,1 m	ks	9	860	7740
			tabulka B s nápisem PLYN	ks	9	100	900
			zadní plastová stěna na sloupky	ks	9	70	630
			objímka plastová	ks	9	120	1080
		M-23022-0011	osazení sloupku do terénu	ks	9	266,2	2396,0
2			tabulka B s nápisem PLYN	ks	31	100	3100
			písmena a čísla	ks	110	9	990
			mezerník	ks	29	6,5	188,5
		82771-2111	kompletace a montáž tabulek na stěnu	ks	31	137,5	4262,5

Součet**21 287,0****Celkem bez DPH****21 287,0**

Příloha: faktura dodavatele DISA s.r.o.

Horáček, 777 799 002
BOSS montáže, s.r.o.

PŘÍLOHA FAKTURY Č.: 15260863

.o.

/84/1

JO Brno - Lesná

: 00420 548141211, Fax: 00420 545222706

DODAVATEL: DISA s.r.o.
adresa: Barvy 784/1
638 00 Brno - Lesná

ODBĚRATEL: BOSS montáže, s.r.o.
adresa: Družstevní 184
685 01 Bučovice
Česká republika

IČO dodavatele: 29380367
DIČ dodavatele: CZ29380367

IČO odběratele: 27703118
DIČ odběratele: CZ27703118

datum vystavení: 20.8.2015
zakázka: ZA15-26943
vyřizuje: Paní Ivana Zoubková

Vaše objednávka: e-mail
ze dne: 14.8.2015

POZ. OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA	Celkem bez DPH	DPH
001 TOG-832523	Sloupek z potahované oceli s patkou, průměr 46 mm, výška 2,1 metru, černé a žluté pruhy	9 ks	860,00	7 740,00	21%
002 TOG-810413	Tabulka typ B, bez des.čárek, nápis "PLYN", žlutá	40 ks	100,00	4 000,00	21%
003 TOG-830009	Zadní plastová stěna typ B	9 ks	70,00	630,00	21%
004 TOG-831000	Objímka průměr 48 mm, plastová	9 ks	120,00	1 080,00	21%
005 TOG-838020	Vrut 5,5x16 mm (100 kusů)	0,2 bal.	420,00	84,00	21%
006 TOG-820013	"0", bílá na žlutém poli	6 ks	9,00	54,00	21%
007 TOG-820113	"1", bílá na žlutém poli	12 ks	9,00	108,00	21%
008 TOG-820213	"2", bílá na žlutém poli	10 ks	9,00	90,00	21%
009 TOG-820313	"3", bílá na žlutém poli	14 ks	9,00	126,00	21%
010 TOG-820413	"4", bílá na žlutém poli	9 ks	9,00	81,00	21%
011 TOG-820513	"5", bílá na žlutém poli	5 ks	9,00	45,00	21%
012 TOG-820613	"6/9", bílá na žlutém poli	5 ks	9,00	45,00	21%
013 TOG-820713	"7", bílá na žlutém poli	6 ks	9,00	54,00	21%
014 TOG-820813	"8", bílá na žlutém poli	1 ks	9,00	9,00	21%
015 TOG-822113	"L", bílé na žlutém poli	13 ks	9,00	117,00	21%
016 TOG-821113	"B", bílé na žlutém poli	21 ks	9,00	189,00	21%
017 TOG-820013	"0", bílá na žlutém poli	8 ks	9,00	72,00	21%
018 TOG-829133	Mezerník, 1 pole, žlutý	29 ks	6,50	188,50	21%
019	Přepravné a balné	1	750,00	750,00	21%
Zúčtování zálohových plateb					
021	Záloha ze dne 19.8.2015 zúčtovaná daňovým dokladem č. 15400019	1	-15 462,50	-15 462,50	21%

OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 32	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 500 posílení el. příkonu varny				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.6.2015		
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒				
Odkazy:		Popis Fotodokumentace stávajícího stavu Požadavek Provozního střediska AHNM		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V současné době je z hlavní rozvodny u objektu SO 03 do budovy kuchyně SO 33 veden zemní kabel AYKY 3x120+70, ukončený v rozvodné instalační skříni (dále jen RIS). Stávající kabel AYKY 3x95+50 je také nevyhovující z důvodu záměny kotlů. <u>Projektové řešení</u> V projektové dokumentaci byl příkon počítán na 3x elektrický varný kotel o obsahu 100 litrů, 1x elektrický konvektomat 20 GN, 1x elektrická fritéza 2 x 15 litrů a 1x elektrická smažicí pánev. Dodávka těchto zařízení nebyla předmětem stavby. <u>Navrhované řešení</u> Na základě dodání vybavení varny, které bylo jiné, než projektem uvažované, je kabel pro kuchyň nedostačující a je potřeba upravit navržený přívod varny a posílit jej. Z hlavní rozvodny SO 03 do budovy SO 33 budou vedeny v zemní rýze 2 kabely AYKY 3x185+95. Odvodní kabel z RIS vedený pod fasádou objektu SO 33 bude CYKY 3x185+95. Rozvaděč kuchyně bude doplněn o jistící a ovládací prvky a bude navýšen hlavní provozní chránič z 300 na 400 A. Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Oznámení vydává: zhotovitel Provést změnu dle výše popsaného navrženého řešení. Původní řešení příkonu je díky vzniklé situaci nedostačující.  BOSS montáže, s.r.o.				

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Změna je vyvolána záměnou rozdílného vybavení varny, nedala se předvídat a je nutné se přizpůsobit dodanému vybavení. Doporučuji navržené řešení, vč. postupu a souhlasím s provedením.

Jméno: Ing. Karel Hróz



SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

V rámci změny oproti skutečnosti v dodaném vybavení varny projektant zpracuje tento popsany návrh řešení i výkaz výměr a zhotovitel poté ocení.

Jméno: Ing. Jiří Babor



Jiří Babor

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením.

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková



Armádní Servisní, p.o.


Stanovisko provozního střediska AHNM:

Vynucená změna vznikla na základě dodání jiných přístrojů varny, než bylo požadováno. Proto bylo potřeba přepočítat a upravit projektovou dokumentaci SO 500.

Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS



Ing. Aleš PINKAS



AHNM Praha, PS 0624 Vyškov

Poznámky:


Jedná se o vícepráce / méněpráce / změnu rozsahu položky / změnu řešení.

02č. 32

přívodní
pojizd
sériu



Staršího rozvodně R - kuchyni

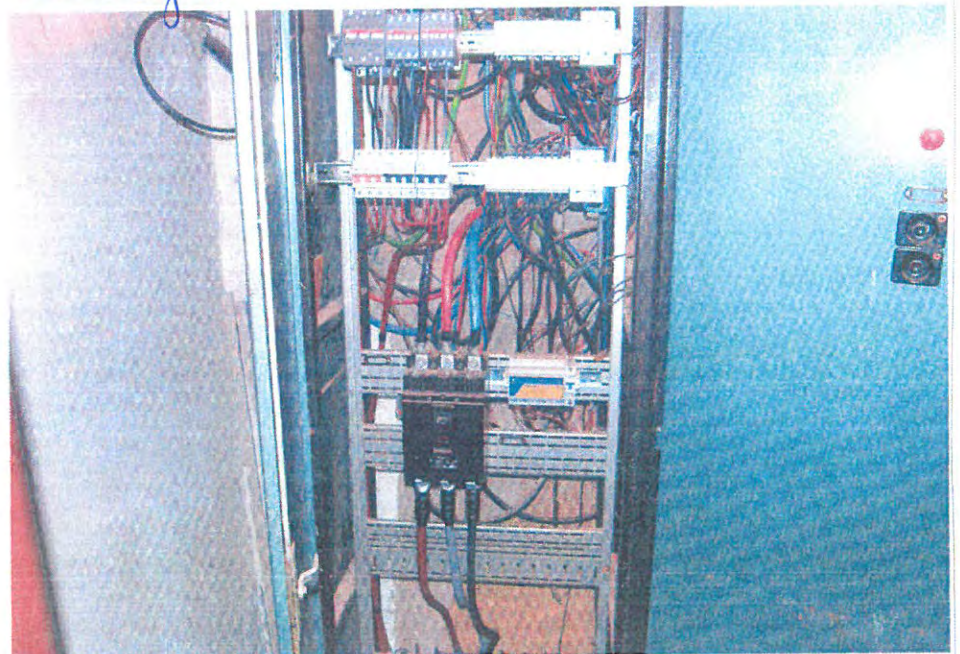

Provozní středisko 0624 Vyškov

V Bučovicích dne 8. 6. 2015

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1

**Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Monika Rešl Kletečková
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 - Dejvice**


Věc: Požadavek na posouzení el. přípojky

Na základě zápisu z kontrolního dne stavby č. 10 - Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice předkládám žádost a požaduji posoudit, přepracovat projektovou dokumentaci SO 500 - posílení el. příkonu varny v obj SO č. 33 - kuchyň, včetně jištění budovy a dimenze přívodních kabelů k vypínačům jednotlivých zařízení VKZ. Dle propočtů může být příkon budovy navýšen až o 66 kW oproti zpracované projektové dokumentaci VPÚ Plzeň s.r.o.. Toto navýšení příkonu vyplynulo z dodávky jiných typů el. varných kotlů.

**Vyřizuje:
energetik PS 0624**

Petr Diviš tel.: 973454773


**Vedoucí PS 0624 Vyškov
Ing. Aleš Pinkas**




ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 32	
Název akce: Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad VÚ Bučovice				
Předmět změny: SO 500 posílení el. příkonu varny				
Zhotovitel:	BOSS montáže, s.r.o., Družstevní 184, 685 01 Bučovice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace		Datum: 30.9.2015	
Způsob odeslání / předání				
		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady:		Oznámení změny č. 32		
		Fotodokumentace + Výkresová část		
		Rozpočet		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V současné době je z hlavní rozvodny u objektu SO 03 do budovy kuchyně SO 33 veden zemní kabel AYKY 3x120+70, ukončený v rozvodné instalační skříni (dále jen RIS). Stávající kabel AYKY 3x95+50 je také nevyhovující z důvodu záměny kotlů. <u>Projektové řešení</u> V projektové dokumentaci byl příkon počítán na 3x elektrický varný kotel o obsahu 100 litrů, 1x elektrický konvektomat 20 GN, 1x elektrická fritéza 2 x 15 litrů a 1x elektrická smažicí pánev. Dodávka těchto zařízení nebyla předmětem stavby. <u>Navrhované řešení</u> Na základě dodání vybavení varny, které bylo jiné, než projektem uvažované, je kabel pro kuchyň nedostačující a je potřeba upravit navržený přívod varny a posílit jej. Z hlavní rozvodny SO 03 do budovy SO 33 budou vedeny v zemní rýze 2 kabely AYKY 3x185+95. Odvodní kabel z RIS vedený pod fasádě objektu SO 33 bude CYKY 3x185+95. Rozvaděč kuchyně bude doplněn o jističí a ovládací prvky a bude navýšen hlavní provozní chránič z 300 na 400 A. Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒ Zhotovitel V případě provedení elektroinstalace jak bylo navrženo v PD a vzhledem k jinému dodání vybavení varny, by byl ohrožen chod kuchyně (ať už výpadky či spálením elektro příslušenství). Proto souhlasíme s přepracováním PD dle skutečně dodaných spotřebičů. Jméno: Ing. Pavel Omelka  BOSS montáže, s.r.o.				

Technický dozor stavebníka



Jméno: Ing. Karel Hróz


SAFETY PRO, s.r.o.**Autorský dozor projektanta stavby**

Jméno: Ing. Jiří Babor


Jiří Babor**Investor:**Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
nebo Bc. Petr Kroupa
Armádní Servisní, p.o.**Zástupce uživatele:**


Jméno: Ing. Aleš Pinkas, vedoucí PS


Ing. Aleš PINKAS
AHNM Praha, PS 0624 Vyškov**REKAPITULACE CENY:**

Cena dle nabídky (vysoutěžená) - 104.522,00 Kč

Cena změny + 238.654,35 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :	+134.132,35 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum: 30. 11. 2015

ZL č. 32

Skutečné provedení

Změnový list č. 32 - fotodokumentace

Rozvoděč R - kuchyň




Změna přívodních a odvodních
kabelů
- pojistková skříň



Změnový list č. 32 - výkres s umístěním rozvaděče

02c. 32

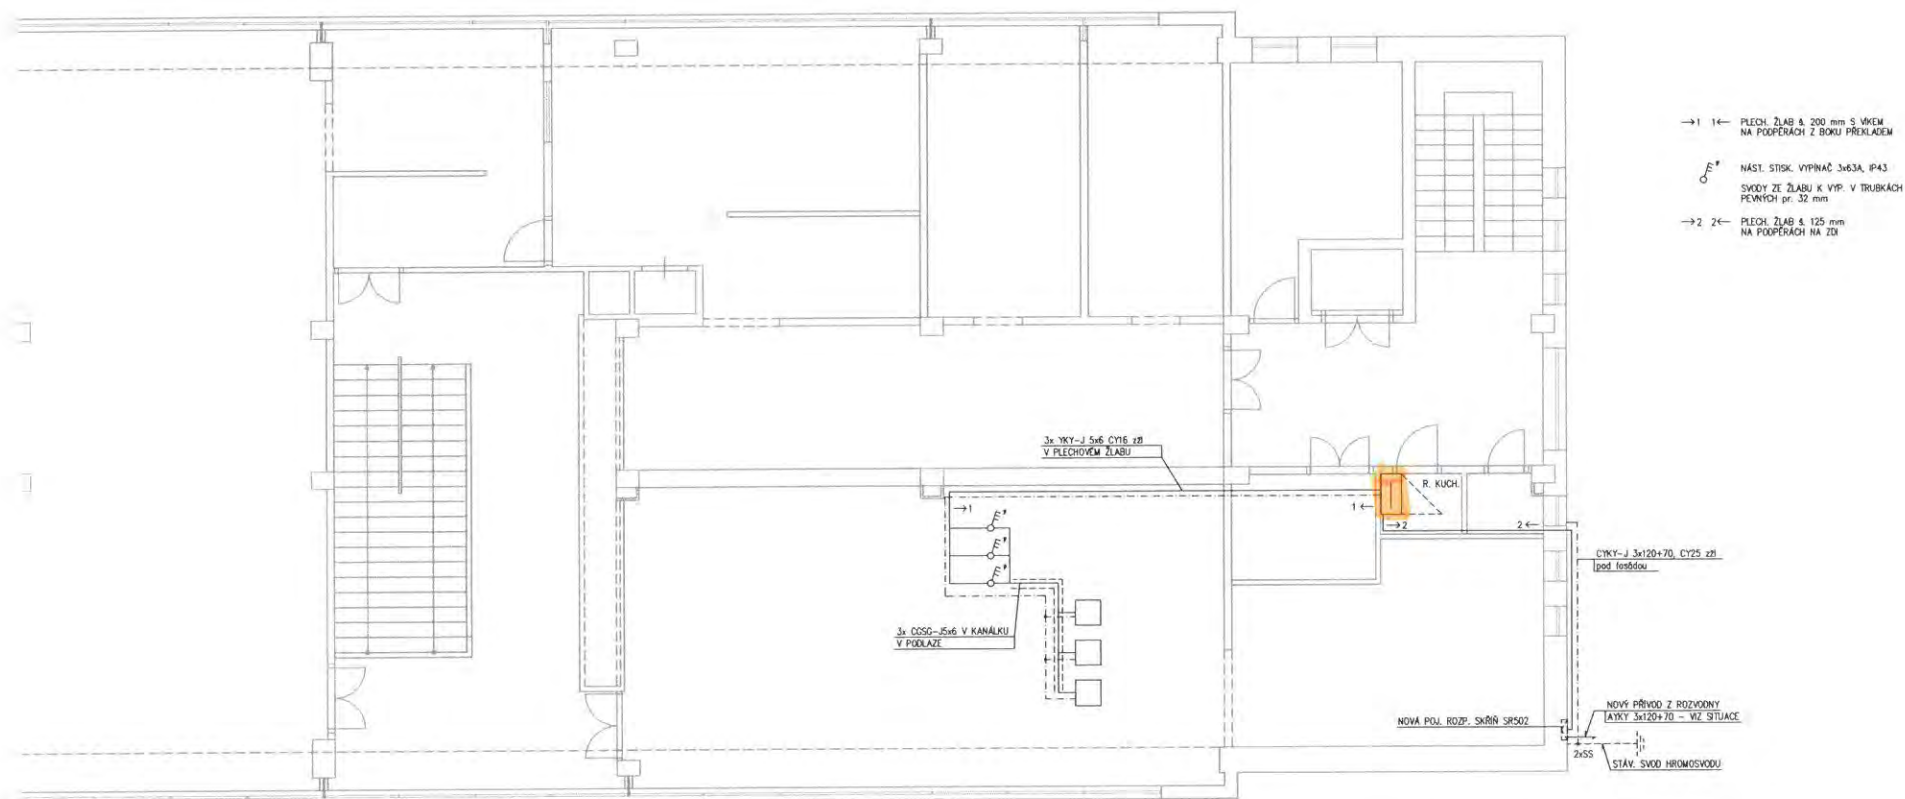

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	ANPU		
	Ing. Jaroslav Chmelík		Ing. J. Babor	Kotelnická 162, 326 00 PLZEŇ Tel. 377 447 912 Fax. 377 447 917 ICO: 4 91 541 611 PLZEŇ spol. s r.o. DIČ: CZ 49194100		
OBEC, KRAJ: Bučovice, Jihomoravský				DRUH PD	DSP + DPS	
INVESTOR: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6				ČÍSLO ZAKÁZKY	4424/01-600	
AKCE: Zpracování projektové dokumentace PLYNOFIKACE KASÁREN JIRÍHO Z PODĚBRAD VŮ BUČOVICE				FORMÁTY A4	4	
				DATUM	08/2013	
				MĚRITKO	1:100	
OBSAH: SO 003 Ubytovna c. Elektroinstalace ROZVODY V OBJ. KUCHYNĚ				Č.VYHOTOV.	DIL	Č. PŘÍLOHY
					F	c.4

Změnový list č. 32 - rozpočet - původní x nový

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad, VÚ Bučovice

Méněpráce - výkaz výměr

SO 500 Posílení el. příkonu varny v obj. 033

	mj	Počet	JC	Celkem
Dodávka				
Úprava rozvaděče v rozvodně obj.003				
Jistič 300A/3	ks	1	-5000	-5000
Pojistková patrona 250A	ks	3	-100	-300
Izol. Obal konce kabelu AYKY 3x240+12	ks	2	-510	-1020
Pojistková skříň SR 502	ks	1	0	0
Rozvaděč Rkuch dle výkresu	ks	1	-56400	-56400
Materiál				
Kabel AYKY 3x120+70	m	95	-168	-15960
Kabel CYKY 3x120+70	m	30	-850	-25500
Kabel CYKY-J 5x6	m	56	0	0
Šňůra CGSG 5x6	m	27	0	0
Vodič CY 25 zelenožlutý	m	25	0	0
Vodič CY 16 zelenožlutý	m	40	0	0
Žlab plechový š.125 mm vč. podpěr	m	5	0	0
Víko žlabu š.125 mm	m	5	0	0
Žlab plechový š. 250 mm vč. podpěr	m	9	0	0
Trubka pevná pr. 32	m	12	0	0
Vypínač stiskací 3x63A, IP 43 nást.	ks	3	0	0
Svorka Bernard vč.Cu pásku	ks	6	0	0
Drobný elinst.materiál	kpt	1	0	0
Montáž				
Materiál dle spec.	kpt	1	0	0
Úpravy rozvaděče v obj. 003	hod	12	0	0
Výměna pojistkové skříně	hod	12	0	0
Montáž rozvaděče (pole) Rkuch	ks	1	0	0
Ukončení kabelu do 120	ks	6	-57	-342
Zemní práce				
Sekání drážky	m	10	0	0
Kanálek v podlaze š. 20 cm	m	8	0	0
Výkop š. 35 cm, hl. 60 cm	m	14	0	0
Výkop š. 35 cm, hl. 120 cm	m	7	0	0
Zához š. 35 cm, hl.60 cm	m	14	0	0
Zához š. 35 cm, hl. 120 cm	m	7	0	0
Pískové lože	m	14	0	0
Beton.lože	m	7	0	0
Krycí deska d. 1 m	ks	90	0	0
Ochranná fólie	m	90	0	0
Ostatní				
Koordinace s profesemi	hod	8		
Zaměření a vytyčení podzemních sítí	kpt	1		
Zaměření kabelové trasy	kpt	1		
Dokumentace skut.provedení	kpt	1		
Výchozí revize	kpt	1		
součet bez DPH méněpráce				-104522

Pozn. Není zahrnuto příp. rozšíření výkopu společné trasy plynu a el. přípojky.
Vzdálenost okraje plynového potrubí od kabelu NN musí být min. 60 cm!!!

Plynofikace kasáren Jiřího z Poděbrad, VÚ Bučovice

Vícepráce - výkaz výměr

SO 500 Posílení el. příkonu varny v obj. 033

Specifikace materiálu změna

	MJ	Počet	JC	Celkem
Dodávka				
Úprava rozvaděče v rozvodně obj.003				
Jistič 400A/3	ks	1	14 175	14 175
Pojistková patrona 350A	ks	3	165	495
Izol. Obal konce kabelu AYKY 3x185+90	ks	2	510	1 020
Pojistková skříň SR 502 (300 A)	ks	1	0	0
Rozvaděč Rkuch dle výkresu	ks	1	76 465	76 465
Kabel AYKY 3x185+90	m	190	260	49 400
Kabel CYKY 3x185+90	m	30	1 428	42 840
Kabel CYKY-J 5x6	m	29	61	1 769
Šňůra CGSG 5x6	m	3	100	300
Vodič CY 25 zelenožlutý	m	25	0	0
Vodič CY 16 zelenožlutý	m	20	29	580
Žlab plechový š.125 mm vč. podpěr	m	8	121	968
Víko žlabu š.125 mm	m	8	39	312
Žlab plechový š. 250 mm vč. podpěr	m	1	188	188
Trubka pevná pr. 32	m	21	17	357
Vypínač stiskací 3x63A, IP 43 nást.	ks	2	633	1 266
Svorka Bernard vč.Cu pásku	ks	6	0	0
Drobný elinst.materiál	kpt	1	3 289	3 289
Víko žlabu š.250 mm	m	10	185	1 850
Krabice ACIDUR (ukončení pro R-kotle)	ks	2	141	282
CYKY-J 5 x 10	m	30	123	3 690
CGSG 5 x 10	m	30	195	5 850
Vypínač stiskací 3x32A, IP 43	ks	1	625	625
trubka FX 32	m	60	22	1 320
CYKY 5x16 (konvektomat)	m	5	201	1 005
Montáž				
Materiál dle spec.	kpt	1	26 808	26 808
Úpravy rozvaděče v obj. 003	hod	12	0	0
Výměna pojistkové skříně	hod	12	0	0
Montáž rozvaděče (pole) Rkuch	ks	1	1 500	1 500
Ukončení kabelu do 185	ks	6	72	432
Zemní práce				
Sekání drážky pro větší kabel	m	3,75	80	300
Kanálek v podlaze š. 20 cm	m	1,33	120	159,60
Výkop š. 35 cm, hl. 60 cm	m	14	0	0
Výkop š. 35 cm, hl. 120 cm	m	7	0	0
Zához š. 35 cm, hl.60 cm	m	14	0	0
Zához š. 35 cm, hl. 120 cm	m	7	0	0
Pískové lože	m	14	0	0
Beton.lože	m	7	0	0
Krycí deska d. 1 m	ks	90	0	0
Ochranná fólie	m	90	0	0
Ostatní				
Koordinace s profesemi	hod	8		
Zaměření a vytyčení podzemních sítí	kpt	1		
Zaměření kabelové trasy	kpt	1		
Dokumentace skut.provedení	kpt	1		
odstranění betonového krytu	m2	2,5	410	1 025
kryt z betonu prostého	m2	2,5	153,50	383,75
součet bez DPH vícepráce				238 654,35

Pozn. Není zahrnuto příp. rozšíření výkopu společné trasy plynu a el. přípojky.
Vzdálenost okraje plynového potrubí od kabelu NN musí být min. 60 cm!!!
