

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 1

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 30. 11. 2017

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

výkres č. D.1.1.4.3.2

ZL č. 1 - rozpočet

Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a prodloužení termínu dokončení 1. limitního termínu dle SOD (úprava místností pro AKIS č. 1.06, 1.14, 1.15)

Popis a zdůvodnění změny:

- Na žádost objednatele byla provedena úprava silnoproudých instalací v místnostech č. 1.06, 1.14, 1.15 oproti PD. Změna oproti projektové dokumentaci byla v přemístění technologie pro připojení mobilního generátoru a to na východní fasádu. Trasa bude vedena přes místnost 1.06 chodbou v drátěném žlabu. Dále byla požadována změna trasy kabelových žlabů a trasy kabeláže v místnosti číslo 1.14 a to z důvodu kolize s trasami kabelového vedení budoucího uživatele. Dalším důvodem prodloužení 1. Limitního termínu je skutečnost, že zhotoviteli nebyl umožněn přístup do místností č. 1.06 a 1.14 ihned po předání staveniště, ale až v průběhu listopadu, viz zápisy ve stavebním deníku.
Na základě výše uvedeného, bylo zástupci objednatele odsouhlasen prodloužení termínu 1. Limitního termínu dle SOD do 31. 1. 2018. Termín dokončení 1. Limitního termínu dle SOD byl 1 měsíc od předání staveniště.
- Zároveň se vypouští dodávka a montáž vnitřních VZT jednotek – dodávka objednatele a stavební práce v místnosti 1.06.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 1 (VZT)

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	30. 11. 2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a prodloužení termínu dokončení 1. limitního termínu dle SOD (úprava místnosti pro AKIS č. 1.06, 1.14, 1.15)

Popis a zdůvodnění změny:

- Na žádost objednatele byla provedena úprava silnoproudých instalací v místnostech č. 1.06, 1.14, 1.15 oproti PD. Změna oproti projektové dokumentaci byla v přemístění technologie pro připojení mobilního generátoru a to na východní fasádu. Trasa bude vedena přes místnost 1.06 chodbou v drátěném žlabu. Dále byla požadována změna trasy kabelových žlabů a trasy kabeláže v místnosti číslo 1.14 a to z důvodu kolize s trasami kabelového vedení budoucího uživatele. Dalším důvodem prodloužení 1. Limitního termínu je skutečnost, že zhotoviteli nebyl umožněn přístup do místností č. 1.06 a 1.14 ihned po předání staveniště, ale až v průběhu listopadu, viz zápisy ve stavebním deníku.

Na základě výše uvedeného, bylo zástupci objednatele odsouhlasen prodloužení termínu 1. Limitního termínu dle SOD do 31. 1. 2018. Termín dokončení 1. Limitního termínu dle SOD byl 1 měsíc od předání staveniště.

Zároveň se vypouští dodávka a montáž vnitřních VZT jednotek – dodávka objednatele a stavební práce v místnosti 1.06.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-85.078,45 Kč	47.474,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-37.603,95 Kč	<u>31. 1. 2018</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

31. 08. 2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

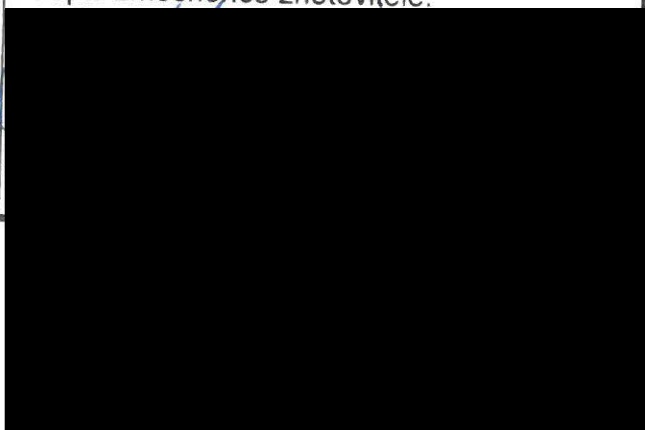

ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: ZL č. 1 - ZL č. 1 - Stavební úpravy v m.č. 1.06, 1.14, 1.15

Místo: Akademia Heyrovského 1216, Hradec Králové Datum: 16. 1. 2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: BKN spol. s.r.o.
 Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové Zpracovatel: Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-37 603,95

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1-1	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2			
1-2	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
1-3	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2			
1-4	K	784221101	Malby z maliřských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže

1-5	K	740R00001	Silnoproudé instalace v místnostech 1. 06, 1. 14, 1. 15 dle dodatečných požadavků objednatele - viz. samostatný rozpočet	kpl			
-----	---	-----------	--	-----	--	--	--

751 - Vzduchotechnika - zařízení č. 6.2

1-6	K	751.R.091	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks			
1-7	M	429.R.092	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka včetně ovladače-dodávka uživatele, Poz.č.6.02 Viz.výkres č. D.1.1.4.3.2	ks			

776 - Podlahy povlakové

1-8	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2			
1-9	K	776251121	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2			
1-10	M	284110699.1	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, elektrostaticky vodivé bude použito přírodní linoleum tl. 2,5mm, které bude nalepeno na samonivelační vyrovnávací stěrku tl. 4 mm, spoje mezi pásy budou svařeny.	m2			

OST - Ostatní

1-11	K	OST000001	Příplatek za bezpečnostní třídu RC3 dveří ozn. D20 a D29 do místnosti č. 1.06, 1.14, 1.15	ks			
1-12	K	OST000002	Samozavírač šaretací	ks			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 2

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 25.1.2018

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

výkres č.

na rozpočtové podklady: **ZL č. 2 - rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Předmětem změny je změna technologie provádění meziokenních piliřů.

Popis a zdůvodnění změny:

- Z důvodu urychlení stavebních prací a většího zabezpečení objektu z hlediska klimatických podmínek navrhuje zhotovitel změnu technologie provádění meziokenních piliřů a to vyzdřením těchto piliřů pórobetonovými tvárnicemi v šíři 250mm a to od stávající podlahy po strop. S tím je spojené odbourání stávajícího piliře vysokého cca 1m. Nový piliř bude uchycen kotvicími páskami ke stropu lodžie. Nové řešení je vhodnější pro kotvení nových oken a balkónových sestav.

Počet připojených listů specifikací: 2


Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

S

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 2
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	25.1.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je změna technologie provádění meziokenních pilířů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z důvodu urychlení stavebních prací a většího zabezpečení objektu z hlediska klimatických podmínek navrhuje zhotovitel změnu technologie provádění meziokenních pilířů a to vyzdáním těchto pilířů pórobetonovými tvárnici v šíři 250mm a to od stávající podlahy po strop. S tím je spojené odbourání stávajícího pilíře vysokého cca 1m. Nový pilíř bude uchycen kotvicími páskami ke stropu lodžie. Nové řešení je vhodnější pro kotvení nových oken a balkónových sestav. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-421.357,10 Kč	408.382,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-12.974,80 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		



ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: ZL č. 2 - Změna provádění MIV

Místo: Akadematika Heyrovského 1216, Hradec Králové Datum: 16. 1. 2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: BKN spol. s.r.o

Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové Zpracovatel: Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 974,80

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2-1	K	341272622	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	171,360		
2-2	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	201,600		
2-3	K	763112390R01	Ozn.X25 Meziokenní izolační panely tl.200 mm,cementovláknité desky s výplní z minerální vaty 2x80 mm,parotěsná folie,vč.spojovacího materiálu a systémových prvků	m2	-171,360		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2-4	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu do 1m3	m3	29,400		
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--

997 - Přesun sutě

2-5	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t	58,800		
2-6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,800		
2-7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	58,800		

998 - Přesun hmot

2-8	K	998011006	Přesun hmot pro budovy zděné v do 52 m	t	30,057		
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 3

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 25.1.2018

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: výkres č.

na rozpočtové podklady: **ZL č. 3 - rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Předmětem změny je odpočet telefonů (pevná linka).

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě rozhodnutí zástupců objednatele a uživatele bylo domluveno, že dodávka a montáž telefonů – pevných linek s nebude realizovat

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 3

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	25.1.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Předmětem změny je odpočet telefonů (pevná linka).

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě rozhodnutí zástupců objednatele a uživatele bylo domluveno, že dodávka a montáž telefonů – pevných linek s nebude realizovat

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-251.664 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-251.664 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 31. 08. 2018

Da



ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: ZL č. 3 - ZL č. 3 - Odpočet telefonů (pevná linka)

Místo: Akademička Heyrovského 1216, Hradec Králové Datum: 16. 1. 2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: BKN spol. s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové Zpracovatel: Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-251 664,00

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

3-1	K	74R položka113	Telefonní přístroj analog (max.množství bude upraveno, dle skutečných potřeb uživatele)	ks			
3-2	M	74R položka109	Telefonní přístroj analog (max.množství bude upraveno, dle skutečných potřeb uživatele)	ks			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 4

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 23. 2. 2018

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **Stavební deník**

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL č. 4 - rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ZL č. 4 - Bourání nesoudržných betonových mazanin na chodbách ve 2. 15. NP., bourání lodžii

Popis a zdůvodnění změny:

- Při provádění bouracích prací keramických podlah na chodbách před výtahy, schodišťových chodbách, dlouhé chodby k pokojům a v místnostech, kde bylo dříve sociální zázemí, bylo zjištěno, že podkladní mazanina je nesoudržná s nosnou konstrukcí podlahy a při bourání keramických dlažeb tato mazanina odskakuje zároveň s dlažbou.
- Projektová dokumentace uvádí bourání stávajících betonových mazanin na lodžii. Mazaniny jsou vyztužené rabičovým pletivem a jsou v průměrné tloušťce 70mm. Bylo zjištěno, že betonové mazaniny na lodžii nejsou předmětem realizačního rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

Stanovisko technického dozoru:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 4

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	23. 2. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:


ZL č. 4 - Bourání nesoudržných betonových mazanin na chodbách ve 2. 15. NP., bourání lodžii


Popis a zdůvodnění změny:

- Při provádění bouracích prací keramických podlah na chodbách před výtahy, schodišťových chodbách, dlouhé chodby k pokojům a v místnostech, kde bylo dříve sociální zázemí, bylo zjištěno, že podkladní mazanina je nesoudržná s nosnou konstrukcí podlahy a při bourání keramických dlažeb tato mazanina odskakuje zároveň s dlažbou.
- Projektová dokumentace uvádí bourání stávajících betonových mazanin na lodžii. Mazaniny jsou vyztužené rabičovým pletivem a jsou v průměrné tloušťce 70mm. Bylo zjištěno, že betonové mazaniny na lodžii nejsou předmětem realizačního rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : -348 424,38 Kč	Cena víceprací bez DPH : 1 533 528,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 1 185 104,34 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum: 21. 06. 2018

Da



ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE
Objekt: ZL č. 4 - Bourání nesoudržných betonových mazanin na chodbách ve 2. 15. NP., bourání lodžii
Místo: Akademičtka Heyrovského 1216, Hradec Králové **Datum:** 16. 1. 2018
Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace **Projektant:** BKN spol. s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové **Zpracovatel:** Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 185 104,34

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4-1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - chodby (prům. tl. 40mm)	m3			
4-2	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - bourání lodžii (prům. tl. 70mm)	m3			
4-3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			
4-4	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabičovým pletivem tl do 100 mm - bourání lodžii	m3			

997 - Přesun sutě

4-5	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t			
4-6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
4-7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t			
4-8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
4-9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t			
4-10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			

PSV - Práce a dodávky PSV




711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4-11	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné - podkladní lepenka	m2			
------	---	-----------	---	----	--	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4-12	K	VRN000001	Vedlejší zozpočtové náklady (poměr % z SOD)	%	1		
------	---	-----------	---	---	---	--	--

37 810,09

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 5	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 21. 5. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	e-mailová korespondence		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 5 - rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: ZL č. 05 - Bourání podhledu 1.NP a zapravení stropu omítkou			
Popis a zdůvodnění změny: - Při provádění bouracích prací stěn a demontážních prací VZT v 1.NP byl zjištěn neuspokojivý stav stávajícího podhledu tvořeného železobetonovou skořepinou přivařenou na kovových táhlech ke stropní konstrukci. Z tohoto důvodu se provedlo posouzení stávajícího stavu statikem a je vzhledem k narušení výztuhy těchto stropů korozi, navrženo odstranění těchto podhledových konstrukcí a zapravení prostoru po podhledu omítkou včetně opravy narušené stropní konstrukce a konzervačního nátěru obnažené výztuže.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové tel: +420 495 724 411			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 5

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	23. 2. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL č. 05 - Bourání podhledu 1.NP a zapravení stropu omítkou

Popis a zdůvodnění změny:

- Při provádění bouracích prací stěn a demontážních prací VZT v 1.NP byl zjištěn neuspokojivý stav stávajícího podhledu tvořeného železobetonovou skořepinou přivařenou na kovových táhlech ke stropní konstrukci. Z tohoto důvodu se provedlo posouzení stávajícího stavu statikem a je vzhledem k narušení výztuhy těchto stropů korozi, navrženo odstranění těchto podhledových konstrukcí a zapravení prostoru po podhledu omítkou včetně opravy narušené stropní konstrukce a konzervačního nátěru obnažené výztuže.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,-Kč	557 495,27 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
557 495,27 Kč	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 31. 08. 2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 31. 08.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce internátu FVZ Hradec Králové - PD

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: **ZL č. 05 - Bourání podhledu 1.NP a zapravení stropu omítkou**

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 27.04.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové




Projektant: BKN, spol.s
r.o. Vladislavova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

557 495,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5-1	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2				
	VV		omstrustr					
	VV		Součet					
5-2	K	6-R01	Ochranný nátěr proti pronikání koroze do omítky lokálně 5% v ploše	m2				
5-3	K	611142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stropů	m2				
5-4	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5-5	K	963.R.01	Otlučení maltoviny z kovové konstrukce podhledů tl. 25 mm	m2				
5-6	K	963.R.02	Demontáž podhledové konstrukce tvořené sítí z betonářské výztuže přetažené Rabitzovým pletivem s prokotvením pomocí ocelových táhel do stropní konstrukce Bourání podhledů 1.NP	m3				
	VV		Stávající podhled - plocha 52,87+268,4+27,51+221,11-107,17 = 462,72m2					
	VV							
D	997		Přesun sutě					
5-7	K	979.08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t				
5-8	K	979.08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t				
5-9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
5-10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t				
5-11	K	979.99-0104.R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	784		Dokončovací práce - malby					
5-12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	VV		malby trámů a obvodů					
5-13	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 6	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 23. 2. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 6 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 6 - Plastové výplně otvorů			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - U položky č. 10 uvedený ve výpisu PVC oken v rámci PD je při výměně oken nutné provedení rozšiřovacího profilu širší do 150 - 200 mm při horní hraně okna (v nadpraží). V interiéru je vzhledem k venkovním nadpražím odskok (prefabrikovaný zub o výšce, který je nutné vyrovnat za použití rozšiřovacího profilu. - Je uvažováno s tím, že se nebudou realizovat exteriérové okenní pásy. Při provedení KZS ztrácí tyto pásy funkčnost a je možné je nerealizovat. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 6

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	23. 2. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL č. 6 - Plastové výplně otvorů

Popis a zdůvodnění změny:

- U položky č. 10 uvedený ve výpisu PVC oken v rámci PD je při výměně oken nutné provedení rozšiřovacího profilu šíře do 150 - 200 mm při horní hraně okna (v nadpraží). V interiéru je vzhledem k venkovním nadpraží odskok (prefabrikovaný ozub o výšce, který je nutné vyrovnat za použití rozšiřovacího profilu.
- Je uvažováno s tím, že se nebudou realizovat exteriérové okenní pásy. Při provedení KZS ztrácí tyto pásy funkčnost a je možné je nerealizovat.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 243 349,80 Kč	115 107,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-128 242,80 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



D



ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: ZL č. 6 - Plastové výplně otvorů

Místo: Akadematika Heyrovského 1216, Hradec Králové Datum: 16. 1. 2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: BKN spol. s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové Zpracovatel: Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-128 242,80

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

6-1	K	766R00001	Příplatek za rozšiřovací profil širší do 20cm u pol. č. 10	soub			
6-2	K	766R00002	D+M paropropustné exteriérové pásy	mb			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6-3	K	VRN000001	Vedlejší zozpočtové náklady (poměr % z SOD)	%			
-----	---	-----------	---	---	--	--	--

-4 084,80

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 7

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 23. 2. 2018

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCEZpůsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **e-mailová korespondence**

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL č. 7 - rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ZL č. 7 - Změna technologie provádění bourání prefabrikovaných nosných konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě dorazu zhotovitele na generálního projektanta (e-mail ze dne 16. 2. 2018) a vyjádření Ing. Kopeckého (statik) ze dne 23. 2. 2018 je nezbytná změna provádění technologie bourání nových otvorů do prefabrikovaných nosných vodorovných konstrukcí (vnitřních stěn). Projektová dokumentace počítá a variantou postupným odbouráváním otvorů, který je prořiznut po obvodu stěnovou pilou. Tento postup byl se statického hlediska zamítnut. Zhotovitel navrhuje rozřezání na 8ks kvádrů o hmotnosti 150-200 Kg. Dále dle vyjádření statika je nezbytné bouravé otvory podstojkovat z obou stran stěny a provést aktivaci celé nové konstrukce pomocí potěrového betonu jemného o pevnosti 25MPa. Na jednu pozici bude použito cca 0,15m³ zálivkové hmoty.

Počet připojených listů specifikací: 2




Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 7
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	23. 2. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 7 - Změna technologie provádění bourání prefabrikovaných nosných konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě dorazu zhotovitele na generálního projektanta (e-mail ze dne 16. 2. 2018) a vyjádření Ing. Kopeckého (statik) ze dne 23. 2. 2018 je nezbytná změna provádění technologie bourání nových otvorů do prefabrikovaných nosných vodorovných konstrukcí (vnitřních stěn). Projektová dokumentace počítá a variantou postupným odbouráváním otvorů, který je proříznut po obvodu stěnovou pilou. Tento postup byl se statického hlediska zamítnut. Zhotovitel navrhuje rozřezání na 8ks kvádrů o hmotnosti 150-200 Kg. Dále dle vyjádření statika je nezbytné bouravé otvory podstojkovat z obou stran stěny a provést aktivaci celé nové konstrukce pomocí potěrového betonu jemného o pevnosti 25MPa. Na jednu pozici bude použito cca 0,15m3 závlivkové hmoty. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-175 826,62 Kč	1 811 964,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 636 137,67 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018	Datum: 	



ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE
Objekt: ZL č. 7 - Změna technologie provádění bourání prefabrikovaných nosných konstrukcí
Místo: Akademiya Heyrovského 1216, Hradec Králové **Datum:** 16. 1. 2018
Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace **Projektant:** BKN spol. s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové **Zpracovatel:** Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 636 137,67

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7-1	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3			
7-2	K	977211112.1	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - dodatečné rozřezání na kvádry (8ks) o hmotnosti 150-200kg	m			
7-3	K	977R00001	Zřezení podpěr u bouraných prefabrikovaných svislých konstrukcí z obou stran dle požadavků statika (dřevěný trám 140/160 podepřená ocel. stojkami) Cena obsahuje montáž, demontáž, půjčovné ocel. stojek přesun hmot a dopravu)	kpl			
7-4	K	977R00002	Zálivka ocelových rámu z potěru betonového jemný o pevnosti 25 MPa, vč. motáže a demontáže bednění, přesunu hmot, dopravy	kpl			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7-5	K	VRN000001	Vedlejší zozpočtové náklady (poměr % z SOD)	%			
-----	---	-----------	---	---	--	--	--

52 114,36

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 8

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 23. 2. 2018

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: e-mailová korespondence

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ZL č. 8 - rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ZL č. 8 - Odpočet demontáž azbestu

Popis a zdůvodnění změny:

- V rámci provádění prací a na základě rozboru z akreditované laboratoře bylo zjištěno, že uvažovaný výskyt azbestu ve stávajících meziokenních konstrukcích se nepotvrdil, tudíž byla MIV demontovaná jako běžná konstrukce

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 8

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	23. 2. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL č. 8 - Odpočet demontáž azbestu


Popis a zdůvodnění změny:

- V rámci provádění prací a na základě rozboru z akreditované laboratoře bylo zjištěno, že uvažovaný výskyt azbestu ve stávajících meziokenních konstrukcích se nepotvrdil, tudíž byla MIV demontovaná jako běžná konstrukce


Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : -1 202 040,84 Kč	Cena víceprací bez DPH : 82 252,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : -1 119 788,04 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 31. 08. 2018



ROZPOČET

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: ZL č. 8 - Odpočet demontáž azbestu

Místo: Akademia Heyrovského 1216, Hradec Králové Datum: 16. 1. 2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: BKN spol. s r.o.
 Zhotovitel: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové Zpracovatel: Jiří Pěkný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 119 788,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8-1	K	966089002R01	Demontáž azbestocementových konstrukcí vč. opatření pro bezpečné provedení	m2			
8-2	K	966089002R02	Demontáž MIV bez příměsy azbestocementových vláken	m2			

997 - Přesun sutě

8-3	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t			
8-4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
8-5	K	997013501	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a se složením azbestocementových do 1 km	t			
8-6	K	997013509	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a se složením azbestocementových Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
8-7	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8-8	K	VRN000001	Vedlejší zozpočtové náklady (poměr % z SOD)	%	-1		
-----	---	-----------	---	---	----	--	--

-35 667,55

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 09	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 06. 4. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 09 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: ZL č. 09 – Změna dispozice 7.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavku uživatele došlo k úpravě dispozice 7.NP v podobě zrušení některých mezikancelářních SDK příček, zazdění vstupních dveří do kanceláře a úprava počtu a druhů dveří na tomto podlaží. 			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p>			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 09

Zhotovitel:

Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

Změnový list vystavil:

Zhotovitel

Datum:

06. 4. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL č. 09 – Změna dispozice 7.NP

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku uživatele došlo k úpravě dispozice 7.NP v podobě zrušení některých mezikancelářních SDK příček, zazdění vstupních dveří do kanceláře a úprava počtu a druhů dveří na tomto podlaží.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-307 239,37 Kč**254 679,71 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


-52 559,66 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: ZL č. 09 - Změna dispozice 7.NP

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 06.04.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6

Projektant: BKN, spol.s r.o.

Uchazeč: Sdružení Internát Heyrovského, Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



Náklady soupisu celkem

-52 559,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
9-1	K	310279842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovem nepálenými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3				
	VV		"D.1.1.1.13 Púdorys 7.NP"					
	VV		0,9*2,1*0,25					
	VV		Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9-2	K	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"D.1.1.1.13 Púdorys 7.NP"					
	VV		0,9*2,1*2					
	VV	amstustr	Součet					
9-3	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		0,9*2,1*2					
	VV		Součet					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	763		Konstrukce suché výstavby					
9-4	K	763111414	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 Tl tl. 75 mm, Rw 53 dB	m2				17 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtěžnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek. -1717 Penetrační nátěr. -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"D.1.1.1.35 Schéma púdorysu typické kanceláře"-změna					
	VV		4,305*2,55+3,4*2,55					
	VV	sdk3	Mezisoučet					
	VV		Součet					
D	766		Konstrukce truhlářské					
9-5	K	7661703R01	Ozn.D7.3 Dveře plně,800/1970 mm,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do SDK tl.125 mm,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus				
	VV		"D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize					
	VV		"D7.3" 0+1					
	VV		Součet					
9-6	K	7661708R01	Ozn.D7.8 Dveře plně,800/1970 mm,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdiva tl.100 mm,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus				
	VV		"D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize					
	VV		"D7.8" -1-1					
	VV		Součet					
9-7	K	7661709R01	Ozn.D7.9 Dveře plně,800/1970 mm,EW30DP3+C,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdiva tl.100 mm,kování "D",dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus				
	VV		"D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize					
	VV		"D7.9" -3-3					
	VV		Součet					
9-8	K	7661709R02	Ozn.D7.9(z) Dveře plně,900/1970 mm,PK,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do SDK tl.100 mm,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus				
	VV		D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize					
	VV		"D7.9" +1-0					
	VV		Součet					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9-9	K	7661710R01	Ozn.D7.10 Dveře prosklené,1800/2550 mm,EI300P3-C+5m.povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž "D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize "D7.10" -1 Součet	kus				
	VV							
	VV							
	VV							
9-10	K	7661709R02	Ozn.D7.10(z) Dveře plně,800/1970 mm,EW300P3-C,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva tl.100 mm,kování "D",dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž "D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize "D7.10" 3+2 Součet	kus				
	VV							
	VV							
	VV							
9-11	K	7661711R02	Ozn.D7.11 Dveře prosklené,1800/2550 mm,EI300P3-C+5m.povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž "D.1.1.1.36-2 Výpis výrobků - dveře" - revize "D7.11" 1 Součet	kus				
	VV							
	VV							
	VV							
	D	784	Dokončovací práce - malby					
9-12	K	784181101	Penetrace podkladu Jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m -(4,305*2,55*2+3,6*2,55*2-1,2*1,1)+0,9*2,1*2-0,05*2,1*4 Součet	m2				
	VV							
	VV							
9-13	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m -(4,305*2,55*2+3,6*2,55*2-1,2*1,1)+0,9*2,1*2-0,05*2,1*4 Součet	m2				
	VV							
	VV							
	m1							

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 10	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 5. 6. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 10 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: ZL č. 10 – Doplnění klimatizačních jednotek pro serverovny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele technologického zařízení byly pro chlazení serveroven (m.č. 3.16, 4.17, 5.17, 6.17, 7.17, 8.51, 10.51, 11.51 a 13.51) přidány 2 venkovní a 2 vnitřní klimatizační jednotky včetně příslušných rozvodů, doplnění elektroinstalací a doplnění rozvaděčů. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského			
<p>Stanovisko technického dozoru</p> <p>Stanovisko projektanta stavby</p>			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 10
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	5. 6. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 10 – Doplnění klimatizačních jednotek pro serverovny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele technologického zařízení byly pro chlazení serveroven (m.č. 3.16, 4.17, 5.17, 6.17, 7.17, 8.51, 10.51, 11.51 a 13.51) přidány 2 venkovní a 2 vnitřní klimatizační jednotky včetně příslušných rozvodů, doplnění elektroinstalací a doplnění rozvaděčů. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	428 908,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
428 908,79 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018		



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE
 Objekt: SO 01 - Internát
 Soupis: D.1.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika - ZL č. 10 - Doplnění klim. jednotek pro serverovny
 Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378
 Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
 Uchazeč: Sdružení Internát Heyrovského, Hradec Králové

Datum: 05.06.2018
 Projektant: BKN, spol.s r.o.
 Vladislavova 29/1,566 01 Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
 741-1 - Elektromontáže montážní materiál
 741-2 - Elektromontáže montážní práce

11 350,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE
 Objekt: SO 01 - Internát
 Soupis: ZL č. 10a - Elektro - zapojení jednotek
 Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378
 Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
 Uchazeč: Sdružení Internát Heyrovského, Hradec Králové

Datum: 05.06.2018
 Projektant: BKN, spol.s r.o.
 Vladislavova 29/1,566 01 Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 350,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741-1	Elektromontáže montážní materiál					
10a-1	M	341 11030	CYKY-O 3x1,5 - uloženy pevně	m				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		74					
	vv		Součet					
10a-2	M	341 11032	CYKY-J 3x1,5 - uloženy pevně	m				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		31					
	vv		Součet					
10a-3	M	341 11038	CYKY-J 3x2,5 - uloženy pevně	m				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		45					
10a-4	M	3543036490	Ovladač 10 A íaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		5					
10a-5	M	R položka036	Krabice přístrojová pr.68mm do sádrokartonových příček	ks				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		5					
10a-6	M	R položka037	Krabice odbočná pr.68mm do sádrokartonových příček	ks				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		3					
	vv		Součet					
10a-7	M	R položka038	Krabice rozvodková pr.68mm do sádrokartonových příček	ks				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		4					
10a-8	M	345 64010.1	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		5					
	vv		Součet					
10a-9	M	RS7012	Doplnění jističe jednopólového do RD C16/1	ks				
10a-10	M	R položka 136	Drabný elektroinstalační materiál	kpl				
D		741-2	Elektromontáže montážní práce					
10a-11	K	744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uloženy pevně	m				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		74					
10a-12	K	744 44-1100.1	CYKY-J 3x1,5 - uloženy pevně	m				
	vv		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	vv		31					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10a-13	K	744 44-1100.2	CYKY J 3x2,5 - uložený pevně	m				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		45					
10a-14	K	747 11-2221	Ovladač 10 A řaz. 1/0 - kryt (zapuštěný IP20)	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		5					
10a-15	K	74R položka033	Zapojení ventilátorů	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		4					
10a-16	K	74R položka034	Zapojení klimatizace	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		2					
10a-17	K	74R položka036	Krabice přístrojová pr. 68mm do sádrokartonových příček	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		5					
10a-18	K	74R položka037	Krabice odbočná pr. 68mm do sádrokartonových příček	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		3					
10a-19	K	74R položka038	Krabice rozvodková pr. 68mm do sádrokartonových příček	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		4					
10a-20	K	743 41-4321.1	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		5					
10a-21	K	741 32-0101	Montáž jističe do 25A-1P (Jistič C16/1 - doplnění do stávajícího rozvaděče)	ks				
	VV		položka dle soupisu Klimatizační jednotky					
	VV		2					
10a-22	K	R položka 143	Oživení systému, revize, měření	kpl				
10a-23	K	R položka 144	Dokumentace skutečného stavu	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: ZL 10b - Doplnění klím. jednotek pro serverovny

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení Internát Heyrovského, Hradec Králové

Datum: 5.6.218

Projektant: BKN.spol.s.r.o.
Vladislavova 29/1,566 01 Vysoké Mýto

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]



Cena celkem [CZK]



Cenová soustava


Náklady soupisu celkem

417 557,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751-1	Zařízení č. D3 - Chlazení serveroven m.č. 3.16, 4.17, 5.17, 6.17, 7.17, 8.51, 10.51, 11.51 a 13.51					
10b-1	K	751.R1.001	Montáž venkovní klimatizační jednotky Mitsubishi PUHZ-ZRP 35VKA Chladicí / Topný výkon 3,6 kW / 4,1 kW	ks				
10b-2	K	429.R1.001	Venkovní klimatizační jednotka Mitsubishi PUHZ-ZRP 35VKA Chladicí / Topný výkon 3,6 kW / 4,1 kW	ks				
10b-3	K	751.R1.002	Montáž vnitřní kanálové klím. jednotky Mitsubishi PEAD-RP35 JAQ Chladicí / Topný výkon 3,6 kW / 4,1 kW	ks				
10b-4	K	429.R1.002	Vnitřní kanálová klimatizační jednotka Mitsubishi PEAD-RP35 JAQ Chladicí / Topný výkon 3,6 kW / 4,1 kW, Objemový průtok vzduchu (m3/h) - min. 600 max. 840 Energetická třída A+; SEER 5,6; SCOP 4,0 Součásti dodávky je čerpadlo kondenzátu	ks				
10b-5	K	751.R1.003	Montáž propojovacího Cu potrubí	m				
10b-6	K	429.R1.003	Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva včetně parotěsné izolace, krycích plastových listů a doplňkového materiálu	m				
10b-7	K	751.R1.004	Montáž nosné konstrukce pod venk.klím.jednotkou	ks				
10b-8	K	429.R1.004	Nosná konstrukce pod venkovní klimatizační jednotkou	ks				
10b-9	K	751.R1.005	Montáž regulační klapky ruční průměr 150	ks				
10b-10	K	429.R1.005	Regulační klapka ruční průměr 150	ks				
10b-11	K	751.R1.006	Montáž výfukového kusu průměr 150	ks				
10b-12	K	429.R1.006	Výfukový kus VKA 150	ks				
10b-13	K	751.R1.007	Montáž celopozinkovaného potrubí	m2				
10b-14	K	429.R1.007	Celopozinkované potrubí s tl. izolací (20mm) - vodorovně, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů	m2				
10b-15	K	429.R1.008	tvarovka (nástavec) pro napojení rozvodu na klím.jednotku	ks				
10b-16	K	751.R1.009	Montáž revizních dveří 550x300 pro přístup k filtru kanálové klím. jednotky	ks				
10b-17	K	429.R1.009	Revizních dveří 500x300 pro přístup k filtru kanálové klím. jednotky	ks				
10b-18	K	751.R1.010	Samolepicí parotěsná izolace tl.15mm s Al fólií pro izolaci přívodního potrubí	m2				
10b-19	K	751.R1.011	Měřeno elektronicky z výkresu Protipožární ucpávka	m				
10b-20	K	751.R1.012	Měřeno elektronicky z výkresu Montáž PVC potrubí pro odvod kondenzátu	m				
10b-21	K	429.R1.012	PVC potrubí pro odvod kondenzátu včetně krycích plastových listů, protizapachových uzávěrek a doplňkového materiálu	m				
D		96	Stavební přípomoc					
10b-22	K	751.R.134	Vybourání stavebního otvoru do 0,12m2 včetně jeho zpětného začistění po montáži zařízení VZT	ks				
D		751	Vzduchotechnika					
10b-23	K	Pol3	Mimostaveništní doprava	t				
10b-24	K	998751105	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 48 do 60 m	t				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 11	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 24. 4. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 11 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 11 – Úprava stoupaček ÚT			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Na základě kompletního odhalení stoupacího potrubí v jednotlivých podlažích, aby byla zjištěna skutečná podoba odboček kvůli předpokládanému navázání nového napojení na tyto stávající odbočky stoupaček, a na základě změny provedení podlah, jelikož stávající potrubí je umístěno vysoko, a proto ve stávajícím stavu bylo provedeno překrytí potrubí pomocí kamenných roznášecích desek a dále po provedení sond přímo do potrubí bylo zjištěno, že stávající přípojovací potrubí je již značně zaneseno a je potřeba provést jeho výměnu a prostorovou úpravu vedení. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší/moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 11
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	24. 4. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 11 – Úprava stoupaček ÚT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě kompletního odhalení stoupacího potrubí v jednotlivých podlažích, aby byla zjištěna skutečná podoba odboček kvůli předpokládanému navázání nového napojení na tyto stávající odbočky stoupaček, a na základě změny provedení podlah, jelikož stávající potrubí je umístěno vysoko, a proto ve stávajícím stavu bylo provedeno překrytí potrubí pomocí kamenných roznášecích desek a dále po provedení sond přímo do potrubí bylo zjištěno, že stávající přípojovací potrubí je již značně zaneseno a je potřeba provést jeho výměnu a prostorovou úpravu vedení. 		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-299 709,20 Kč	1 533 906,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 234 197,01 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018	Da	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: ZL č. 11 - Úprava stoupaček ÚT

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 24.04.2018




Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6


Projektant: BKN.spol.s r.o.

Uchazeč: Sdružení Internát Heyrovského, Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 234 197,01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
11-1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm	m3			
11-2	K	965049-R1	Příplatek za opatrné ruční bourání okolo trubního vedení s ručním odstraněním vybourané suti	m3			
11-3	K	411 20-0021	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2	m2			
D		997	Přesun suti				
11-4	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 45 do 52 m	t			
11-5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
11-6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
11-7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t			
D		735-1	Ústřední vytápění - otopná tělesa - ODPOČET				
11-8	K	před.cena.31a	úprava přípojky vratného potrubí pro připojení regulačního sroubení	kus			
11-9	K	před.cena.31b	úprava přípojky náběhového potrubí pro připojení nového termostatického ventilu	kus			
D		735-2	Ústřední vytápění - otopná tělesa - Nové úpravy				
11-10	K	před.cena.31ax	úprava přípojky vratného potrubí pro připojení regulačního sroubení včetně závitového přechodu a trubky DN 20 délky 1,65m a ohybání	kus			
11-11	K	před.cena.31bx	úprava přípojky náběhového potrubí pro připojení nového termostatického ventilu včetně trubky DN 20 délky 2,2m a ohybání	kus			
11-12	K	před.cena.31axx	úprava přípojky vratného potrubí pro připojení regulačního sroubení včetně závitového přechodu a trubky DN 20 délky 1,65m a ohybání	kus			
11-13	K	před.cena.31bxx	úprava přípojky náběhového potrubí pro připojení nového termostatického ventilu včetně trubky DN 20 délky 2,2m a ohybání	kus			
11-14	K	před.cena.50	Gebo spojka DN20/3/4 pro připojení v neprístupném místě pro sváření	kus			
11-15	K	před.cena.51	Izolace pěnová pro trubky DN 20 tl. 10mm	m			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
11-16	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 12	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 18. 5. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 12 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 12 – Protipožární mřížka			
Popis a zdůvodnění změny:			
- Na základě požadované úpravy uživatele, kde je potřeba větrat místnost 1.15 z chodby větrací mřížkou. Jelikož stěna je dělicí stěnou požárního úseku, musí osazovaná mřížka splňovat jednak parametr průvzdušnosti – čistá plocha min. 0,048 m2, tak také parametr protipožárního uzávěru EI 90.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát H			
Stanovisko			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 12
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	18. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 12 – Protipožární mřížka</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadované úpravy uživatele, kde je potřeba větrat místnost 1.15 z chodby větrací mřížkou. Jelikož stěna je dělicí stěnou požárního úseku, musí osazovaná mřížka splňovat jednak parametr průvzdušnosti – čistá plocha min. 0,048 m², tak také parametr protipožárního uzávěru EI 90. 		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	12 797,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 797,89 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018	Datum: 	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis:

ZL č. 12 - Protipožární mřížky

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 18.05.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6

Projektant: BKN, spol.s r.o.




Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 797,89

D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 797,89
D		751-V	Větrací mřížky				12 797,89
12-1	K	751.R.V01	Montáž požární větrací mřížky 200x215 v základním provedení. Montáž provedena dle montážního návodu a podmínek výrobce požární mřížky	ks			12 797,89
		VV	1*2 Dle požadavku větrání serverovny				
12-2	M	429.R.V01	Požární větrací mřížka se spouštěcím mechanismem PSUM 90 200x215 mm	ks			
12-3	K	751.R.134	Vybourání stavebního otvoru do 0,12m ² včetně jeho zpětného začištění po montáži zařízení VZT	kus			
12-4	K	Pol3	Mimostaveništní doprava	%			
12-5	K	998751105	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 48 do 60 m	t			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 13	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 25. 4. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 13 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 13 – Detekce zaplavení a přesun rozvaděče DR1.1			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele technologického zařízení byla přidána čidla zaplavení a proveden nutný posun rozvaděče DR1.1 a s tím spojené prodloužení trasy vedení SLP kabelů, které bylo možné pouze náhradou za vodiče nové. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydáno			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 13
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	25. 4. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 13 – Detekce zaplavení a přesun rozvaděče DR1.1</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele technologického zařízení byla přidána čidla zaplavení a proveden nutný posun rozvaděče DR1.1 a s tím spojené prodloužení trasy vedení SLP kabelů, které bylo možné pouze náhradou za vodiče nové. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	95 964,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95 964,80 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 5. 08. 2018		
		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: ZL č. 13a - Detekce zaplavení

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 25.04.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

Projektant: BKN, spol.s r.o.
Vladislavova 29/1, 566 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 102,40

D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 102,40
D		741-1	Elektromontáže montážní materiál				
13a-1	M	341 11032	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			8				
			Součet				
13a-2	M	R položka014	JYTY 2x1 - uložený pevně	m			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			50				
			Součet				
13a-3	M	RS009	Jistič jednopólový B6/1	ks			
			rozváděcí spínačý zaroj v přečnovém boxu s místem pro AKKO max. 7 Ah, napájení 230 V, AUX nastavitelný 12 - 14 V, proud AUX 2 A, dobijecí proud batt 0,5 A, ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, ochrana AUX proti zkratu, přetížení,				
13a-4	M	R položka 132	položka dle soupisu detekce zaplavení	ks			
			1				
			Součet				
13a-5	M	R položka 133	Akumulátor 12V/1,2Ah	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
			Součet				
13a-6	M	R položka 134	GSM komunikátor SE244x (4xIN, 4xOUT)	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
			Součet				
13a-7	M	R položka 135	Snímač zaplavení Regmet SZ4	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
			Součet				
13a-8	M	R položka 136	Drobný elektroinstalační materiál	kpl			
D		741-2	Elektromontáže montážní práce				
13a-9	K	744 44-1100 1	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			8				
13a-10	K	74R položka014	JYTY 2x1 - uložený pevně	m			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			50				
			Součet				
13a-11	K	741 32-0101	Montáž jističe do 25A 1P (Jistič B6/1 - doplnění do stávajícího rozvaděče)	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
			rozváděcí spínačý zaroj v přečnovém boxu s místem pro AKKO max. 7 Ah, napájení 230 V, AUX nastavitelný 12 - 14 V, proud AUX 2 A, dobijecí proud batt 0,5 A, ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, ochrana AUX proti zkratu, přetížení,				
13a-12	K	R položka 138	položka dle soupisu detekce zaplavení	ks			
			1				
			Součet				
13a-13	K	R položka 139	Akumulátor 12V/1,2Ah	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
13a-14	K	R položka 140	GSM komunikátor SE244x (4xIN, 4xOUT)	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
			Součet				
13a-15	K	R položka 141	Snímač zaplavení Regmet SZ4	ks			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			1				
13a-16	K	R položka 142	Oživení systému	h			
			položka dle soupisu detekce zaplavení				
			2				
			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE
 Objekt: SO 01 - Internát
 Soupis: ZL č. 13 - Přesun rozvaděče R1.1

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378
 Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
 Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

Datum: 25.04.2018




Projektant: BKN, spol.s r.o.
 Vladislavova 29/1,566 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 862,40

D		PSV	Práce a dodávky PSV				66 862,40
D		741	Přesun rozvaděče a kabeláže RD1.1				
D		741-R1-MA	Kabely a montážní materiál				
13b-1	M	R položka137	Drátěný kabelový žlab 60x300 vč.uchycení každé 2m - žár.zinek	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	12				
		VV	Součet				
13b-2	M	R položka 605	Protipožární certifikovaná ucpávka průchodu kabelových žlabů hranici požárních úseků	ks			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				
13b-3	M	R položka102	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1220				
		VV	Součet				
13b-4	M	R položka103	Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou A/I-BH, gelový, 12x 9/125	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	25				
13b-5	M	R položka101	SYKFY 100x2x0,5 - uloženy volně	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	25				
13b-6	M	R položka 606	Pomocný instalační materiál	kpl			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				
		VV	Součet				
D		741-R1-MO	Montáže				
13b-7	K	74R položka141	Drátěný kabelový žlab 60x300 vč.uchycení každé 2m - žár.zinek	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	12				
		VV	Součet				
13b-8	K	R položka 606	Protipožární certifikovaná ucpávka průchodu kabelových žlabů hranici požárních úseků	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				
		VV	Součet				
13b-9	K	74R položka102	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1220				
13b-10	K	74R položka103	Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou A/I-BH, gelový, 12x 9/125	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	25				
		VV	Součet				
13b-11	K	74R položka101	SYKFY 100x2x0,5 - uloženy volně	m			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	25				
		VV	Součet				
13b-12	K	R položka 606	Demontáž, přesun, pomocné práce a montáž rozvaděče DR1.1	kpl			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				
		VV	Součet				
13b-13	K	R položka 606	Pomocný instalační materiál	kpl			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				
13b-14	K	R položka 607	Úprava projektové dokumentace	kpl			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				
		VV	Součet				
13b-15	K	R položka 608	Měření, oživení, revize	kpl			
		VV	Přesun rozvaděče RD1.1				
		VV	1				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 14	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 11. 5. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 14 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 14 – Změna skladby střechy Popis a zdůvodnění změny: - Skladba střešní konstrukce byla upřesněna na základě technických parametrů a uceleného certifikovaného systému výrobce.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydáno			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 14
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 14 – Změna skladby střechy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skladba střešní konstrukce byla upřesněna na základě technických parametrů a uceleného certifikovaného systému výrobce. 		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-290 609,85 Kč	252 717,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-37 892,38 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018	D	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: ZL č. 14 - Změna skladby střechy

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378
 Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
 Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

Datum: 11.05.2018



Projektant: BKN, spol.s r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------




Náklady soupisu celkem

-37 892,38

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
14-1	M	628522560.1	modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180g/m2, horní povrch opatřen hrubozrnným minerálním posypem, krycí vrstva SBS bitumen 4270 g/m2	m2			
14-2	M	628522560.1n	modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180g/m2 - horní povrch opatřen hrubozrnným minerálním posypem, krycí vrstva SBS bitumen 4270 g/m2 - AXTER FORCE 4000 S FE	m2			
14-3	M	628522540.1	modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou rohoží, skelná rohož 50g/m2	m2			
14-4	M	628522540.1n	modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou rohoží, skelná tkanina 200 g/m2 - krycí vrstva SBS bitumen 3580 g/m2 - AXTER HYRENE SPOT DUO	m2			
14-5	M	628522640.1	SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený kombinovanou spřáženou vložkou z antikorozi AL fólie a skelné rohože	m2			
14-6	M	628522640.1n	SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený kombinovanou spřáženou vložkou z antikorozi AL fólie a skelné rohože, krycí vrstva SBS bitumen 3200 g/m2 - AXTER	m2			
D	713		Izolace tepelné				
14-7	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 1000 mm λ-0.035	m3			
	VV		422,069*0,04				
14-8	M	631413310.1	deska izolační střešní z minerálních tuhých vláken λ-0.036 tl.40 mm	m2			
14-9	M	631529080	klin atikový přechodný minerální plochých střeš tl.100 x100 mm	kus			
14-10	M	28376142R01	klin atikový přechodný z EPS plochých střeš tl. 100 x 100 mm	kus			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 15
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	2. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 15 – Bourání podlah, mazaniny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě provedení rozsáhlých sond podlah a po odbourání dělicích příček místností, bylo provedeno geodetické zaměření všech místností budovy. Z tohoto měření a sond složení podkladu, bylo zjištěno, že rozdíly ve stávajících hrubých podlahách jsou tak výrazné (nelze dorovnat tenkovrstvými potěry) a kvalita těchto mazanin tak nízká a je tedy potřeba provést odstranění těchto vrstev a nahrazení novými skladbami v podobě kročejové izolace a mazanin v rozsahu hrubých podlah. - Vzhledem k těmto okolnostem a z toho vzniklých technologických návazností, bude mít tato změna vliv na celkový termín provádění díla – dle žádosti ze dne 20.6.2018, která je součástí tohoto ZL. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	11 919 564,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 919 564,56 Kč	dokončení díla bez kolaudace do 3. 9. 2019	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018		



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 15	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 2. 5. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 15 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 15 – Bourání podlah, mazaniny			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Na základě provedení rozsáhlých sond podlah a po odbourání dělicích příček místností, bylo provedeno geodetické zaměření všech místností budovy. Z tohoto měření a sond složení podkladu, bylo zjištěno, že rozdíly ve stávajících hrubých podlahách jsou tak výrazné (nelze dorovnat tenkovrstvými potěry) a kvalita těchto mazanin tak nízká a je tedy potřeba provést odstranění těchto vrstev a nahrazení novými skladbami v podobě kročejové izolace a mazanin v rozsahu hrubých podlah. - Vzhledem k těmto okolnostem a z toho vzniklých technologických návazností, bude mít tato změna vliv na celkový termín provádění díla – dle žádosti ze dne 20.6.2018, která je součástí tohoto ZL. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> využití moc <input type="checkbox"/> jiný stav <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vyd			
Stanovisko te			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			

REKAPITULACE MĚŘENÍ :

PATRA	Výměra bouraných místností (m2)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura (m3)
13. NP	436,750	10,893	49,047
12. NP	436,750	11,649	52,675
11. NP	436,750	10,518	48,110
10. NP	436,750	10,042	45,767
9. NP	436,750	10,446	48,043
8. NP	436,750	11,708	53,706
7. NP	436,750	11,250	51,511
6. NP	436,750	9,375	43,763
5. NP	436,750	9,304	43,370
4. NP	436,750	9,440	43,316
3. NP	436,750	9,896	41,002
2. NP	436,750	11,250	49,134
1. NP	957,340	5,000	47,867
CELKEM 13 - 1. NP	6 198,340	10,059	617,310



PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 1.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 1.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
	1 NP	957,34			
	výměra 1. NP		5	5	47,867
Celkem za 1. NP		957,340		5	47,867

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Níže podepsání

Dne

3. 09. 2018

Dne

3. 9. 2018

Dne

5. 9. 18

SERVISNÍ
ORGANIZACE
160 00 Praha 6
60200

vi

5

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 1.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 1.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
	1 NP	957,34			
	výměra 1. NP		5	5	47,867
Celkem za 1. NP		957,340		5	47,867


Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Níže podepsaní zastupci souhlasí s výměrami uvedenými v tomto protokolu

Dne
- 3. 09. 2018

Dne
3.9.2018

Dne
5.9.18

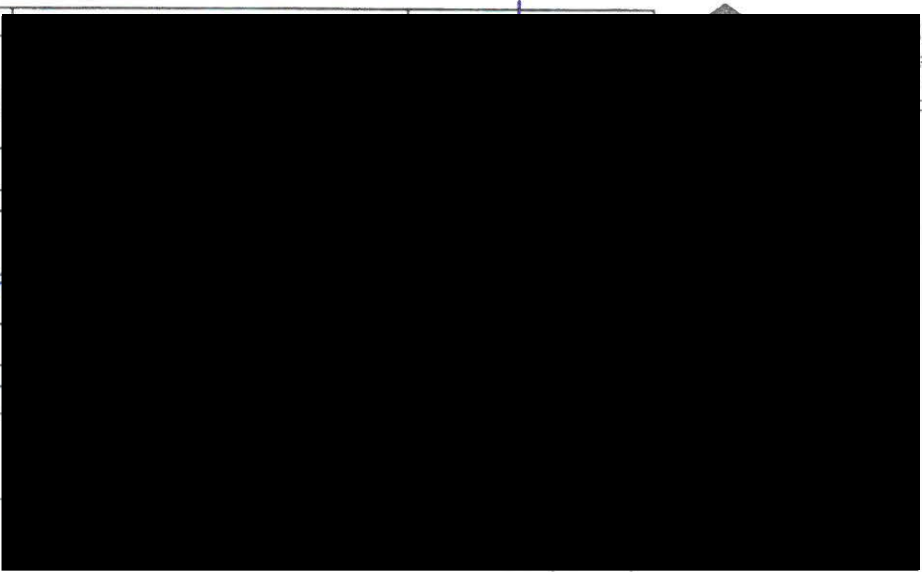

ERVISNÍ
ORGANIZACE
60 00 Praha 6
380

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 3.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 3.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
3.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 495		8	8,5	1,577
	• sonda č. 494		9		
3.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 493		9	9	1,670
	• sonda č. 492		9		
3.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 491		11	11	2,041
	• sonda č.				
3.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 490		8	8,75	1,623
	• sonda č. 489		9,5		
3.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 488		8	10	1,855
	• sonda č. 487		12		
3.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 486		9,5	9,75	1,809
	• sonda č. 485		10		
3.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 484		9	9,5	1,762
	• sonda č. 483		10		
3.22	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 482		9	9	1,670
	• sonda č. 481		9		
3.21	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 480		9	10,5	1,948
	• sonda č. 479		12		
3.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 478		9	10	1,855
	• sonda č. 477		11		
3.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,80			
	• sonda č. 476		11	10,5	3,129
	• sonda č. 475		10		
3.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			
	• sonda č. 474		10	10,5	1,391
	• sonda č. 473		11		
3.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 472		11	11	2,041
	• sonda č. 471		11		
3.10	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,75			
	• sonda č. 470		9	9,875	2,642
	• sonda č. 469		11		
	• sonda č. 468		10,5		
	• sonda č. 467		9		
3.08	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 466		11	11	2,041
	• sonda č. 465		11		
3.07	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 464		11	11	2,041
	• sonda č.				
3.06	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.			0	0,000
	• sonda č.				
3.05	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.			0	0,000
	• sonda č.				
3.03	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	37,10			
	• sonda č. 463		9,5	8,75	3,266
	• sonda č. 462		7,5		

	• sonda č. 461		9		
	• sonda č. 460		9		
3.01	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 459		9,5	9,5	6,664
Celkem za 3. NP		436,750		9,895833	41,002

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Niže podepsaní zástupci souhlasí s výměrami uvedenými v tomto protokolu

- 3. 09. 2018


Dne

3.9.2018

Dne

3.9.18

Dne

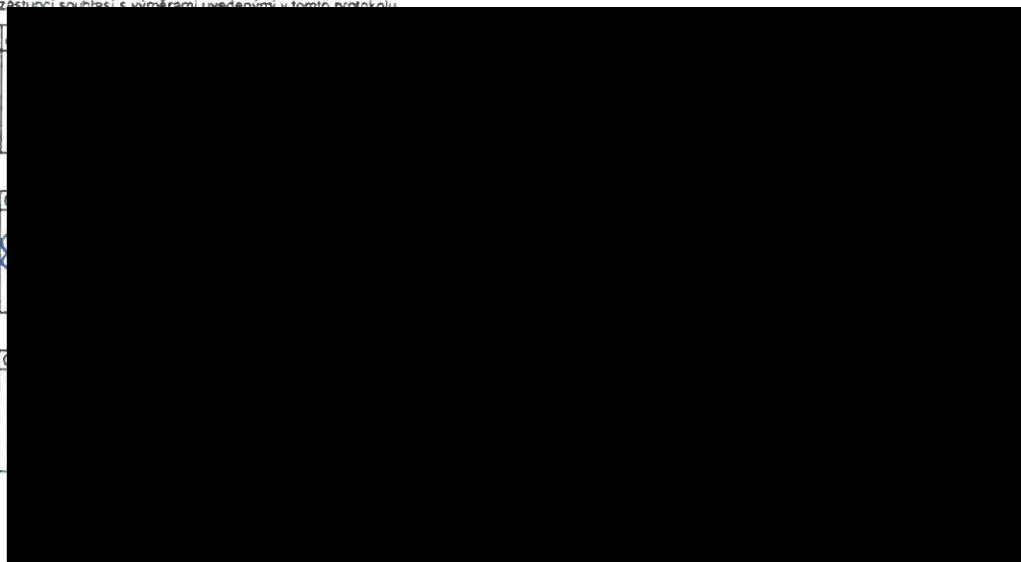

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 4.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 4.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
4.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		8,75	1,623
	• sonda č. 458		9		
	• sonda č. 457		8,5		
4.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10	1,855
	• sonda č. 456		9,5		
	• sonda č. 455		10,5		
4.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9	1,670
	• sonda č. 454		9		
	• sonda č. 453		9		
4.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11,5	2,133
	• sonda č. 452		11		
	• sonda č. 451		12		
4.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,5	1,762
	• sonda č. 450		10,5		
	• sonda č. 449		8,5		
4.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9	1,670
	• sonda č. 448		8		
	• sonda č. 447		10		
4.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		8,75	1,623
	• sonda č. 446		8,5		
	• sonda č. 445		9		
4.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10	1,855
	• sonda č. 444		11		
	• sonda č. 443		9		
4.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		8,75	1,623
	• sonda č. 442		8,5		
	• sonda č. 441		9		
4.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,5	1,762
	• sonda č. 440		10,5		
	• sonda č. 439		8,5		
4.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90		8,5	1,267
	• sonda č. 438		8,5		
	• sonda č. 437		8,5		
4.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25		7,75	1,027
	• sonda č. 436		8		
	• sonda č. 435		7,5		
4.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		8,5	1,577
	• sonda č. 434		9		
	• sonda č. 433		8		
4.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10		10,25	3,085
	• sonda č. 432		10		
	• sonda č. 431		11		
	• sonda č. 430		10,5		
	• sonda č. 429		9,5		
4.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10		9,625	2,897
	• sonda č. 428		9,5		
	• sonda č. 427		8,5		
	• sonda č. 426		11		
	• sonda č. 425		9,5		
4.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,25	1,901
	• sonda č. 424		10		
	• sonda č. 423		10,5		
4.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10	1,855
	• sonda č. 422		10		
	• sonda č. 421		10		
4.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,75	1,809
	• sonda č. 420		9,5		
	• sonda č. 419		10		
4.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č. 418		9		
	• sonda č. 417		11	10	1.855
4.30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 416		8,5		
	• sonda č. 415		10	9,25	1.716
4.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 414		9		
	• sonda č. 413		9,5		
	• sonda č. 412		10	9,625	6,752
	• sonda č. 411		10		
Celkem za 4. NP		436,750		9,440476	43,316


Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Niže podepsaní zástupci

- 3. Dne 09. 2018

Dne 3.9.2018

Dne 3.9.18

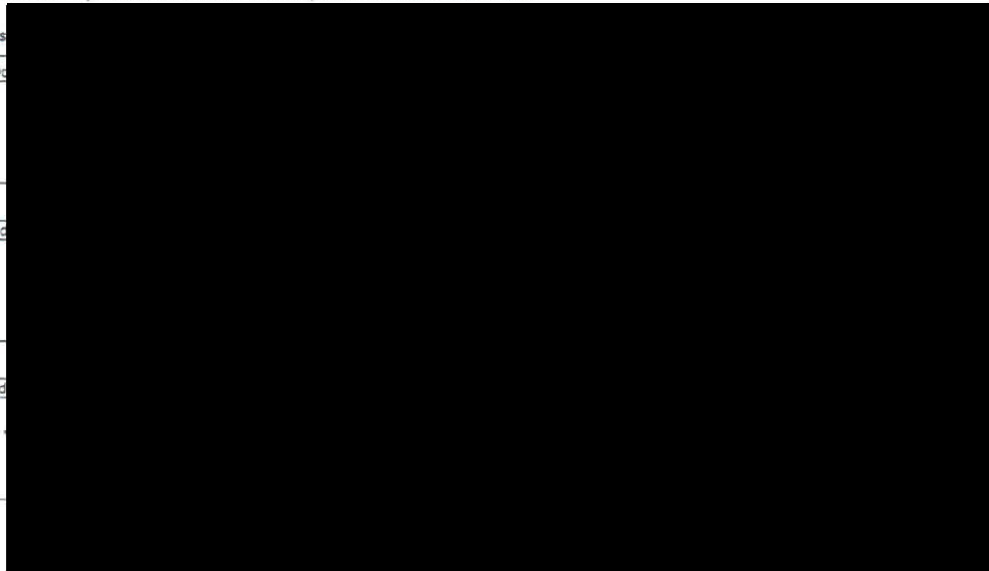

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 5.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 5.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
5.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,901
	• sonda č. 410		10,5	10,25	
	• sonda č. 409		10		
5.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,762
	• sonda č. 408		10	9,5	
	• sonda č. 407		9		
5.11.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,901
	• sonda č. 406		11	10,25	
	• sonda č. 405		9,5		
5.12.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,762
	• sonda č. 404		7,5	9,5	
	• sonda č. 403		11,5		
5.13.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,809
	• sonda č. 402		10,5	9,75	
	• sonda č. 401		9		
5.14.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,438
	• sonda č. 400		7	7,75	
	• sonda č. 399		8,5		
5.15.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,623
	• sonda č. 398		9	8,75	
	• sonda č. 397		8,5		
5.16.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,855
	• sonda č. 396		11	10	
	• sonda č. 395		9		
5.17.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,716
	• sonda č. 394		9	9,25	
	• sonda č. 393		9,5		
5.18.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,484
	• sonda č. 392		8,5	8	
	• sonda č. 391		7,5		
5.19.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90			1,229
	• sonda č. 390		7,5	8,25	
	• sonda č. 389		9		
5.20.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			1,126
	• sonda č. 388		8,5	8,5	
	• sonda č. 387		8,5		
5.23.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,716
	• sonda č. 386		8	9,25	
	• sonda č. 385		10,5		
5.24.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			2,935
	• sonda č. 384		9,5	9,75	
	• sonda č. 383		8,5		
	• sonda č. 382		10,5		
	• sonda č. 381		9,5		
5.25.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			3,311
	• sonda č. 380		11	11	
	• sonda č. 379		12,5		
	• sonda č. 378		10,5		
	• sonda č. 377		10		
5.26.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,438
	• sonda č. 376		7	7,75	
	• sonda č. 375		8,5		
5.27.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,994
	• sonda č. 374		12	10,75	
	• sonda č. 373		9,5		
5.28.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,530
	• sonda č. 372		7	8,25	
	• sonda č. 371		9,5		
5.29.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	▪ sonda č. 370		8		
	▪ sonda č. 369		9,5	8,75	1,623
5.30	DVOULUŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	▪ sonda č. 368		8,5		
	▪ sonda č. 367		10,5	9,5	1,762
5.34	DVOULUŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	▪ sonda č. 366		10		
	▪ sonda č. 365		9,5	10,625	7,453
	▪ sonda č. 364		12		
	▪ sonda č. 363		11		
Celkem za 5. NP		436,750		9,303571	43,370


Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Niže podepsaní zástupci souhlasí s výměrami uvedenými v tomto protokolu

Dne
- 3. 09. 2018

Dne
3.9.2018

Dne
3.9.18

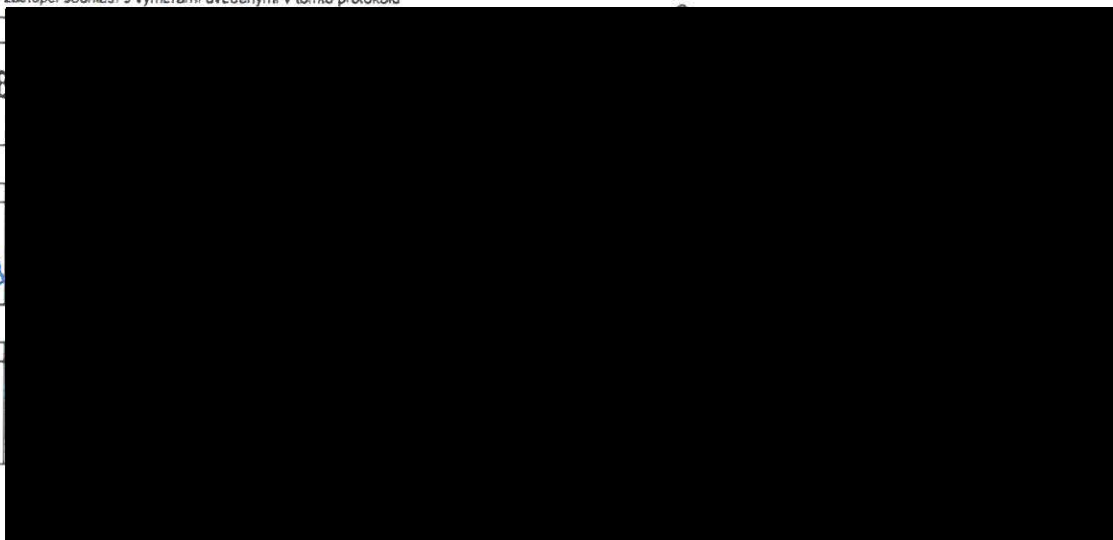

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 6.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 6.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
6.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,577
	• sonda č. 222		8	8,5	
	• sonda č. 221		9		
6.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,809
	• sonda č. 220		10	9,75	
	• sonda č. 219		9,5		
6.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,901
	• sonda č. 218		10	10,25	
	• sonda č. 217		10,5		
6.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,670
	• sonda č. 216		9	9	
	• sonda č. 215		9		
6.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,809
	• sonda č. 214		10	9,75	
	• sonda č. 213		9,5		
6.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,670
	• sonda č. 212		9	9	
	• sonda č. 211		9		
6.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,484
	• sonda č. 210		8	8	
	• sonda č. 209		8		
6.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,809
	• sonda č. 208		9	9,75	
	• sonda č. 207		10,5		
6.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,670
	• sonda č. 206		7,5	9	
	• sonda č. 205		10,5		
6.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,484
	• sonda č. 204		8,5	8	
	• sonda č. 203		7,5		
6.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90			1,192
	• sonda č. 200		8	8	
	• sonda č. 199		8		
6.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			1,093
	• sonda č. 202		8	8,25	
	• sonda č. 201		8,5		
6.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,670
	• sonda č. 198		9	9	
	• sonda č. 197		9		
6.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			2,972
	• sonda č. 196		10	9,875	
	• sonda č. 195		9		
	• sonda č. 194		9,5		
	• sonda č. 193		11		
6.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			3,010
	• sonda č. 192		11	10	
	• sonda č. 191		10,5		
	• sonda č. 190		9,5		
	• sonda č. 189		9		
6.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,762
	• sonda č. 188		9,5	9,5	
	• sonda č. 187		9,5		
6.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,762
	• sonda č. 186		8,5	9,5	
	• sonda č. 185		10,5		
6.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,901
	• sonda č. 184		11	10,25	
	• sonda č. 183		9,5		
6.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č. 182		10		
	• sonda č. 181		12	11	2,041
6.30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 180		10		
	• sonda č. 179		9	9,5	1,762
6.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 178		11		
	• sonda č. 177		11		
	• sonda č. 176		11	11	7,717
	• sonda č. 176		11		
Celkem za 10. NP		436,750		9,375	43,763

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Niže podepsáni z

Dne


3. 09. 2018

Dne

3.9.2018

Dne

3.9.18

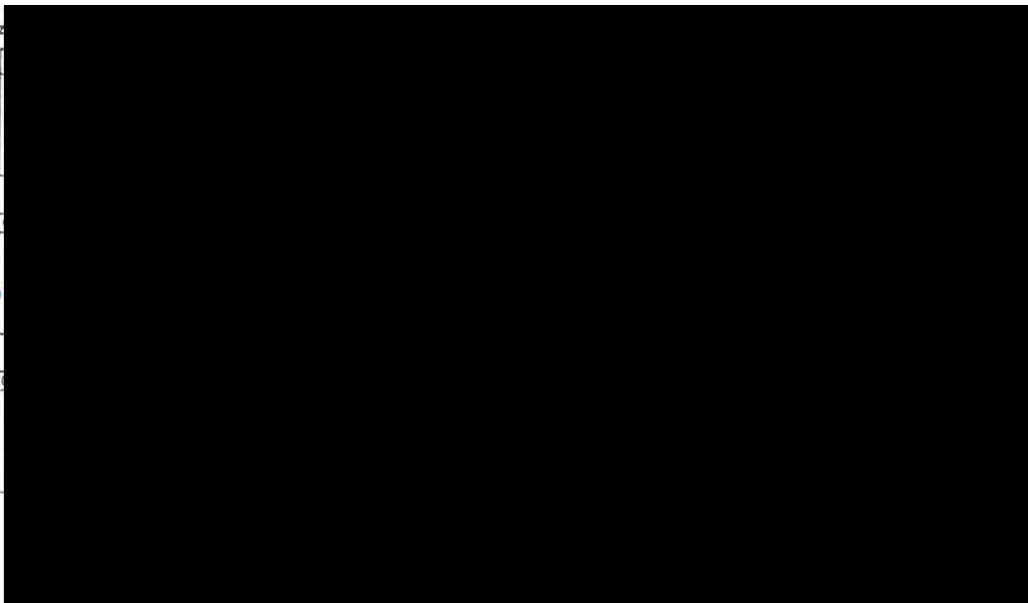

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 7.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 7.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
7.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.		10	10	1,855
	• sonda č.		10		
7.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 174		12,5	12,5	2,319
	• sonda č. 173		12,5		
7.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 172		11,5	11,75	2,180
	• sonda č. 171		12		
7.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.		10	10	1,855
	• sonda č.		10		
7.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.		10	10	1,855
	• sonda č.		10		
7.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.		10	10	1,855
	• sonda č.		10		
7.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 170		11	12	2,226
	• sonda č. 169		13		
7.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 168		12,5	12,5	2,319
	• sonda č. 167		12,5		
7.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 166		10,5	11	2,041
	• sonda č. 165		11,5		
7.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 164		10,5	10	1,855
	• sonda č. 163		9,5		
7.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90			
	• sonda č. 161		10	10,5	1,565
	• sonda č. 160		11		
7.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			
	• sonda č. 163		11	11,75	1,557
	• sonda č. 162		12,5		
7.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 158		10,5	11	2,041
	• sonda č. 157		11,5		
7.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			
	• sonda č. 159		10	11,25	3,386
	• sonda č. 156		10,5		
	• sonda č. 155		12		
	• sonda č. 154		12,5		
7.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			
	• sonda č. 153		13,5	13,75	4,139
	• sonda č. 152		13,5		
	• sonda č. 151		14		
	• sonda č. 150		14		
7.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 149		11,5	12	2,226
	• sonda č. 148		12,5		
7.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 147		12	11,5	2,133
	• sonda č. 146		11		
7.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 145		14,5	13,5	2,504
	• sonda č. 144		12,5		
7.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č.		10	10	1 855
	• sonda č.		10		
7.30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.		10	10	1 855
	• sonda č.		10		
7.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 143		11	11,25	7 892
	• sonda č. 142		10,5		
	• sonda č. 141		11		
	• sonda č. 140		12,5		
Celkem za 10. NP		436,750		11,25	51,511

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace


Niže podepsaní zástupci

3. 09, 2018

Dne	Oč
09, 2018	

Dne	Oč
3.9.2018	

Dne	Oč
3.9.18	



PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 8.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 8.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
8.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	12,5	14	2,597
	• sonda č. 139		15,5		
8.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	13	11,5	2,133
	• sonda č. 137		10		
8.11.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	12,5	12,25	2,272
	• sonda č. 135		12		
8.12.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	10,5	11	2,041
	• sonda č. 133		11,5		
8.13.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	12,5	11,5	2,133
	• sonda č. 131		10,5		
8.14.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	11,5	11,75	2,180
	• sonda č. 129		12		
8.15.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	11,5	11,25	2,087
	• sonda č. 127		11		
8.16.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	11	11,25	2,087
	• sonda č. 125		11,5		
8.17.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	11	11,5	2,133
	• sonda č. 123		12		
8.18.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	12	12	2,226
	• sonda č. 121		12		
8.19.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90	9,5	9	1,341
	• sonda č. 117		8,5		
8.20.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25	11	11	1,458
	• sonda č. 119		11		
8.23.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	9,5	9,75	1,809
	• sonda č. 115		10		
8.24.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10	10,5	11,625	3,499
	• sonda č. 113		11		
	• sonda č. 112		11,5		
	• sonda č. 111		13,5		
8.25.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10	15	12,75	3,838
	• sonda č. 109		12		
	• sonda č. 108		11,5		
	• sonda č. 107		12,5		
8.26.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	11,5	11,25	2,087
	• sonda č. 105		11		
8.27.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	12,5	12,25	2,272
	• sonda č. 103		12		
8.28.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55	13	12,5	2,319
	• sonda č. 101		12		
8.29.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č. 99		13,5		
	• sonda č. 98		14	13,75	2,551
8. 30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 97		12		
	• sonda č. 96		12	12	2,226
8. 34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 95		12		
	• sonda č. 94		12,5		
	• sonda č. 93		12	12	8,418
	• sonda č. 92		11,5		
Celkem za 8. NP		436,750		11,70833	53,706

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Niže podepsan

Dne


- 3. 09. 201

Dne

19. 10 18

Dne

5. 9. 18

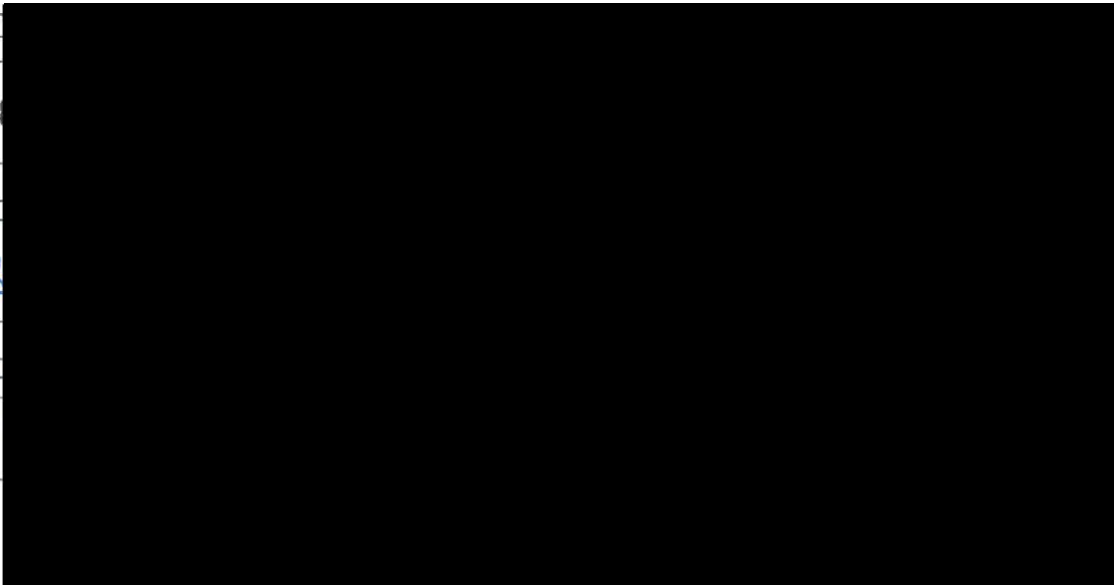

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 9.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 9.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m ³)
9.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10	1,855
	• sonda č. 87		8,5		
	• sonda č. 86		11,5		
9.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11	2,041
	• sonda č. 85		12,5		
	• sonda č. 84		9,5		
9.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11	2,041
	• sonda č. 83		11		
	• sonda č. 82		11		
9.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11,25	2,087
	• sonda č. 81		11		
	• sonda č. 80		11,5		
9.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,75	1,994
	• sonda č. 79		10,5		
	• sonda č. 78		11		
9.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,75	1,994
	• sonda č. 77		11		
	• sonda č. 76		10,5		
9.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		12	2,226
	• sonda č. 75		11,5		
	• sonda č. 74		12,5		
9.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,25	1,716
	• sonda č. 73		9,5		
	• sonda č. 72		9		
9.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,25	1,716
	• sonda č. 71		9		
	• sonda č. 70		9,5		
9.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,75	1,994
	• sonda č. 69		10,5		
	• sonda č. 68		11		
9.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90		9,25	1,378
	• sonda č. 63		9		
	• sonda č. 64		9,5		
9.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25		8,5	1,126
	• sonda č. 66		8,5		
	• sonda č. 65		8,5		
9.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,25	1,901
	• sonda č. 62		10		
	• sonda č. 61		10,5		
9.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10		9,5	2,860
	• sonda č. 60		9,5		
	• sonda č. 59		9,5		
	• sonda č. 58		10		
	• sonda č. 57		9		
9.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10		11,25	3,386
	• sonda č. 56		11		
	• sonda č. 55		11,5		
	• sonda č. 54		9		
	• sonda č. 53		13,5		
9.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11,75	2,180
	• sonda č. 52		12		
	• sonda č. 51		11,5		
9.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,5	1,762
	• sonda č. 50		8		
	• sonda č. 49		11		
9.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11	2,041
	• sonda č. 48		12		
	• sonda č. 47		10		
9.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č. 46		11		
	• sonda č. 45		10,5	10,75	1,994
9.30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 44		10,5		
	• sonda č. 43		10,5	10,5	1,948
9.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 91		11		
	• sonda č. 90		9,5		
	• sonda č. 89		11,5	11,125	7,804
	• sonda č. 88		12,5		
Celkem za 9. NP		436,750		10,44643	48,043

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace


Niže podepsáni

- 3. 09. 2018

Dne
09. 2018

Dne
3.9.2018

Dne
3.9.18

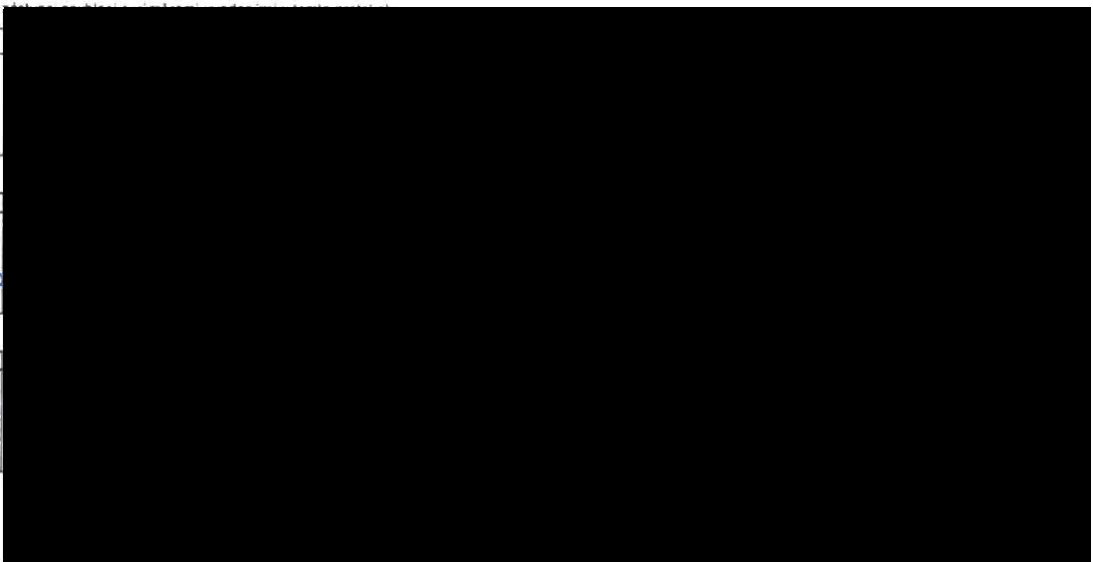

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 10.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 10.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
10.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,75	1,809
	• sonda č. 37		10,5		
	• sonda č. 38		9		
10.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,75	1,809
	• sonda č. 35		9		
	• sonda č. 36		10,5		
10.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,5	1,762
	• sonda č. 33		9,5		
	• sonda č. 34		9,5		
10.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11,25	2,087
	• sonda č. 31		10,5		
	• sonda č. 32		12		
10.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11	2,041
	• sonda č. 29		11,5		
	• sonda č. 30		10,5		
10.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,25	1,901
	• sonda č. 27		9,5		
	• sonda č. 28		11		
10.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,75	1,809
	• sonda č. 25		10		
	• sonda č. 26		9,5		
10.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11	2,041
	• sonda č. 23		10		
	• sonda č. 24		12		
10.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10	1,855
	• sonda č. 21		11		
	• sonda č. 22		9		
10.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		11,5	2,133
	• sonda č. 19		10,5		
	• sonda č. 20		12,5		
10.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90		10	1,490
	• sonda č. 17		11		
	• sonda č. 18		9		
10.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25		8,75	1,159
	• sonda č. 15		8,5		
	• sonda č. 16		9		
10.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9,25	1,716
	• sonda č. 13		9		
	• sonda č. 14		9,5		
10.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10		10,5	3,161
	• sonda č. 9		10		
	• sonda č. 10		11		
	• sonda č. 11		11		
	• sonda č. 12		10		
10.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10		11,25	3,386
	• sonda č. 3		12		
	• sonda č. 4		10		
	• sonda č. 7		12		
	• sonda č. 8		11		
10.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10,75	1,994
	• sonda č. 1		11		
	• sonda č. 2		10,5		
10.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		10	1,855
	• sonda č. 6		10		
	• sonda č.				
10.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55		9	1,670
	• sonda č.		9		
	• sonda č.				

10.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 5		9	9	1,670
	• sonda č.				
10.30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č.		9	9	1,670
	• sonda č.				
10.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 39		8,5		
	• sonda č. 40		9		
	• sonda č. 41		11	9,625	6,752
	• sonda č. 42		10		
Celkem za 10. NP		436,750		10,04167	45,767

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Niže podepsani

- 3. 09. 2018


Dne

Dne

30. 10. 18

Dne

30. 10. 18

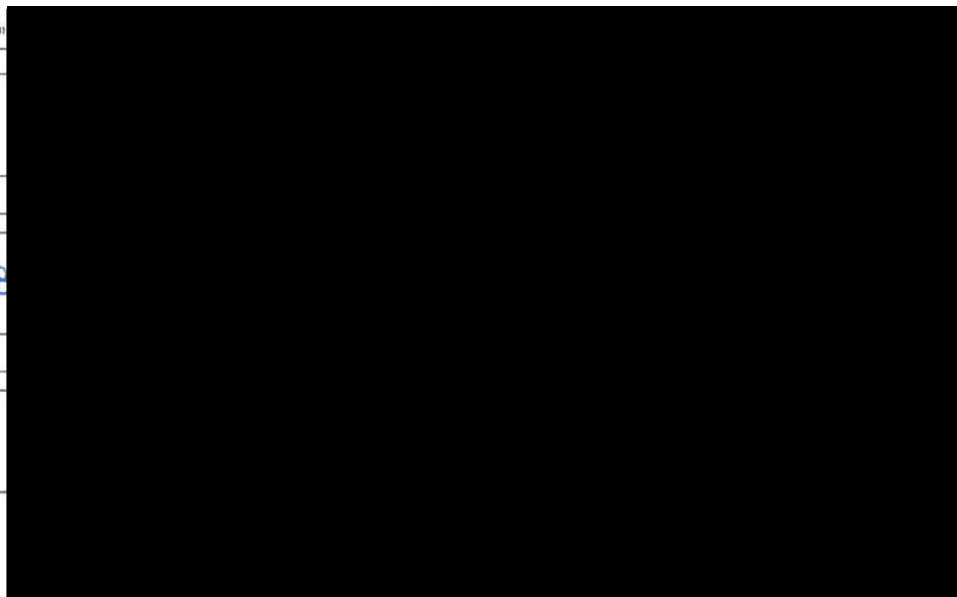

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 11.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 11.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
11.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,809
	• sonda č. 362		9	9,75	
	• sonda č. 361		10,5		
11.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,041
	• sonda č. 360		11	11	
	• sonda č. 359		11		
11.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,855
	• sonda č. 358		10	10	
	• sonda č. 357		10		
11.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,948
	• sonda č. 356		11	10,5	
	• sonda č. 355		10		
11.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,855
	• sonda č. 354		10	10	
	• sonda č. 353		10		
11.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,133
	• sonda č. 352		11	11,5	
	• sonda č. 351		12		
11.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,041
	• sonda č. 350		10,5	11	
	• sonda č. 349		11,5		
11.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,041
	• sonda č. 348		11	11	
	• sonda č. 347		11		
11.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,133
	• sonda č. 346		11	11,5	
	• sonda č. 345		12		
11. 18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,994
	• sonda č. 344		11	10,75	
	• sonda č. 343		10,5		
11.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90			1,416
	• sonda č. 341		9,5	9,5	
11. 20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			1,391
	• sonda č. 342		10,5	10,5	
10. 23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,762
	• sonda č. 340		10	9,5	
	• sonda č. 339		9		
11. 24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			3,725
	• sonda č. 338		13	12,375	
	• sonda č. 337		11,5		
	• sonda č. 336		13		
	• sonda č. 335		12		
11. 25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			
	• sonda č. 334		13,5	13,125	
	• sonda č. 333		17,5		
	• sonda č. 332		10,5		
	• sonda č. 331		11		
11. 26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 330		9,5	9,5	
	• sonda č. 329		9,5		
11. 27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,809
	• sonda č. 328		9,5	9,75	
	• sonda č. 327		10		
11. 28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,041
	• sonda č. 326		12	11	
	• sonda č. 325		10		
11. 29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č. 324		9		
	• sonda č. 323		9	9	1.670
11.30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 322		9,5		
	• sonda č. 321		10	9,75	1.809
11.34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 320		8,5		
	• sonda č. 319		10,5		
	• sonda č. 318		11	9,875	6.927
	• sonda č. 317		9,5		
Celkem za 11. NP		436,750		10,51786	48,110


Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace

Níže podepsaní zástupci souhlasí s výměrami uvedenými v tomto protokolu:

Dne	O
3. 09. 2018	

Dne	O
3. 9. 2018	

Dne	O
3. 9. 18	

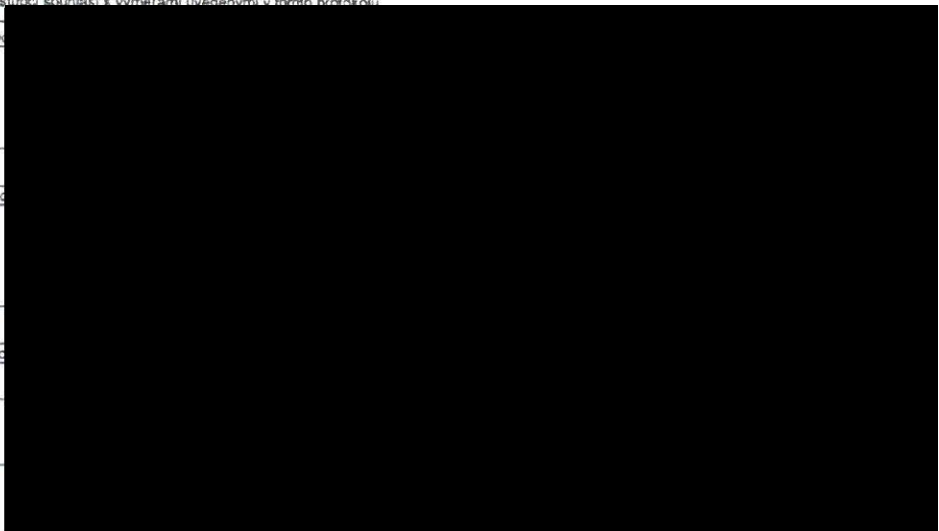

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 12.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 12.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
12.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,226
	• sonda č. 316		13	12	
	• sonda č. 315		11		
12.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,272
	• sonda č. 314		12	12,25	
	• sonda č. 313		12,5		
12.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,597
	• sonda č. 312		14	14	
	• sonda č. 311		14		
12.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,133
	• sonda č. 310		12	11,5	
	• sonda č. 309		11		
12.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,551
	• sonda č. 308		12,5	13,75	
	• sonda č. 307		15		
12.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,597
	• sonda č. 306		15	14	
	• sonda č. 305		13		
12.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,319
	• sonda č. 304		13	12,5	
	• sonda č. 303		12		
12.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,041
	• sonda č. 302		12	11	
	• sonda č. 301		10		
12.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,180
	• sonda č. 300		11	11,75	
	• sonda č. 299		12,5		
12.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,041
	• sonda č. 298		12	11	
	• sonda č. 297		10		
12.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90			1,639
	• sonda č. 294		11	11	
	• sonda č. 293		11		
12.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			1,458
	• sonda č. 296		11	11	
	• sonda č. 295		11		
12.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			1,855
	• sonda č. 292		10	10	
	• sonda č. 291		10		
12.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			3,311
	• sonda č. 290		12	11	
	• sonda č. 289		12,5		
	• sonda č. 288		9,5		
	• sonda č. 287		10		
12.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			
	• sonda č. 286		12	11	
	• sonda č. 285		11		
	• sonda č. 284		10		
	• sonda č. 283		11		
12.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 282		12	11,5	
	• sonda č. 281		11		
12.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,226
	• sonda č. 280		11	12	
	• sonda č. 279		13		
12.28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			2,226
	• sonda č. 278		12	12	
	• sonda č. 277		12		
12.29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			

	• sonda č. 276		10		
	• sonda č. 275		11,5	10,75	1,994
12.30	DVOULUŽKOVY POKOJ	18,55			
	• sonda č. 274		9	9,5	1,762
	• sonda č. 273		10		
12.34	DVOULUŽKOVY POKOJ	70,15			
	• sonda č. 272		12		
	• sonda č. 271		12	11,125	7,804
	• sonda č. 270		11		
	• sonda č. 269		9,5		
	Celkem za 12. NP	436,750		11,64881	52,675

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu- fotodokumentace


Niže podepsaní zástupci souhlasí s výměrami uvedenými v tomto protokolu

- 3. 09. 2018

Dne	Oč
03. 09. 2018	

Dne	Oč
3. 9. 2018	

Dne	Oč
3. 9. 18	

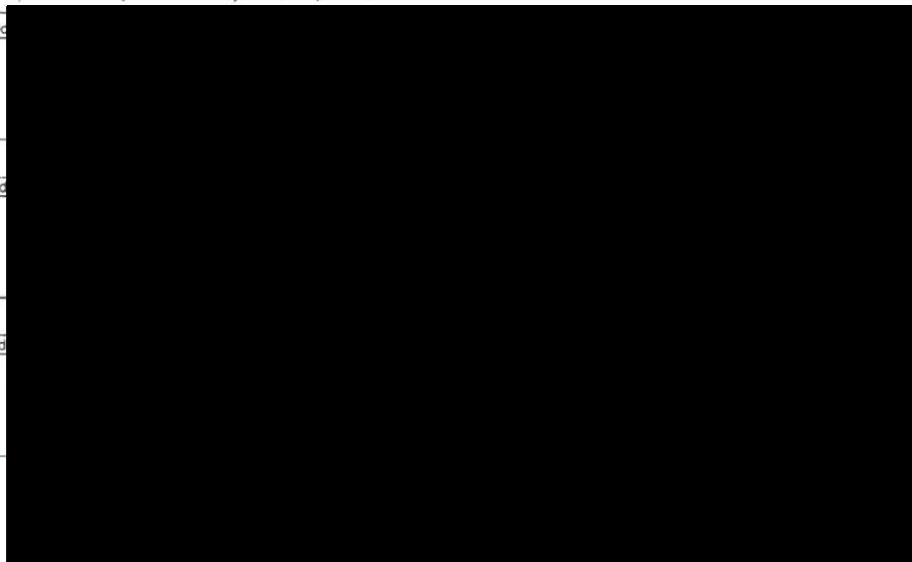

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 13.NP

Stavba: „INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE“

Zhotovitel: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

PROTOKOL ZAMĚŘENÍ BOURANÝCH PODLAH - 13.NP					
č. pokoje	Název	výměra	Naměřené výšky (cm)	Aritmetický průměr (cm)	Kubatura v místnosti (m3)
13.9.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 268		10	10	1,855
	• sonda č. 267	10			
13.10.	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 266		11	11	2,041
	• sonda č. 265	11			
13.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 264		11	11	2,041
	• sonda č. 265	11			
13.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 262		10	10,5	1,948
	• sonda č. 261	11			
13.13	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 260		11,5	11,75	2,180
	• sonda č. 259	12			
13.14	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 258		10,5	10,75	1,994
	• sonda č. 257	11			
13.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 256		10	10	1,855
	• sonda č. 255	10			
13.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 254		10	10,25	1,901
	• sonda č. 253	10,5			
13.17	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 252		11	12	2,226
	• sonda č. 251	13			
13.18	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 250		12,5	12	2,226
	• sonda č. 249	11,5			
13.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	14,90			
	• sonda č. 247		12,5	12,5	1,863
13.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	13,25			
	• sonda č. 248		13,5	13,5	1,789
13.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 246		9	9,5	1,762
	• sonda č. 245	10			
13.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			
	• sonda č. 244		10	10,625	3,198
	• sonda č. 243		12		
	• sonda č. 242		10,5		
• sonda č. 241	10				
13.25	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,10			
	• sonda č. 240		10	9,875	2,972
	• sonda č. 239		9		
	• sonda č. 238		9,5		
• sonda č. 237	11				
13.26	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 236		11,5	10,75	1,994
	• sonda č. 235	10			
13.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 234		10	10,5	1,948
	• sonda č. 233	11			

13 NP

13. 28	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 232		11		
	• sonda č. 231		11	11	2,041
13. 29	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 230		9,5		
	• sonda č. 229		11	10,25	1,901
13. 30	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	18,55			
	• sonda č. 228		11,5		
	• sonda č. 227		9,5	10,5	1,948
13. 34	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	70,15			
	• sonda č. 226		12		
	• sonda č. 225		12		
	• sonda č. 224		9	10,5	7,366
	• sonda č. 223		9		
Celkem za 13. NP		436,750		10,89286	49,047

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto protokolu - fotodokumentace

Niže podepsaní zástupci souhlasí s výměrami uvedenými v tomto protokolu:

- 3. 09. 2018

Dne

Dne



3.9.2018




Dne



3.9.18

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
X_02: Podlahy - nové mazaniny a kročej. izolace								
SO 01: Internát								
15-1	SP	634111113	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou.	m				
15-2	SP	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C: 16/20 - tl. 60 mm	m3				
15-3	SP	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2				
15-4	SP	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3				
15-5	SP	711131811	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2				
15-6	SP	713121111	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami: 1 vrstva	m2				
15-7	SP	998713206	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 60 m	%				
15-8	SP	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvýšený přesun do 100 m	%				
15-9	H	R713-01	Kročejová izolace z PE pěny s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 10 mm	m2				
15-10	SP	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl. do 100 mm	m2				
15-11	H	28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm	m2				
15-12	SP	965042141	9: Ostatní konstrukce a práce-bourání Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm tl přes 4 m2 - noknie (nrním tl 100 mm)	m3				
15-13	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm tl přes 4 m2 - chodhv (nrním tl 40 mm)	m3				
15-14	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm tl přes 4 m2 - lndžie (nrním tl 70 mm)	m3				
15-15	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm tl přes 4 m2 - srolečné nrostor (nrním tl 80 mm)	m3				
15-16	SP	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabciovým pletivem tl do 100 mm	m3				
SP	997013122		997: Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s noulžitím mechanizace	t				

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15-18	SP	997013219	Příplatek k vnitrostavebnímu dopravnímu suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 1800,72941	t					
15-19	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se službami	t					
15-20	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 službu	t					
15-21	SUB	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t					
15-22	SUB	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t					
15-23	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t					
15-24	SP	998012026	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy monolitické v do 52 m	t					379 662,77
15-25	SP	998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m	t					379 662,77
15-26	SUB	VRN000001	VON: Vedlejší a ostatní náklady 0: Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady (poměr % z SoD)	soubo					379 662,77



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 16	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 22. 5. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 16 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 16 – Úprava zábradlí			
Popis a zdůvodnění změny:			
- Na základě kontroly a měření skutečného stavu zábradlí na všech lodžiiích byla zjištěna, po dohodě s objednatel, nutnost úpravy dle platné ČSN 74 3305 na výšku 1200 mm v celém rozsahu stavby.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydá			
Stanovisko technického dozora			
Stanovisko projektanta stavby			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 16
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	22. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 16 – Úprava zábradlí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě kontroly a měření skutečného stavu zábradlí na všech lodžích byla zjištěna, po dohodě s objednatelem, nutnost úpravy dle platné ČSN 74 3305 na výšku 1200 mm v celém rozsahu stavby. 		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	289 086,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
289 086,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018		

Parčubov, 2018



SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: **ZL č. 16 - Úprava zábradlí**

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 22.05.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové



Projektant: BKN, spol.s r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

289 086,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
16-1	K	7675027R01-R001	Úprava Ozn.Z27 Ocelové zábradlí na lodžiích - provedení kotev z ploché oceli 50x6mm vč. frézování oválných děr a provedení žárového zinku				
16-2	K	7675027R01-R002	Úprava Ozn.Z27 Ocelové zábradlí na lodžiích - nastavení stávajícího zábradlí o cca 100 mm z JÁKLÚ 40x40x3 mm				
16-3	K	7675027R01-R003	Úprava Ozn.Z27 Ocelové zábradlí na lodžiích - výroba nastavení a kotvení vč. nátěru konstrukce				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 17	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 23. 5. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 17 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 17 – Úspora za stěnovou izolační vatu Popis a zdůvodnění změny: - Investor předal zhotoviteli k využití stěnovou vatu ISOVER UNI 50 mm v celkové ploše 670 m ² .			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 17
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	23. 5. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 17 – Úspora za stěnovou izolační vatu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investor předal zhotoviteli k využití stěnovou vatu ISOVER UNI 50 mm v celkové ploše 670 m². 		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 34 505,01 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 34 505,01 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 08. 2018		



Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: **ZL č. 17 - Úspora za izolační vatu**

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 23.05.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6

Projektant: BKN, spol.s r.o.

Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 505,01

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
17-1	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2			



MARH
Máček
KAPLÁN

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 18	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 27. 4. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 18 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: ZL č. 18 – Změna šíře dveří 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavku uživatele bude provedeno rozšíření dveří z 800 na 900 mm vč. rozšíření otvorů mezi místnostmi 2.11, 2.10 a 2.11, chodba. Součástí dodávky bude i provedení rozšíření výřezu otvoru do panelové kce vč. zapravení. 			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové			
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 500px; height: 100px;"></div>			
Stanovisko technického dozoru			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 18

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	27. 4. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL č. 18 – Změna šíře dveří 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku uživatele bude provedeno rozšíření dveří z 800 na 900 mm vč. rozšíření otvorů mezi místnostmi 2.11, 2.10 a 2.11, chodba. Součástí dodávky bude i provedení rozšíření výřezu otvoru do panelové kce vč. zapravení.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-41 227,70 Kč	45 398,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
4 171,20 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 31. 08. 2018

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: **ZL č. 18 - Rozšíření dveří 2.NP**

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 27.04.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

Projektant: BKN, spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 171,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
18-1	K	977211112.1	Řezání ŽB kci hl do 350 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm - dodatečné rozřezání na kvádry (8ks) o hmotnosti 150-200kg	m			
	vv		"DODATEK Č.3 - 7.2.2018 - Úprava dveří 2.NP"				
	vv		rozšíření otvorů o : 2*0,1*2				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
18-2	K	7661205R01	Ozn.D2.5 Dveře plně,800/1970 mm,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva tl.250 mm,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus			
18-3	K	7661209R01	Ozn.D2.9 Dveře plně,800/1970 mm,EW30DP3+C,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva tl.100 mm,kování "D",dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus			
18-4	K	7661903R02	Ozn.D2.14 Dveře plně,900/1970 mm,EW30DP3+C,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva tl.100 mm,kování "D",dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus			
18-5	K	7661020R01	Ozn.D2.15 Dveře plně,900/1970 mm,povrchová úprava CPL laminát tl.0,2 mm,vč.zárubně do ŽB zdíva tl.250 mm,dle výpisu výrobků - kompletní dodávka a montáž	kus			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 19

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 23. 5. 2018

Název akce:

INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **e-mailová korespondence**

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL č. 19 - rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ZL č. 19 - Chemický proplach potrubí ÚT

Popis a zdůvodnění změny:

- Po provedení průzkumného řezu přípojným potrubím stoupaček a zjištění stavu vnitřku potrubního vedení, navrhuje dodavatel provést samostatný proplach chemický pro stávající potrubí, které má být zachováno a u něhož je požadováno prodloužení životnosti.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

Stanovisko technického dozoru:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 19

Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	23. 5. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZL č. 19 - Chemický proplach potrubí ÚT

Popis a zdůvodnění změny:

- Po provedení průzkumného řezu přípojným potrubím stoupaček a zjištění stavu vnitřku potrubního vedení navrhuje dodavatel provést samostatný proplach chemický pro stávající potrubí, které má být zachováno.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	220 455,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
220 455,00 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 31. 08. 2018

SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: **ZL č. 19 - Chemický proplach potrubí ÚT**

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 23.05.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6

Projektant: BKN, spol.s r.o.

Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 455,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		733	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
19-1	K	R733-R19-01	použití stroje Multi-Push REMS na proplach potrubí	kpl			
19-2	K	R733-R19-02	čistící a konzervační roztok REMS Peroxi Color	litr			
19-3	K	R733-R19-03	proplach potrubí	hod	2		
19-4	K	R733-R19-04	výpočet objemu, množství roztoku	kpl			
19-5	K	R733-R19-05	přípomocné práce	kpl			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 20

Zhotovitel: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 5. 6. 2018Název akce:
INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCEZpůsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **e-mailová korespondence**na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ZL č. 20 - rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ZL č. 20 - Změna velikosti RACK skříní (1,2 [1.NP],3 [3.NP],5 [5.NP])

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků uživatele technologického zařízení došlo ke změně rozměrů RACK skříní (4ks) z rozměrů š.600xhl.600 mm na š.800xhl.900 mm. Jedná se o RACK 1 a 2 v 1.NP, dále 3 ve 3.NP a 5 v 5.NP.

Počet připojených listů specifikací: 2



Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 20
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	5. 6. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 20 - Změna velikosti RACK skříní (1,2 [1.NP],3 [3.NP],5 [5.NP])</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele technologického zařízení došlo ke změně rozměrů RACK skříní (4ks) z rozměrů š.600xhl.600 mm na š.800xhl.900 mm. Jedná se o RACK 1 a 2 v 1.NP, dále 3 ve 3.NP a 5 v 5.NP. 		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	60 895,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60 895,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	D	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: **ZL č. 20 - Změna velikosti RACKŮ (1,2 [1.NP],3 [3.NP],5 [5.NP])**

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378
Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

Datum: 05.06.2018
Projektant: BKN, spol.s r.o.
Vladislavova 29/1, 566 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

60 895,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741-12MA		SK - strukturovaná kabeláž - data, tlf (vč. nosných kostrukcí společných s EKV,CCTV a STA)- materiál				
20-1	M	R položka-20-01	Příplatek za rozšíření RACKOVÉ skříně DR1, DR1.2, DR3 a DR5 na rozměr š. 800 mm, hl. 900 mm vč. soklu a 1 sady koleček	ks			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 21	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 10. 07. 2018	
Název akce: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	e-mailová korespondence	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 21 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: ZL č. 21 – Doplnění EZS</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele ohledně rozšíření zabezpečení na podlažích (mimo ubytovací podlaží), bylo navrženo provedení rozšíření ústředny EZS pomocí modulárních koncentrátorů na každé podlaží (mimo ubytovací podlaží) včetně doplnění pohybových čidel a systémových klávesnic. Tento ZL řeší pouze přípravu na požadovaný stav. 			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové			
<p>Stanovisko technického d</p> <p>Stanovisko projektanta sta</p>			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 21	
Zhotovitel:	Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	10. 07. 2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZL č. 21 – Doplnění EZS</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavků uživatele ohledně rozšíření zabezpečení na podlažích (mimo ubytovací podlaží), bylo navrženo provedení rozšíření ústředny EZS pomocí modulárních koncentrátorů na každé podlaží (mimo ubytovací podlaží) včetně doplnění pohybových čidel a systémových klávesnic. Tento ZL řeší pouze přípravu na požadovaný stav. 			
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	215 523,40 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
215 523,40 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum:	11. 08. 2018		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: INTERNÁT HEYROVSKÉHO 1213, HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE

Objekt: SO 01 - Internát

Soupis: ZL č. 21 - Rozšíření EZS (příprava)

Místo: Hradec Králové parc. č. 1582, 1378

Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Armádní servisní, p.o. Podhrabská 1589/1 Praha 6
Uchazeč: Sdružení - Internát Heyrovského, Hradec Králové

Projektant: BKN, spol.s r.o.
Vladislavova 29/1,566 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

215 523,40

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741-1	Elektromontáže montážní materiál				
21-1	M	R-ZL21-003	Kabel datové sběrnice	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			800				
			Součet				
21-2	M	R-ZL21-004	Kabel připojení a napájení pohybových čidel	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			2300				
			Součet				
21-3	M	341 11032	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			380				
			Součet				
21-4	M	R položka312	Trubka ohebná PVC DN25	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			2900				
D		741-2	Elektromontáže montážní práce				
21-5	M	R-ZL21-007	Kabel datové sběrnice	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			800				
21-6	M	R-ZL21-008	Kabel připojení a napájení pohybových čidel	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			2300				
21-7	K	744 44-1100.1	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			8				
21-8	K	74R položka228	Trubka ohebná PVC DN25	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			2900				
21-9	K	74R položka314	Frézování otvoru do betonu pro krabici pr.68mm	ks			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			37				
21-10	K	74R položka315	Frézování drážky v betonu 30 x 30 mm	m			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			100				
			Součet				
21-11	K	R-ZL21-009	Úprava projektové dokumentace	kpl			
			položka dle ZL21-Doplnění EZS				
			1				
			Součet				
